



正衡监理

编号: ZHJL-YB-003

监 理 月 报

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分
布式光伏发电项目

2022 年 8 月

项目监理部 (章):

总监理工程师:



日期: 2021 年 8 月 31 号

监 理 月 报

开始时间 2022 年 8 月 1 日 结束日期 2022 年 8 月 31 日

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	主要工作	1、逆变器并网柜接线、并网。 2、交流电缆、桥架敷设。 3、安全、隐蔽工程旁站。 4、厂房加固验收。 5、电网公司验收、并网。 6、开路电压、绝缘电阻测试。	1. 分项验收，整改消缺。 2. 清洗系统安装。 3. 环境监测仪安装。 4. 云平台搭设。 5. 竣工验收。
	设备交付进度	1、支架全部到场，支架到场 2.4434MW; 2、直流电缆全部到货，到货 24500m; 3、交流电缆全部到货，到货 5000m; 4、组件到货 165 箱，共 5149 片; 5、桥架全部到货，到货 2.4434MW; 6、逆变器到货 20 台。通讯模块 20 个; 7、加固檩条、钢管斜撑、扁钢全部到场。 8、并网柜全部到货，到货 5 台; 9、接地材料、通道板全部到货。 10、监控全部到货。	1、清洗系统安装。 2、环境检测仪采购。
	设计交付进度	图纸完成	最终图纸移交
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	开工资料审查完成	审查过程资料、竣工报审资料
	技术交底	完成	

	设计变更	目前现场先按图纸施工	若有变更及时解决
安全	安全培训情况	进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育，安全文明施工落实。
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	场地安装及用电安全都已落实	吊装、防火、带电设备安全警示
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	严格按照设计及规范要求监管。	强制性质量问题绝不放过
	主要原材料质量	主要材料进行质量检查	把控好材料进场质量问题
	构（配）件质量	把控好进场材料质量关	严抓构配件质量问题
	设备质量	按照要求进行质量验收	查看进场设备合格证书
	质量验评情况	1、威英过路穿线管绑扎不牢固。 2、天富龙走道板安装不牢固。 3、天富龙监控系统电源线无防护套管。	要求施工单位及时整改消缺。

二、本月进度情况

- 1、天富龙：直流侧开路电压测试完成，逆变器接线完成，交流侧接线完成，绝缘电阻测试完成，吊牌安装完成，视频监控摄像头安装完成，清洗系统安装；
- 2、威英：直流侧开路电压测试完成，逆变器接线完成，交流侧接线完成，绝缘电阻测试完成，吊牌安装完成，视频监控摄像头安装；
- 3、天富龙并网柜接线完成，吊牌安装完成，防火封堵完成，柜体清理完成，配电房停电接线完成，电网公司并网验收完成；
- 4、威英并网柜接线完成，吊牌安装完成，防火封堵完成，柜体清理完成，配电房停电接线完成，电网公司并网验收完成；

三、下月进度计划


- 1 分项验收，整改消缺。
- 2、项目资料整理。
3. 清洗系统安装。
- 4、环境监测仪安装。
- 5、云平台搭设。
- 6、竣工验收。

四、安全文明施工情况


事故（起）			编制安全策 划文件（份）	施工 人数	施工单位 数量
人身重伤	机械设备	电网事故			
无	无	无	无	15 人	1
施工安全 文明交底	每日班前 会已交代	施工现场文明施工情况		良好	

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	1、逆变器并网柜接线、并柜。 2、交流电缆、桥架敷设。 3、安全、隐蔽工程旁站。 4、厂房加固验收。 5、电网公司验收、并网。 6、开路电压、绝缘电阻测试。	1 分项验收，整改消缺。 2、项目资料整理。 4. 清洗系统安装。 6、环境监测仪安装。 7、云平台搭设。 6、竣工验收。
安全管理	施工人员安全帽佩戴，反光服穿着，吊装安全管理，现场防火措施落实。	整改消缺、临时用电安全，动火作业等。
质量管理	发现有质量问题并要求施工方整改	发现有质量问题并要求施工方整改，整改完成后，进行查验。
技术管理	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。	检查现场施工质量
物资供应	督促施工单位进行	

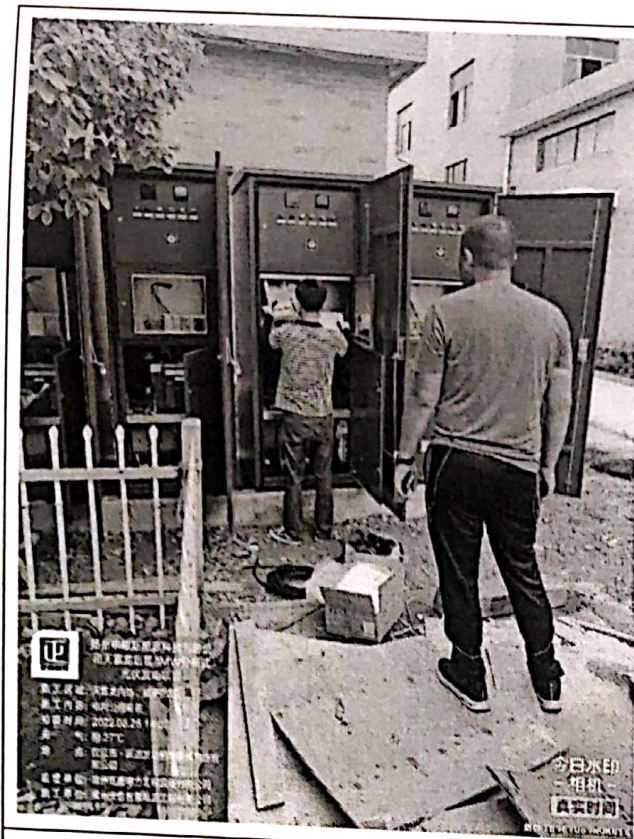


数据终端安装

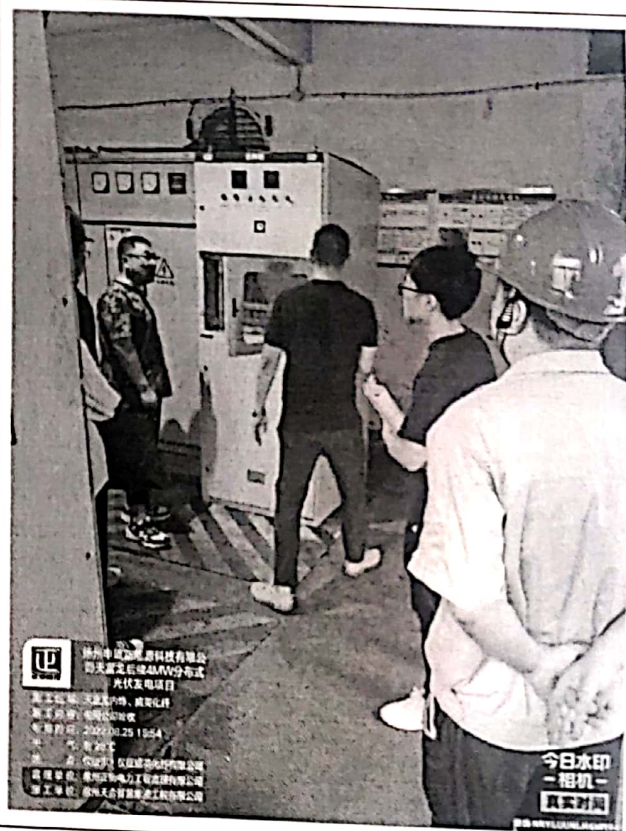

电网公司验收



镀锌层测试

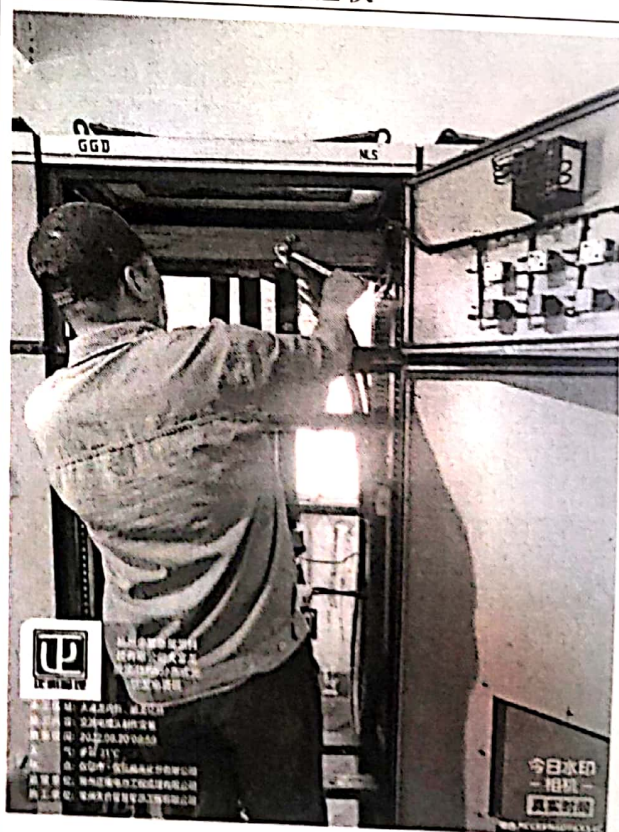

停电并柜
