



正衡监理

编号: JLYB-01

监 理 月 报

南通永丰铭自发自用项目

2022 年 03 月

第 1 期

项目监理部 (章)

总监理工程师:



报告日期: 2022 年 03 月 31 日

常州正衡电力工程监理有限公司

监理月报

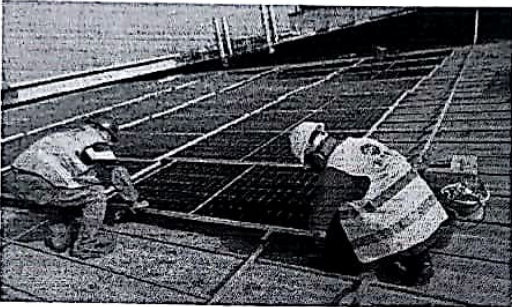
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	南通永丰铭自发自用项目		施工照片	22	

二、监理重点工作情况

专 业	事 项	本月重点工作情况	下月重点 工作计划
进 度	屋顶加固 	本月永丰铭屋面光伏 支架、组件安装全部完 成，接地、检道、桥架 在施工中。	下月上旬 所有安装 全部完成 并具备并 网条件。
	扁铁钻孔 		
	吊料散料 		

支架安装  组件安装  桥架安装 		
设备交付进度	本月光伏支架、组件、逆变器、并网柜、交直流电缆等已全部到货	
设计交付进度	施工电子版图纸交付；包括光伏区支架、组件安装电子版图纸交付。	
质量体系运作情况	总包单位无人员在现场，分包单位多次分包，素质比较差，但总体运行良好	落实质量保证体系，并对施工质量

			量、运行情况跟踪
	施工图会审	根据现场实际调控	
	设计交底	无	
	方案审查	未提供任何施工组织设计及方案及开工报告	已发通知单督促施工单位报审及其他资料
	技术交底	监理项目部主持召开了质量安全技术交底会议	
	设计变更	暂无	
安全	安全培训情况	新进场施工人员已进行安全培训并考试	督促施工单位对进场员工进行安全教育
	安全交底情况	对新工人进行进场交底并督促施工单位对危险作业点进行交底和每天班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	安全措施落实不彻底，专职安全员不能到位，现场整改不及时，已发通知单要求承包单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场文明、安全施工措	加强现场

		施基本实施到位	安全管理 力度
质 量	主要工序质量	符合规范及设计要求	
	主要原材料质量	主要材料符合设计要求，但夹具防水及走道、桥架支架不符合设计要求，	对主要设备进行开箱检查，对使用的不符合设计要求的材料已下通知单
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	符合设计要求	进 行 报 验、开箱 检查
	质量验评情况	工序施工符合要求，但过程资料无法同步	加强过程 检 查 力 度，加大 工序报验 抽查力度 督促资料 到位
投 资	资金情况	/	/
	款项支付情况	本月无资金批复	/
	预算外签证	无	/
合 同	合同签订情况	施工合同已签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同 执行工作

三、本月进度情况

序号	工程施工内容	计划开始时间	计划结束时间	实际本月完成	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）
1	夹具支架安装				100%	100%
2	组件安装				100%	100%
3	桥架安装				70%	70%
4	逆变器安装				0%	0%
5	组串汇线				80%	80%
6	并网柜安装				0%	0%
7	交流放线				0%	0%
8	清洗系统				0%	0%

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	预计完成（完成量/总量）
1	并网试运行		2022. 04. 10	100%
2				
3				

五、安全文明施工情况

本月安全生产情况总体一般，总包单位无人到场，分包单位安全意识淡薄，管理人员不能全时段在现场，现场缺少专职安全员，天天苦口婆心，工人佩戴安全帽正常，安全生产正常。

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队 伍人数
无	无	无		9人	无	/	/	/

常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

2022年03月31日
