

编号：ZHFD-ZHJL-YB-023

监 理 月 报

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 （本期 10 万千瓦）

2024 年 04 月第 23 期

总监理工程师

监理项目部（章）

报告日期：2024 年 04 月 30 日

监 理 月 报

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
协调	组织工作	组织召开 2 次工地例会并形成会议纪要。	
进度	主要工序 进度工作	1、2024 年 04 月 01 日到 2024 年 04 月 30 日每天编写监理工作日志 30 份，月报 1 份。 2、项目资料整理；对施工单位资料进行审查并签字、盖章；同总包单位沟通进度、协调事宜；同总包单位沟通储能工程尾工和其他工程消缺情况事宜。 3、风机：①、制做 W24C、26C 风机箱变护栏检查。 ②、W10 风机基础护坡、护坡完成后检查。 ③、制作安装 26C、22C、W21E、W27、W28 风机箱变护栏检查。 ④、W29、W30 风机箱变围栏安装巡视检查。 ⑤、W7、13B、W17、25B、W27、W19B、W29、W30 风机箱变护栏安装完成后检查。 ⑥、W29、W30 风机位植被恢复检查。 ⑦、W9、X8、W29、W21E、W10、W8、X1、X8 风机安装消缺检查。 ⑧、W20 风机位外界单位开挖电缆沟情况巡视检查；W20 风机位接地扁铁被外部单位挖出检查；W20 风机箱变与光伏箱变之间距离检查；W20 风机位接地扁铁被光伏单位挖出、电缆沟被光伏单位开挖、光伏箱变距离不在安全范围之内要求其整改监督检查。 ⑨、X2 风机位消缺问题检查。	1、对风电机组场地部分护坡、生态保持、复垦、后期消缺监督检查工作。 2、验收检查集电线路塔基消缺情况。 3、储能工程土建及安装工程扫尾和消缺； 4、升压站通信及电气安装消缺监督检查； 5、上海电力专家对本项目现场检查和资料归档的工作开展监理工作。 6、其他待定。 上述只是计划安排。具体根据现场情况和条件进行安排。

		4、集电线路：①、集电线路 35#塔基护坡完成后检查。 ②、集电线路 2 回路 41 号塔护坡完成后检查；部分铁塔问题巡视检查。 ③、集电线路双回路 051 号塔消缺后检查；56 号塔、57 号塔消缺巡视检查。 ④、集电线路部分铁塔整改情况复查。 ⑤、集电线路 1 回路 030 号塔消缺情况巡视检查；部分铁塔消缺情况巡视检查；集电线路 1 回路 1 分支 003 号塔、004 号塔消缺情况巡视检查。 5、储能站：储能站尾工问题巡视检查；储能站进站道路修整巡视检查。 6、升压站：升压站消缺情况巡视检查。	
	设备材料进场进度	已全部完成	无
	设计交付进度	已全部完成	无
	施工图会审	已全部完成	无
	方案审查	已全部完成	无
	技术交底	已全部完成	无
	设计变更	无	无
安全	安全活动开展情况	施工现场布置好消防设施，禁止施工人员乱扔烟头等活动教育，防高空坠落、防触电教育。	继续做好安全技术交底活动教育。
	培训情况、安全交底情况	督促总包单位对分包单位进场人员进行安全技术交底，风电场消缺作业人员培训。	继续督促总包单位对分包单位进场人员进行安全技术交底，风电场消缺作业人员培训。
	安全措施	监督管理施工单位风电场作业人员严格执行施工	继续监督管理风电

	落实情况	作业票制度。	场作业人员严格执行施工作业票制度。
	安全文明施工情况	施工现场安全文明布置合理，劳动防护用品等穿戴符合要求。	无
质量	主要工序质量	严格消缺验收制度，对不符合要求的地方要求返工。	无
	主要电缆原材、风机锚栓、高强度螺母风机基础压实度环刀见证取样送检。	已全部完成	无
	质量体系运作情况	已全部完成	无
	构（配）件质量	已全部完成	无
	设备质量	已全部完成	无
	质量验评情况	无	无

二、 工程存在的问题和建议

由于环保扬尘天气停工、村民阻工和项目资金进度款不到位导致储能站、升压站、风电场消缺进度迟缓不能开展的问题。建议相关单位及时处理解决。


三、 下月监理工作重点

项目上风电场风电机组的土建基础护坡、复耕、部分遗留问题，储能工程、升压站工程整改消缺的监理工作；应接上海电力系统专家领导来本项目检查工作。具体根据现场的实际条件情况进行确定重点计划。


四、 现场图片





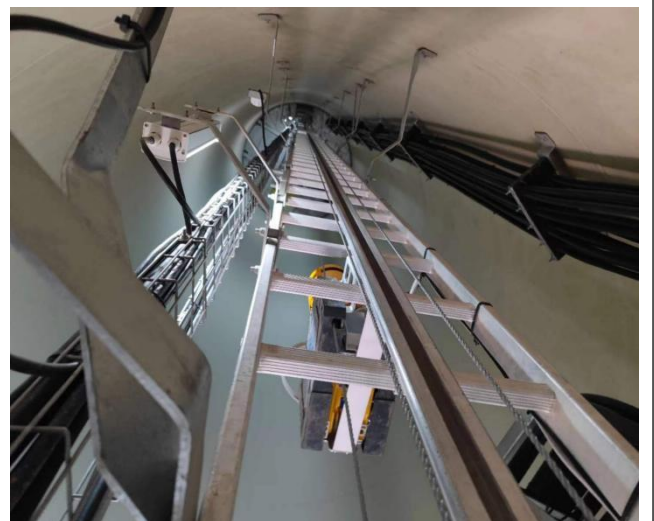



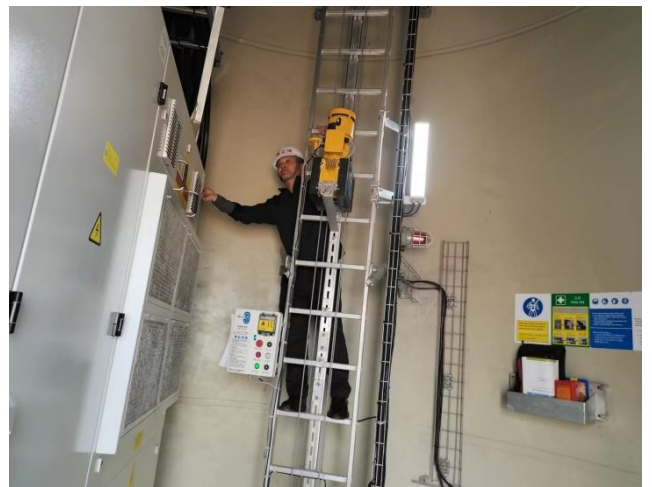



常州正衡电力工程监理有限公司
 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）
 监理部

2024 年 04 月 30 日
