



正衡监理

编号: JLYB-03

监 理 月 报

佛山新明珠一期 12MWP 屋顶分布式光伏电站到项目

2022 年 06 月

第 2 期

项目监理部 (章)



总监理工程师:

杜召栋

报告日期: 2022 年 06 月 30 日

常州正衡电力工程监理有限公司

监理月报

工程名称：佛山新明珠一期 12MWP 屋顶分布式光伏电站项目

第 2 次月报开始时间：2022 年 06 月 01 日 截止日期：2021 年 06 月 30 日


监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司


一、工程影像资料


序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	佛山市三水新明珠建陶工业有限公司 20MWP 屋顶分布式光伏电站项目	佛山新明珠一期 12MWP 屋顶分布式光伏电站项目	施工照片	88	

二、监理重点工作情况

专 业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进 度	 施工记录	本月光伏支架安装完成 70%，走道桥架完成 40%，组件部分分散到位待安装，直流电缆放线完成 5%，箱变基础、预制舱一、二次基础完成 50%，目前施工人员充足，因高温天气，工程正缓慢进行。	下月预计开关站箱变基础完成，组件支架安装全部完成，检修走道全部完成，组件、桥架安装基本完成，一二次设备、箱变吊装到位。

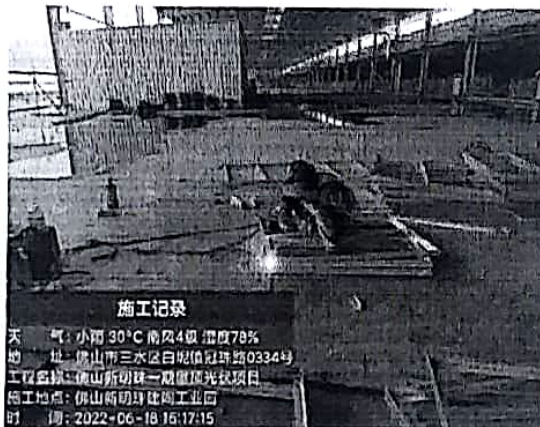

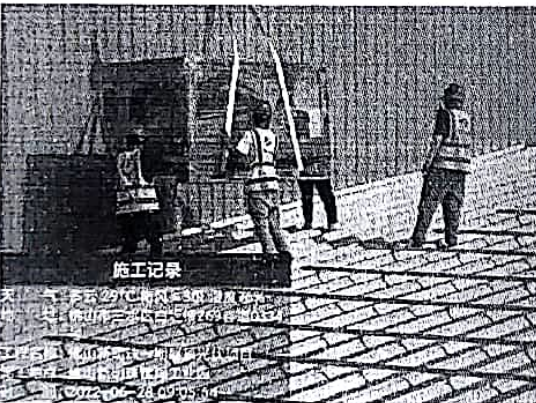

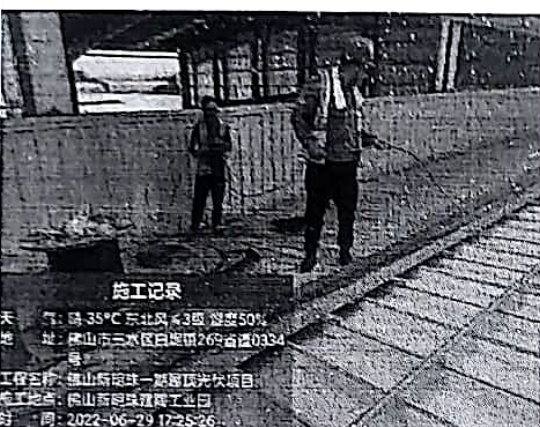 施工记录 天气: 晴 34℃ 西南风 3级 湿度42% 地址: 佛山市三水区政府侧269省道0334号 工程名称: 佛山新明珠一期屋顶光伏项目 施工地点: 佛山新明珠建材工业园 时间: 2022-06-28 16:35:24		
 施工记录 天气: 晴 35℃ 东北风 4级 湿度50% 地址: 佛山市三水区白坭镇269省道0334号 工程名称: 佛山新明珠一期屋顶光伏项目 施工地点: 佛山新明珠建材工业园 时间: 2022-06-29 17:25:26		
设备交付进度	部分组件已到货,其他设备正在逐步交付中。	下月全部到货
设计交付进度	施工图纸交付	已交付
质量体系运作情况	光伏施工质量能保证合格,土建这块被供电电力公司指定外包施工队,素质较差,但都及时作了整改,总体运行良好	落实质量保证体系,并对质量运行情况进行检查
施工图会审	根据现场实际调控	
设计交底	已完成交底工作	
方案审查	承包单位电子版施工组织已审并整改	已发联系单要求及时报审纸

		中、措施方案电子版已上报	版资料
	技术交底	监理单位主持召开了质量技术交底会议，承包单位签字。总包也向班组进行了交底。	
	设计变更	暂无	
安全	安全培训情况	新进场施工人员已进行安全培训	督促施工单位每周进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对班前进行质量、安全交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	总体安全措施落实良好，部分措施在巡视发现后及时落实	继续监督施工单位认真落实好安全措施
	安全文明施工情况	现场文明、安全施工实施比较到位，采光带部位已拉警示带，工人佩戴安全帽良好，现场钻孔铁粉及时用强磁吸附，垃圾随做随清。	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	每天巡视现场施工，每道工序完成自验合格后进行验收，重要工序平行检查和旁站，能保证工程质	将对混凝土浇筑及设备终端安装制作进行旁站。

		量。	
	主要原材料质量	光伏支架材料及走道支架材料符合设计要求。	对主要材料进行开箱检查。
	构（配）件质量	进场构配件质量符合图纸要求。	把控好进场构配件质量关。
	设备质量	进场组件外包装无损伤，已完成首次到货检。	将对进场设备开箱检查。
	质量验评情况	质量验收到位，分部分项报验资料未同步。	督促验评资料到位
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	本月无资金批复	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同已签订	/
	合同执行情况	未能按合同执行	/

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	实际本月完成时间	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）
1	材料散运	2022.05.06	2022.05.12		30%	90%
2	支架安装	2022.05.06	2022.06.02		57%	67%
3	组件安装					
4	桥架安装	2022.05.14	2022.06.03		38%	38%
5	直流电缆	2022.05.14	2022.06.03		5%	5%
6	接地安装					
7	电缆敷设					
8	走道安装				38%	38%

9	逆变器安装					
10	并网柜安装					

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	预计完成（完成量/总量）
1	支架安装（调整）	2022.06.01	2022.06.28	100%
2	组件安装	2022.06.08	2022.07.25	100%
3	桥架安装	2022.06.09	2022.07.13	100%
4	接地安装	2022.06.25	2022.07.12	100%
5	组串电缆	2022.06.29	2022.07.15	100%
6	逆变器安装	2022.07.05	2022.07.26	100%
7	配电柜安装电缆敷设	2022.07.28	2022.08.05	100%
8	并网试运行	2022.08.05	2022.08.15	100%

五、安全文明施工情况

本月安全文明施工情况良好，承包单位安全意识较高，管理人员配备到位，施工人员积极配合，吊装作业证件齐全并有专人指挥，电焊作业消防措施到位，爬梯有防倒防滑措施，临边已设置防护栏杆，彩光带已喷警示语，施工时拉好彩色警示带，工人佩戴安全帽良好，防暑用品充足，安全生产正常。

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械 设备	电网事 故			分包队 伍数量	分包 队伍 人数	系统外包 队伍数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	3	42人	无	/	/	/

佛山新明珠一期 12MWP 屋顶分布式光伏电站监理项目部

2022 年 06 月 30 日
