

编号：CHZH-YB-001

监 理 月 报

工程名称：瑞能光伏科技（句容）有限公司新建江苏众达车辆电机
科技有限公司 320kWp 分布式光伏发电项目

2021 年 11 月第 01 期

总监理工程师： 杜召栋

监理项目部（章）

2022 年 06 月 20 日

监 理 月 报

工程名称：瑞能光伏科技（句容）有限公司新建江苏众达车辆电机科技有限公司 320kWp 分布式光伏发电

项目

月报开始时间 2022 年 05 月 20 日 结束日期 2022 年 06 月 20 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、 监理重点工作情况

专业	影像资料	
进度	 电缆沟砌筑 时 间：2022.06.07 15:16 天 气：多云 27°C 东北风3级 气压 1005百帕 地 点：镇江市·丹阳高性能合金材料科技产业园 施工单位：四川垚州 监理单位：常州正衡 今日水印相机 真实时间	





直流电缆敷设

时间: 2022.06.10 14:41
天气: 多云 30°C 南风2级 气压1006百帕
地点: 镇江市·丹阳高性能合金材料科技产业园

施工单位: 四川垚州
监理单位: 常州正衡



电缆桥架拼接及开孔

时间: 2022.06.05 15:11
天气: 多云 26°C 北风2级 气压998百帕
地点: 镇江市·丹阳海泰新材料科技有限公司

施工单位: 四川垚州
监理单位: 常州正衡

组件安装

时间: 2022.05.26 16:35
天气: 阴 23°C 东南风1级 气压1004
百帕
地点: 镇江市·丹阳高性能合金材料科技产业园

施工单位: 四川珪州
监理单位: 常州正衡

今日水印
—相机—
真实时间

组件开箱倒运

时间: 2022.05.24 17:12
天气: 多云 24°C 东风3级 气压1009
百帕
地点: 镇江市·丹阳高性能合金材料科技产业园

施工单位: 四川珪州
监理单位: 常州正衡

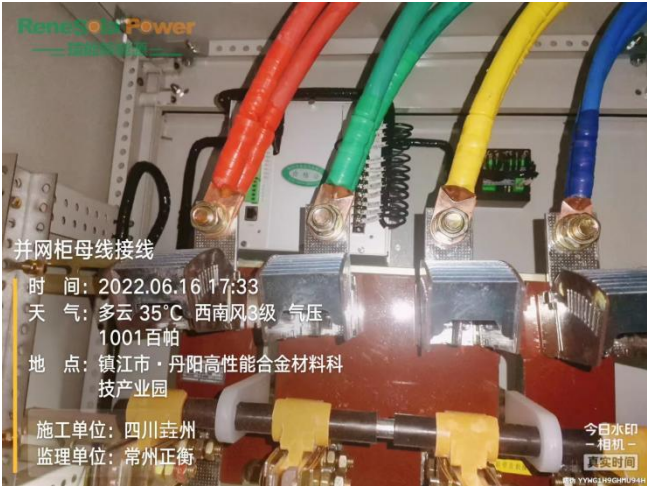
今日水印
—相机—
真实时间

并网柜进出口防火封堵

时间: 2022.06.16 17:29
天气: 多云 35°C 南风3级 气压1001
百帕
地点: 镇江市·丹阳高性能合金材料科技产业园

施工单位: 四川珪州
监理单位: 常州正衡

今日水印
—相机—
真实时间

	 并网柜母线接线 时 间: 2022.06.16 17:33 天 气: 多云 35°C 西南风3级 气压: 1001百帕 地 点: 镇江市·丹阳高性能合金材料科技产业园 施工单位: 四川壹州 监理单位: 常州正衡 今日水印相机 真实时间	
	设备交付进度	所以设备材料已到场
	设计交付进度	图纸已出图
	质量体系运作情况	/
	施工图会审	已进行图纸会审
	设计交底	已完成设计交底
	方案审查	已交付, 各专业方案已由各专监审核完毕
	技术交底	已完成技术交底
	设计变更	未有设计变更
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底

	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实，检查现场存在的安全隐患，发现问题及时整改。
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好
质量	主要工序质量	工序验收质量合格
	主要原材料质量	进场原材料符合设计要求，质量证明文件齐全
	构（配）件质量	构配件符合设计要求，质量证明文件齐全
	设备质量	进场设备符合设计要求，质量证明文件齐全
	质量验评情况	/
投资	资金情况	/
	款项支付情况	/
	预算外签证	/
合同	合同签订情况	施工合同签订
	合同执行情况	按合同执行

二、 本月进度情况

1、支架安装完成 99%；

2、组件安装完成 99%

3、电缆桥架安装完成 90%

4、电缆敷设完成 90%

5. 逆变器安装完成 80%

6. 接地环网安装完成 70%

7. 并网柜安装完成 90%

三、 下月进度计划

- 1、全容量并网发电
- 2、缺陷整改全部完成
- 3、竣工验收完成

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	划文件（份）	人数	分包队	分包队	系统外	系统外
伤	备	故			伍数量	伍人数	包队伍	队伍人
					数量	数	数量	数
无	无	无	/	4人	/	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	/
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	/
质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执	/

	行计划。	
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工 工人员是否按照技术交底内容进行施工。	/
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	/
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位 做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现 场进行巡查，确保物资不遗失。	/

常州正衡电力工程监理有限公司

瑞能光伏科技（句容）有限公司新建江苏众达车辆电机科技有限公司

320kWp 分布式光伏发电项目

2022 年 6 月 20 日
