

山东潍坊招商科瑞一期1.2MW 分布式光伏发电项目工程月报表

第 1 期

(2022 年 05 月 23 日至 2022 年 05 月 31 日)

本周报内容提要：

- 一. 本月主要工程进展情况概述
- 二. 本月进度、质量、安全执行情况简报
- 三. 账款管理情况
- 四. 下月主要计划安排
- 五. 现场工程照片

建设单位： 潍坊旭远光伏新能源有限公司

施工单位： 江苏华湛电力安装工程有限公司

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

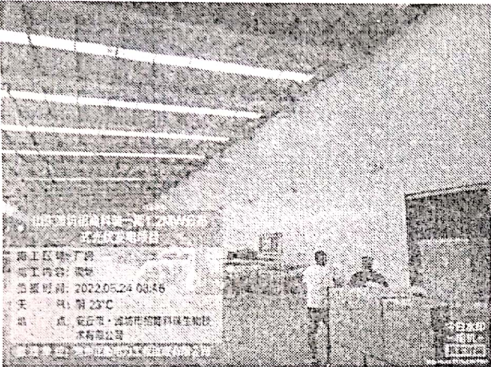
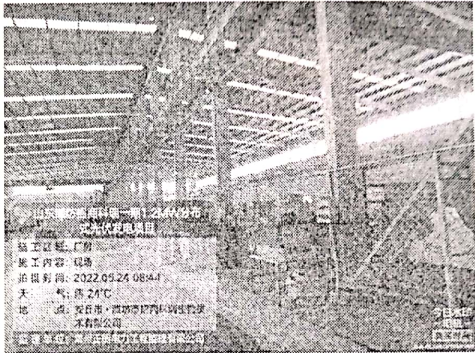
设计单位： 山东华岳电力技术有限公司

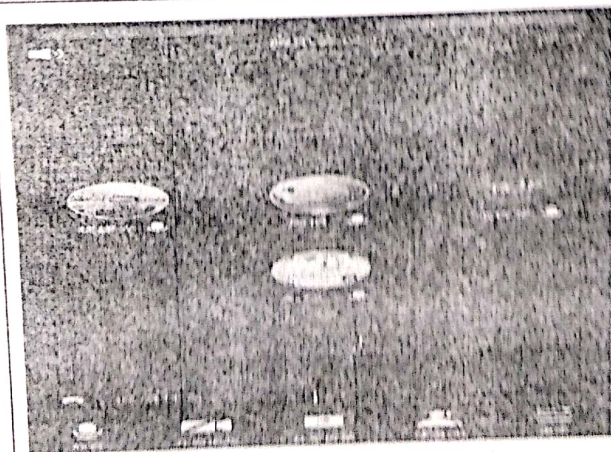
日期： 2022 年 06 月 04 日

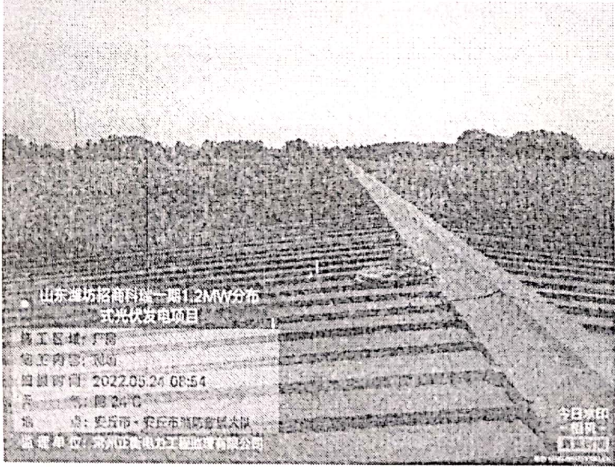
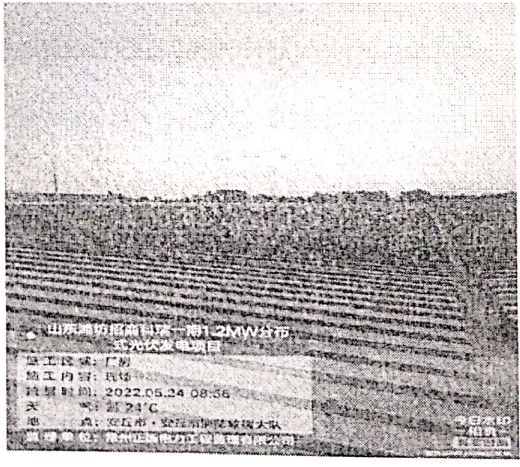


一、本月主要工程进展情况概述			累计完成百分比	剩余百分比
工程进展	1	夹具	累计完成：70%	剩余量：30%
	2	支架	累计完成：70%	剩余量：30%
	3		累计完成：	剩余量
	4		累计完成：	剩余量：
	5		累计完成：	剩余量：
	6		累计完成：	剩余量：
	7		累计完成：	剩余量：
	8		累计完成：	剩余量：
	9		累计完成：	剩余量：
	10		累计完成：	剩余量：
	11		累计完成：	剩余量：
	14		累计完成：	剩余量：
月进度按照主要设备、分部工程完成情况填写进度				
进度执行	执行说明			
	提前、滞后原因	由于疫情防控影响及资金安排，施工人员未进场施工。		
	赶工措施	增加施工人员		
二、本月质量、安全执行情况				
1、材料设备质量执行情况				
序号	到货材料设备名称	设备材料总量	累计到货数量	到货比例
1	支架	根	根	%
2	组件	块	块	%
3	逆变器	台	台	%
4	直流线	米	米	%
质量情况综述				
序号	发现问题	解决措施	整改验证	
1	无			

2					
3					
2、工序质量执行情况					
序号	单位工程名称	验收情况	备注		
1	夹具安装	合格			
2	支架安装	合格			
3	连接件安装	合格			
质量情况综述					
序号	发现问题	解决措施	整改验证		
1	夹具安装反子	返工	完成		
2	夹具直线度问题	返工	完成		
3					
3、安全检查情况					
序号	安全检查项目	检查结果	发现问题	整改情况	
1	消防	合格			
2	安全帽		未带安全帽	已整改	
3	安全警示牌	合格			
安全情况综述					
三、下月主要计划安排					
主要计划安排	序号	工作事项	责任人	完成时间	备注
	1	厂房加固	潘国锋		
	2	支架、组件安装完成	潘国锋	2022、6、28	
	3	并网柜安装、逆变器安装、电缆敷设完成	潘国锋	2022、6、28	
	4				
	5				
五、现场工程照片					

 施工区域: 厂房 施工内容: 装修 拍摄时间: 2022.05.24 08:56 天气: 晴 23°C 地点: 龙岗区·龙岗区锦昌科技园 木料公司	 施工区域: 厂房 施工内容: 装修 拍摄时间: 2022.05.24 08:57 天气: 晴 24°C 地点: 龙岗区·龙岗区锦昌科技园 木料公司



 山东潍坊市寿光市12MW光伏 2022年5月10日 施工区域: 厂房 施工内容: 光伏 拍摄时间: 2022.05.24 08:54 天气: 晴 24°C 地点: 寿光市·寿光市经济开发区 建设单位: 寿光市经济开发区管理委员会 监理单位: 寿光市经济开发区管理委员会 施工单位: 寿光市经济开发区管理委员会	 山东潍坊市寿光市12MW光伏 2022年5月10日 施工区域: 厂房 施工内容: 光伏 拍摄时间: 2022.05.24 08:56 天气: 晴 24°C 地点: 寿光市·寿光市经济开发区 建设单位: 寿光市经济开发区管理委员会 监理单位: 寿光市经济开发区管理委员会 施工单位: 寿光市经济开发区管理委员会
