

质量情况综述					
序号	发现问题	解决措施	整改验证		
1	组件吊装未设警示牌、拉警戒线	现场告知增加设置警示牌、拉警戒线	已整改		
2	3#厂房组件转运中发现单人背运	通知施工单位改变转运方法	已整改		
3	1#、2#、3#厂房组件安装有踩边框现象	汇报业主			
2、工序质量执行情况					
序号	单位工程名称	验收情况	备注		
1	夹具安装	不合格	已整改		
2	支架安装	不合格	已整改		
3	连接件安装	不合格	已整改		
4	3#厂房檩条、斜撑加固	不符合要求	下消缺单		
5	接地焊接防腐	重新防腐	已整改		
质量情况综述					
序号	发现问题	解决措施	整改验证		
1	夹具安装间距大	返工	已整改		
2	导轨间距问题	返工	已整改		
3	檩条中间螺栓未连接	重新打眼加固	总包与厂家协商		
4	3#厂房 80KW 逆变器直流电缆敷设预留余量不足	通知总包杜绝以后类似事情	后续检查		
3、安全检查情况					
序号	安全检查项目	检查结果	发现问题	整改情况	
1	消防	合格			
2	安全帽		未带安全帽	已整改	
3	安全警示牌		未悬挂各种警示牌	会议、联系单多次提出	
安全情况综述		安全防护及安全警示悬挂不到位，监理多次提出，总包应承整改却拖。			
三、下月主要计划安排					
主要计	序号	工作事项	责任人	完成时间	备注
	1	组件安装完成	潘国锋	2022. 10. 19	

山东潍坊招商科瑞一期1.2MW 分布式光伏发电项目工程月报表

第 5 期

(2022 年 10 月 13 日至 2022 年 10 月 31 日)

本周报内容提要：

- 一. 本月主要工程进展情况概述
- 二. 本月进度、质量、安全执行情况简报
- 三. 账款管理情况
- 四. 下月主要计划安排
- 五. 现场工程照片

建设单位：潍坊旭远光伏新能源有限公司

施工单位：江苏华淇电力安装工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位：山东华岳电力技术有限公司

日期：2022 年 10 月 30 日



一、本月主要工程进展情况概述			累计完成百分比	剩余百分比
工程进展	1	夹具	累计完成：100%	剩余量：0%
	2	支架	累计完成：100%	剩余量：0%
	3	檩条加固	累计完成：100%	剩余量：0%
	4	斜撑加固	累计完成：100%	剩余量：0%
	5	电缆桥架	累计完成：85%	剩余量：15%
	6	电缆沟、设备基础	累计完成：100%	剩余量：0%
	7	交流电缆敷设	累计完成：100%	剩余量：0%
	8	组件安装	累计完成：95%	剩余量：5%
	9	逆变器安装	累计完成：90%	剩余量：10%
	10	接地安装	累计完成：80%	剩余量：20%
	11	并网柜	累计完成：50%	剩余量：50%
	12		累计完成：	剩余量：
月进度按照主要设备、分部工程完成情况填写进度				
进度执行	执行说明	并网时间改为 2022.10.31。		
	提前、滞后原因	由于施工人员少，无法按时完成组件安装、直流电缆敷设及攒管。		
	赶工措施	汇报业主催促总包赶紧增加施工人员。加快施工进度。		
二、本月质量、安全执行情况				
1、材料设备质量执行情况				
序号	到货材料设备名称	设备材料总量	累计到货数量	到货比例
1	支架	根	根	100 %
2	组件	2666 块	2666 块	100%
3	逆变器	11 台	11 台	100 %
4	直流线	11000 米	11000 米	100 %
5	电缆	1868 米	1868 米	100 %
6	接地扁铁	1500 米	1500 米	100 %
7	并网柜	2 台	2 台	100 %

划安排	2	并网柜安装直流电缆敷设、电缆头制作完成	潘国锋	2022.10.28	
	3	并网发电	潘国锋	2022.10.31	
	4	检修通道	潘国锋		
	5	清洗系统	潘国锋		

五、现场工程照片




检查吊车证件



组件安装



组件安装



组件安装




组件安装



组件安装



组件安装

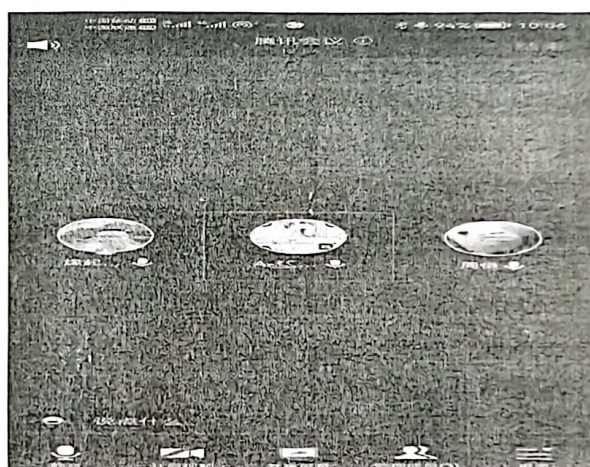

网络会议




直流电缆敷设



公母头制作



直流电缆穿管



逆变器下方公母插头制作



直流电缆穿管




电缆桥架安装



线标制作



组件测量电压



并网柜安装电表
