

质量情况综述					
序号	发现问题		解决措施	整改验证	
1	组件吊装未设警示牌、拉警戒线		现场告知增加设置警示牌、拉警戒线	已整改	
2	3#厂房组件转运中发现单人背运		通知施工单位改变转运方法	已整改	
3	1#、2#、3#厂房组件安装有踩边框现象		汇报业主		
2、工序质量执行情况					
序号	单位工程名称		验收情况	备注	
1	夹具安装		不合格	已整改	
2	支架安装		不合格	已整改	
3	连接件安装		不合格	已整改	
4	3#厂房檩条、斜撑加固		不符合要求	下消缺单	
5	接地焊接防腐		重新防腐	已整改	
质量情况综述					
序号	发现问题		解决措施	整改验证	
1	夹具安装间距大		返工	已整改	
2	导轨间距问题		返工	已整改	
3	檩条中间螺栓未连接		重新打眼加固	总包与厂家协商	
4	3#厂房 80KW 逆变器直流电缆敷设预留余量不足		通知总包杜绝以后类似事情	后续检查	
3、安全检查情况					
序号	安全检查项目	检查结果	发现问题	整改情况	
1	消防	合格			
2	安全帽		未带安全帽	已整改	
3	安全警示牌		未悬挂各种警示牌	会议、联系单多次提出	
安全情况综述		安全防护及安全警示悬挂不到位，监理多次提出，总包应承整改却拖。			
三、下月主要计划安排					
主要计	序号	工作事项	责任人	完成时间	备注
	1	组件安装完成	潘国锋	2022.10.19	

山东潍坊招商科瑞一期1.2MW 分布式光伏发电项目工程月报表

第 6 期

(2022 年 11 月 01 日至 2022 年 11 月 30 日)

本周报内容提要：

- 一. 本月主要工程进展情况概述
- 二. 本月进度、质量、安全执行情况简报
- 三. 账款管理情况
- 四. 下月主要计划安排
- 五. 现场工程照片

建设单位： 潍坊旭远光伏新能源有限公司

施工单位： 江苏华湛电力安装工程有限公司

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位： 山东华岳电力技术有限公司

日期：2022 年 11 月 30 日



一、本月主要工程进展情况概述			累计完 成百分比	剩余 百分比
工 程 进 展	1	夹具	累计完成：100%	剩余量：0%
	2	支架	累计完成：100%	剩余量：0%
	3	檩条加固	累计完成：100%	剩余量：0%
	4	斜撑加固	累计完成：100%	剩余量：0%
	5	电缆桥架	累计完成：85%	剩余量：15%
	6	电缆沟、设备基础	累计完成：100%	剩余量：0%
	7	交流电缆敷设	累计完成：100%	剩余量：0%
	8	组件安装	累计完成：100%	剩余量：0%
	9	逆变器安装	累计完成：100%	剩余量：0%
	10	接地安装	累计完成：95%	剩余量：5%
	11	并网柜	累计完成：100%	剩余量：0%
	12		累计完成：	剩余量：
月进度按照主要设备、分部工程完成情况填写进度				
进 度 执 行	执行说明	并网时间改为 2022.11.15 已全部并网。		
	提前、 滞后原因	由于现场无施工人员，监控设备未到场，240 小时试运营无法进行。		
	赶工措施	汇报业主催促总包增加施工人员进行监控安装及消缺项。		
二、本月质量、安全执行情况				
1、材料设备质量执行情况				
序号	到货材料设备名称	设备材料总量	累计到货数量	到货比例
1	支架	根	根	100 %
2	组件	2666 块	2666 块	100%
3	逆变器	11 台	11 台	100 %
4	直流线	11000 米	11000 米	100 %
5	电缆	1868 米	1868 米	100 %
6	接地扁铁	1500 米	1500 米	100 %
7	并网柜	2 台	2 台	100 %

划 安 排	2	并网柜安装直流电缆敷设、电缆头制作完成	潘国锋	2022.10.28	
	3	并网发电	潘国锋	2022.11.11	
	4	检修通道	潘国锋		
	5	清洗系统	潘国锋		

五、现场工程照片

 常州正衡电力工程监理有限公司 施工区域: 山东潍坊招商科瑞一期 1.2MW分布式光伏发电项目 施工内容: 并网柜电缆头制作 拍摄时间: 2022.11.01 星期二 天气: 雨 13°C	 常州正衡电力工程监理有限公司 施工区域: 山东潍坊招商科瑞一期 1.2MW分布式光伏发电项目 施工内容: 并网柜电缆头制作 拍摄时间: 2022.11.02 星期三 天气: 晴 20°C
并网柜电缆头制作	并网柜电缆头制作
 常州正衡电力工程监理有限公司 施工区域: 山东潍坊招商科瑞一期 1.2MW分布式光伏发电项目 施工内容: 并网柜电缆头制作 拍摄时间: 2022.11.03 星期四 天气: 阴 11°C	 常州正衡电力工程监理有限公司 施工区域: 山东潍坊招商科瑞一期 1.2MW分布式光伏发电项目 施工内容: 并网柜接通讯线 拍摄时间: 2022.11.04 星期五 天气: 多云 6°C
并网柜电缆头制作	并网柜通讯线连接




1#吃饭没组件间公母头连接




2#厂房直流电缆穿管



2#厂房直流电缆穿管

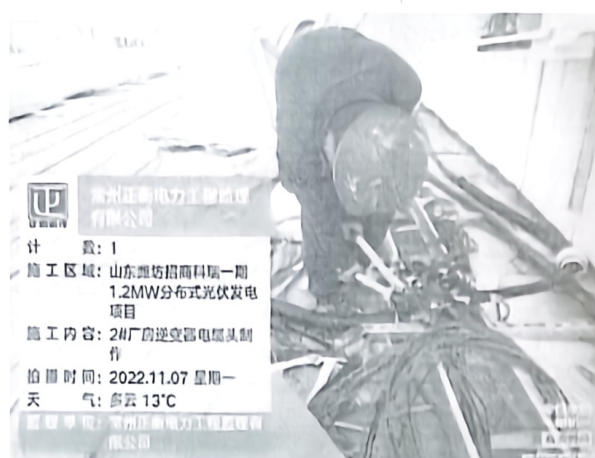

2#厂房逆变器电缆头制作

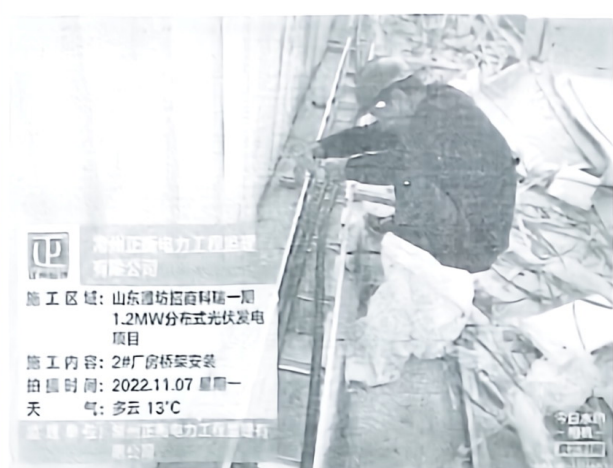


2#厂房电缆桥架安装



2#厂房组件安装



2#厂房电缆桥架安装

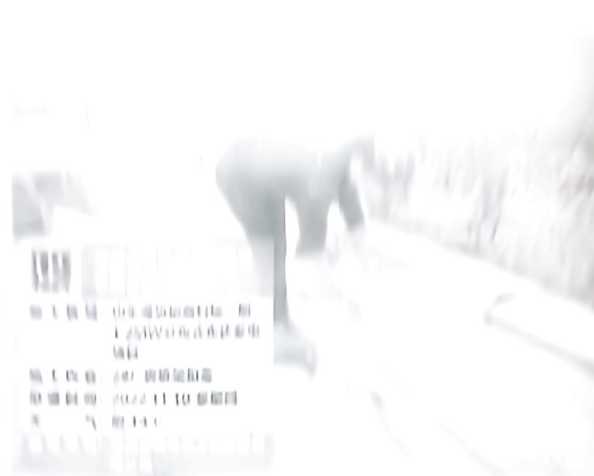

2#厂房电缆桥架盖板安装



3#厂房电缆绑扎




3#厂房电缆桥架盖板安装



立式桥架盖板安装前检查吊车证件




立式桥架盖板安装

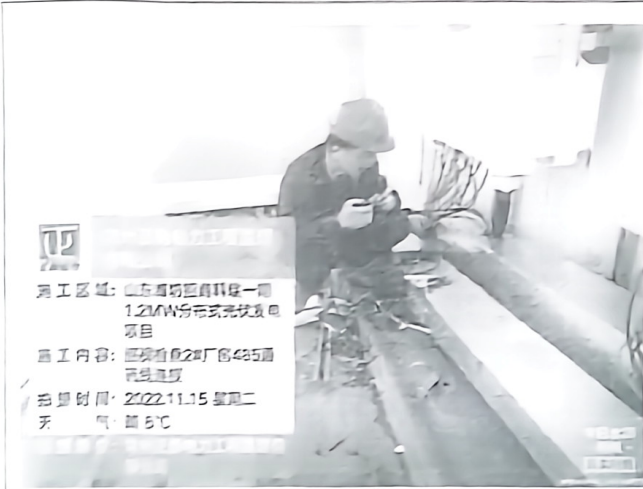

72
7200

施工区域: 招商局招商科瑞一期
1.2MW分布式光伏项目
项目
施工内容: 招商局2#厂房485通
讯线连接
拍摄时间: 2022-11-15 星期二
天气: 晴 5℃

2#厂房 485 通讯线链接安装

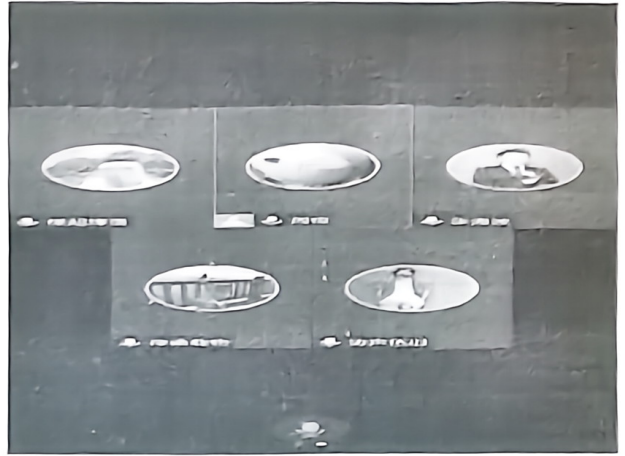

招商科瑞项目后续消缺、试运营、验收、移交会议
