

山东潍坊招商科瑞一期1.2MW 分布式光伏发电项目工程月报表

第 2 期

(2022 年 06 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日)

本周报内容提要:

- 一. 本月主要工程进展情况概述
- 二. 本月进度、质量、安全执行情况简报
- 三. 账款管理情况
- 四. 下月主要计划安排
- 五. 现场工程照片

建设单位: 潍坊旭远光伏新能源有限公司

施工单位: 江苏华湛电力安装工程有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位: 山东华岳电力技术有限公司


日期: 2022 年 07 月 01 日



一、本月主要工程进展情况概述			累计完成百分比	剩余百分比	
工程进展	1	夹具	累计完成：70%	剩余量：30%	
	2	支架	累计完成：70%	剩余量：30%	
	3	檩条加固	累计完成：43%	剩余量：57%	
	4	斜撑加固	累计完成：33%	剩余量：67%	
	5		累计完成：	剩余量：	
	6		累计完成：	剩余量：	
	7		累计完成：	剩余量：	
	8		累计完成：	剩余量：	
	9		累计完成：	剩余量：	
	10		累计完成：	剩余量：	
	11		累计完成：	剩余量：	
	14		累计完成：	剩余量：	
月进度按照主要设备、分部工程完成情况填写进度					
进度执行	执行说明	加固檩条及斜撑没有按照计划完成			
	提前、滞后原因	由于天气、其他三方协议影响及资金安排，组件安装施工人员未进场施工。			
	赶工措施	加固施工、组件安装施工增加施工班组人员			
二、本月质量、安全执行情况					
1、材料设备质量执行情况					
序号	到货材料设备名称		设备材料总量	累计到货数量	到货比例
1	支架		根	根	100 %
2	组件		块	块	%
3	逆变器		台	台	%
4	直流线		米	米	%
质量情况综述					

序号	发现问题		解决措施	整改验证	
1	支架导轨夹具未按照设计图纸安装		7月2日安排人员消缺整改		
2	3#厂房檩条加固未按照图纸施工		原有檩条悬空，汇报业主		
3					
2、工序质量执行情况					
序号	单位工程名称		验收情况	备注	
1	夹具安装		不合格	5月份以前安装	
2	支架安装		不合格	5月份以前安装	
3	连接件安装		不合格	5月份以前安装	
4	3#厂房檩条、斜撑加固		不符合要求	安装完成整改消缺	
质量情况综述					
序号	发现问题		解决措施	整改验证	
1	夹具安装间距大		返工	未完成	
2	导轨间距问题		返工	未完成	
3	中间未连接		重新打眼加固		
3、安全检查情况					
序号	安全检查项目	检查结果	发现问题	整改情况	
1	消防	合格			
2	安全帽		未带安全帽	已整改	
3	安全警示牌	合格			
安全情况综述					
三、下月主要计划安排					
主要计划安排	序号	工作事项	责任人	完成时间	备注
	1	厂房加固	潘国锋	2022、7、5	
	2	支架、组件安装完成	潘国锋	2022、7、18	
	3	并网柜安装、逆变器安装、电缆敷设完成	潘国锋	2022、7、20	
	4	并网发电		2022、7、20	
	5				

五、现场工程照片

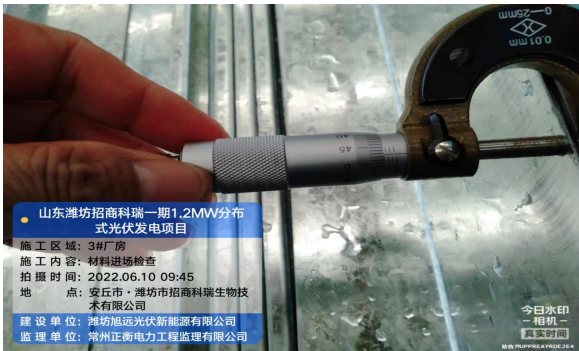

檩条检查



斜撑检查



夹具检查




檩条检查



例会




檩条检查

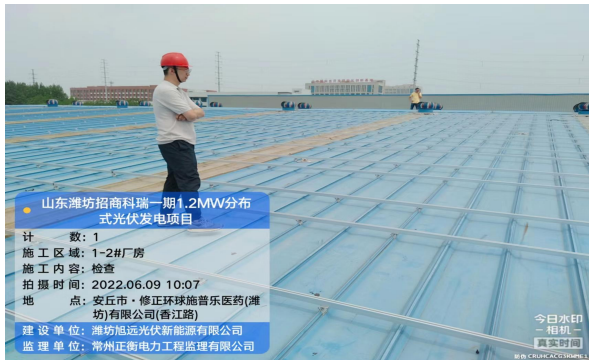

支架检查



监理资料审查

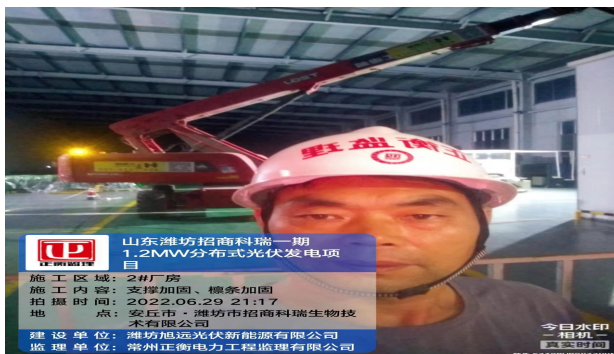

巡检加固



例会



檩条加固




斜撑加固



加固




斜撑测量

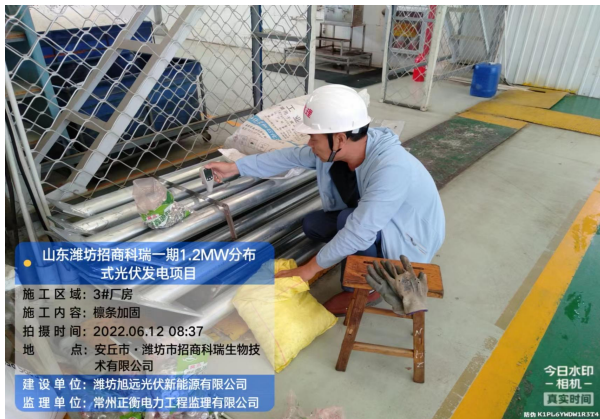

山东潍坊招商科瑞一期1.2MW分布式光伏发电项目
施工区域: 3#厂房
施工内容: 檩条加固
拍摄时间: 2022.06.12 08:37
地点: 安丘市·潍坊市招商科瑞生物技术有限公司
建设单位: 潍坊旭远光伏新能源有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
相机
真实时间

斜撑检查

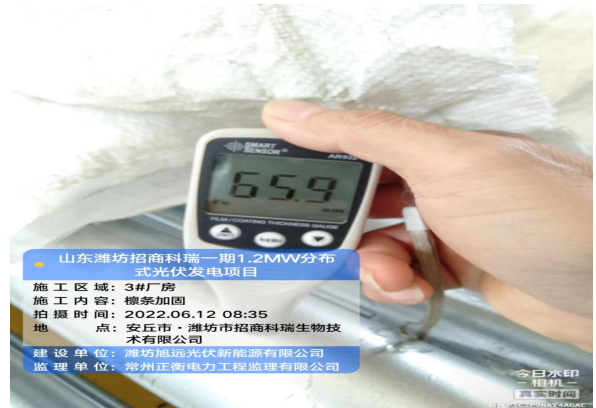

山东潍坊招商科瑞一期1.2MW分布式光伏发电项目
施工区域: 3#厂房
施工内容: 檩条加固
拍摄时间: 2022.06.12 08:35
地点: 安丘市·潍坊市招商科瑞生物技术有限公司
建设单位: 潍坊旭远光伏新能源有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
相机
真实时间

镀锌层测量



山东潍坊招商科瑞一期1.2MW分布式光伏发电项目
施工区域: 3#厂房
施工内容: 支撑加固
拍摄时间: 2022.06.15 08:04
地点: 安丘市·香江路23号
建设单位: 潍坊旭远光伏新能源有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
相机
真实时间


加固



山东潍坊招商科瑞一期1.2MW分布式光伏发电项目
施工区域: 3#厂房
施工内容: 檩条加固
拍摄时间: 2022.06.18 09:03
地点: 安丘市·山东亿达矿业器材有限公司
建设单位: 潍坊旭远光伏新能源有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
相机
真实时间

加固



山东潍坊招商科瑞一期1.2MW分布式光伏发电项目
施工区域: 现场
施工内容: 安全活动
拍摄时间: 2022.06.19 09:30
地点: 安丘市·潍坊市招商科瑞生物技术有限公司
建设单位: 潍坊旭远光伏新能源有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
相机
真实时间

安全月活动




山东潍坊招商科瑞一期1.2MW分布式光伏发电项目
施工区域: 现场
施工内容: 安全活动
拍摄时间: 2022.06.19 09:26
地点: 安丘市·潍坊市招商科瑞生物技术有限公司
建设单位: 潍坊旭远光伏新能源有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
相机
真实时间


安全月活动



施工资料签字

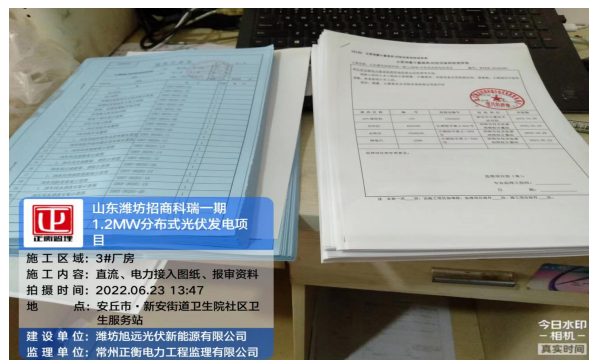

图纸

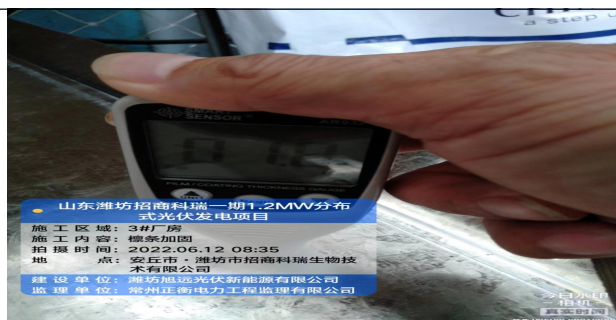

檩条检查



导轨检查
