

山东潍坊招商科瑞一期1.2MW 分布式光伏发电项目工程月报表

第 4 期

(2022 年 08 月 01 日至 2022 年 08 月 30 日)

本周报内容提要:

- 一. 本月主要工程进展情况概述
- 二. 本月进度、质量、安全执行情况简报
- 三. 账款管理情况
- 四. 下月主要计划安排
- 五. 现场工程照片

建设单位: 潍坊旭远光伏新能源有限公司

施工单位: 江苏华湛电力安装工程有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位: 山东华岳电力技术有限公司

日期: 2022 年 8 月 31 日



一、本月主要工程进展情况概述			累计完成百分比	剩余百分比	
工 程 进 展	1	夹具	累计完成：100%	剩余量：0%	
	2	支架	累计完成：100%	剩余量：0%	
	3	檩条加固	累计完成：87%	剩余量：13%	
	4	斜撑加固	累计完成：86%	剩余量：14%	
	5	电缆桥架	累计完成：80%	剩余量：20%	
	6	电缆沟、设备基础	累计完成：100%	剩余量：0%	
	7	交流电缆敷设	累计完成：100%	剩余量：0%	
	8	组件安装	累计完成：18%	剩余量：82%	
	9	逆变器安装	累计完成：90%	剩余量：10%	
	10	接地安装	累计完成：80%	剩余量：20%	
	11		累计完成：	剩余量：	
	12		累计完成：	剩余量：	
月进度按照主要设备、分部工程完成情况填写进度					
进 度 执 行	执行说明	设备材料总包没有按照计划完成			
	提前、滞后原因	由于组件、逆变器、并网柜、格栅板因资金安排问题未进场，造成安装施工人员进场休班及人员少等原因影响施工进度。			
	赶工措施	汇报业主催促总包组件，逆变器、并网柜、格栅板等设备材料进场。材料进场后增加施工人员。			
二、本月质量、安全执行情况					
1、材料设备质量执行情况					
序号	到货材料设备名称		设备材料总量	累计到货数量	到货比例
1	支架		根	根	100 %
2	组件		2666 块	434 块	18 %
3	逆变器		11 台	11 台	100 %
4	直流线		11000 米	11000 米	100 %
5	电缆		1868 米	1868 米	100 %
6	接地扁铁		1500 米	1500 米	100 %
质量情况综述					

序号	发现问题		解决措施	整改验证	
1	支架导轨夹具未按照设计图纸安装		7月14日安排人员消缺整改	已整改	
2	3#厂房檩条加固未按照图纸施工		原有檩条悬空，汇报业主		
3	1#、2#厂房加固未按照图纸施工		汇报业主	厂家电话要求	
2、工序质量执行情况					
序号	单位工程名称		验收情况	备注	
1	夹具安装		不合格	已整改	
2	支架安装		不合格	已整改	
3	连接件安装		不合格	已整改	
4	3#厂房檩条、斜撑加固		不符合要求	下消缺单	
5	接地焊接防腐		重新防腐	已整改	
质量情况综述					
序号	发现问题		解决措施	整改验证	
1	夹具安装间距大		返工	已整改	
2	导轨间距问题		返工	已整改	
3	檩条中间螺栓未连接		重新打眼加固	总包与厂家协商	
4	3#厂房 80KW 逆变器直流电缆敷设预留余量不足		通知总包杜绝以后类似事情	后续检查	
3、安全检查情况					
序号	安全检查项目	检查结果	发现问题	整改情况	
1	消防	合格			
2	安全帽		未带安全帽	已整改	
3	安全警示牌		未悬挂各种警示牌	已整改	
安全情况综述		安全防护不到位，监理多次提出，总包应承整改却拖。业主安全检查提出复工整改前整改完成。			
三、下月主要计划安排					
主要计划	序号	工作事项	责任人	完成时间	备注
	1	因组件、并网柜进场事宜复工时间待定			
	2	并网柜安装直流电缆敷设、电缆头制作完成	潘国锋		

安排	3	并网发电	潘国锋		
	4	检修通道	潘国锋		
	5	清洗系统	潘国锋		

五、现场工程照片




安全质量检查



安全质量检查



安全学习

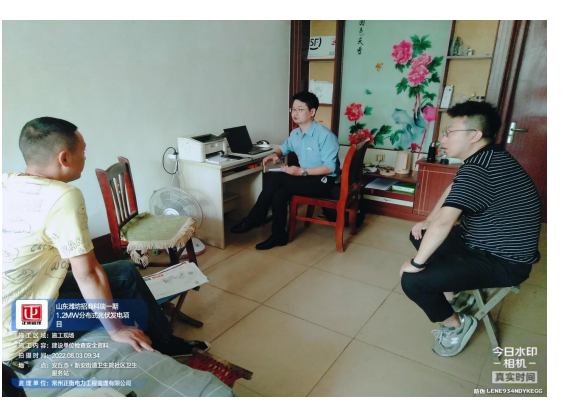

安全学习



巡检



巡检

 现场巡检	组件吊装
檩条加固检查	导轨加工
垂直桥架安装	桥架焊接
桥架对接	并网柜基础设计
电缆热缩管	逆变器开箱检查
电缆沟施工	并网柜基础施工
导轨加固	电缆沟防水施工
电缆沟施工	屋面导轨夹具加固
