

马鞍山海狮织造有限公司 3MW 分布式 光伏发电项目

监理单位月报 2022 年 2 期

项目名称：马鞍山海狮织造有限公司 3MW 分布式光伏发电项目		填报周期：2022 年 7 月 1 日—7 月 31 日		
一、项目总体建设进度汇总： 1、班组建设（新进人员入场体检、安全交底培训）； 2、支架完成安装 3、检修通道安装完成 4、接地扁铁安装完成 5、桥架安装完成 6、1*4 平方线敷设完成 7、组件吊装、安装完成 8、室外配电柜基础制作完成 9、过路桥架梁制作完成 10、接地黄绿线安装完成 11、室外并网柜就位完成 12、电缆沟开挖、埋管完成 13、室内并网柜基础制作完成 14、交流电缆敷设完成 15、并网柜电缆头制作完成 16、接地扁铁黄绿油漆涂刷完成				
二、本月工程建设工作内容及完成情况				
1、支架及组件安装	支架完成 100%； 组件完成 100%			
2、逆变器及并网柜	并网柜 100%；逆变器 100%。			
3、现场调试	完成 0%。			
4、桥架、接地	桥架 100%；接地 100%；			
5、电缆敷设接线	完成 0%			
6、出图情况	未出图纸。			
0010、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本月到货情况，累计到货（），已到货数量（）% 延误原因及催货措施
	支架	5 月 6 日	5 月 6 日	到货 100%



	电缆桥架	5月7日	5月7日	到货 100%
	并网柜	6月28日	月 日	到货 100%
	组件	5月28日	5月28日	到货 100%
	逆变器	6月9日	6月9日	到货 100%
	电缆设备	5月29日	5月29日	到货 100%
11、人员/机械情况	本月施工人员 9 人，吊车 1 台，叉车一台			
三、截止本月工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首套组件安装	6月18日	/月 /日	/月 /日	
2、全容量并网	8月3日	月 日	月 日	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题 解决进展	无			
五、下月计划主要工作内容				
1、安装组件	安装完成 100%			
2、安装桥架	安装完成 100%			
3、检修通道安装	安装完成 100%			
4、安装逆变器	安装完成 100%			
5、敷设线缆	安装完成 100%			
6、安装并网柜	安装完成 100%			
7、全容量并网	安装完成 100%			


填报人： 唐剑 审核人： 唐剑 时间： 2022年7月30日

工程现场照片







支架安装

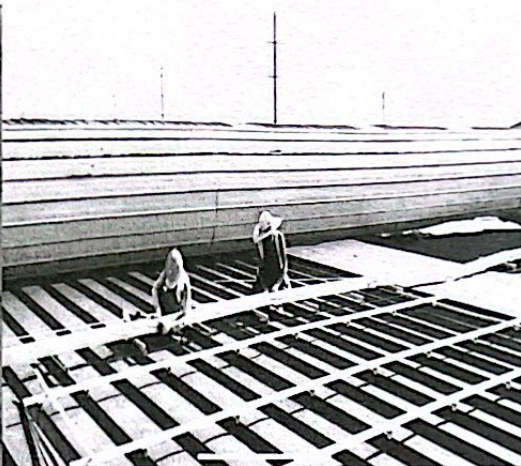


桥架安装

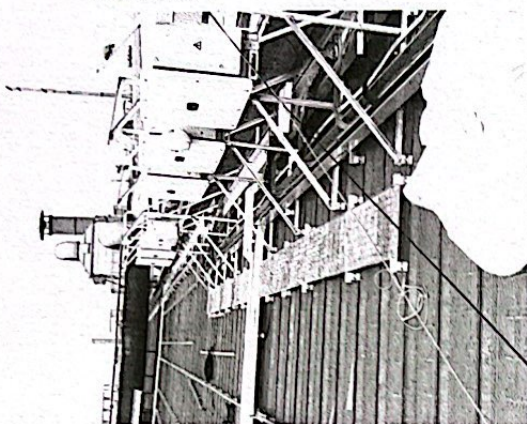


逆变器安装

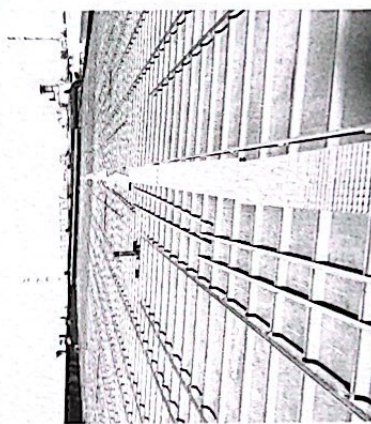

检修通道板安装

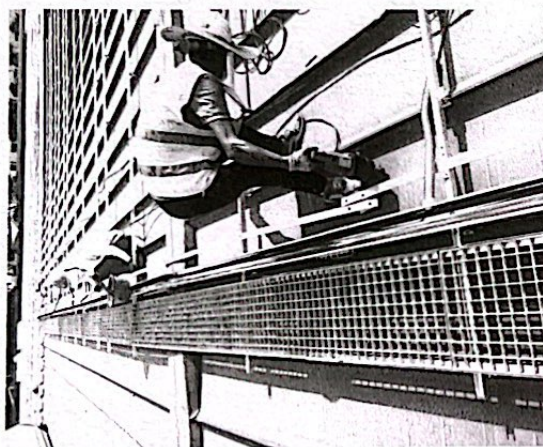

接地扁铁安装

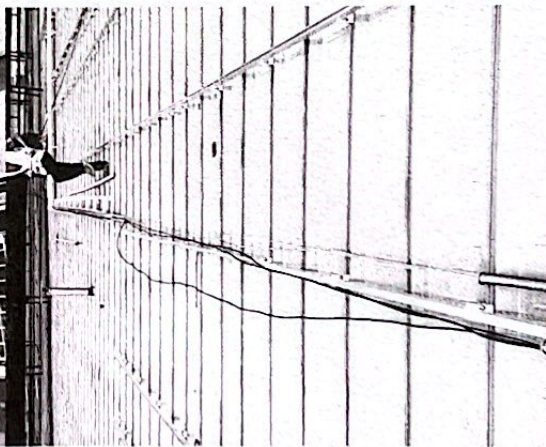


1*4 平放线敷设







组件吊装散料

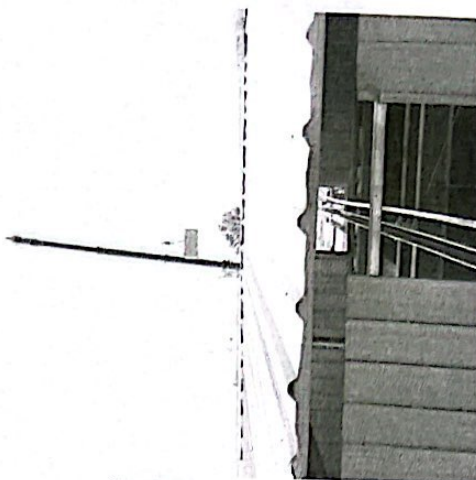

组件吊装

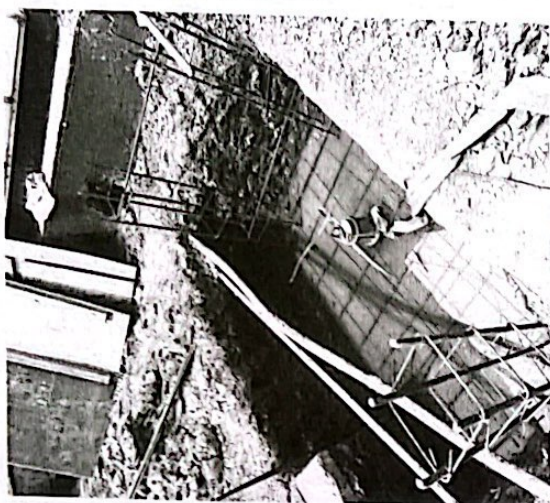

室外配电柜基础制作

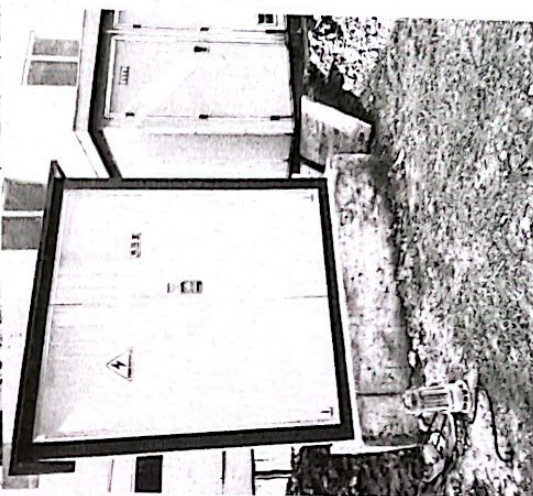

室外柜就位




过路管开挖




电缆沟开挖




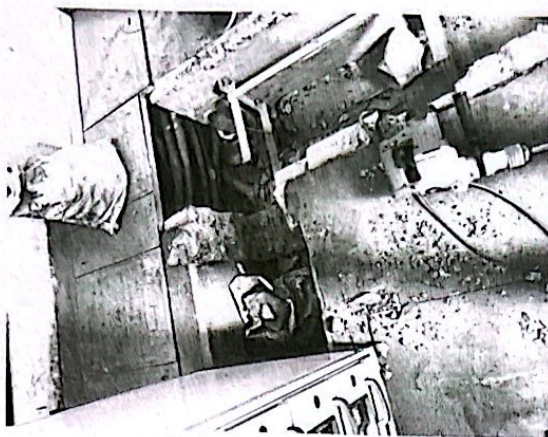


配电房并网柜基础开挖

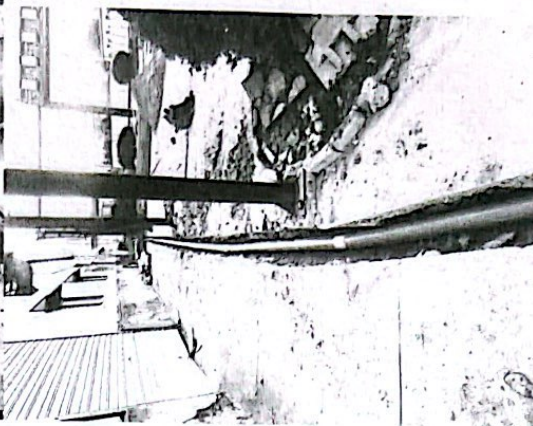

电缆预埋管

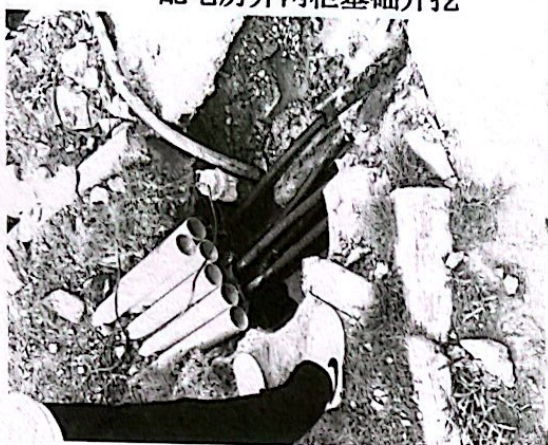


电缆预埋管

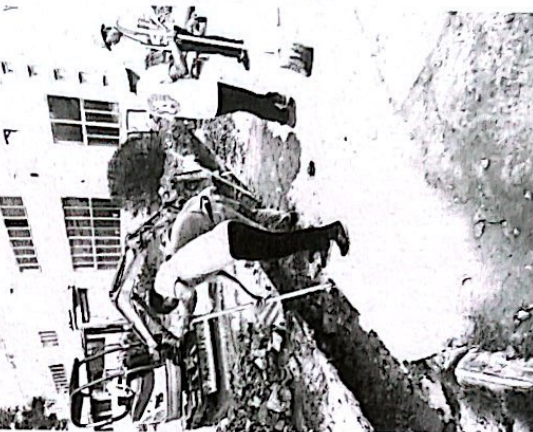

过路电缆沟开挖清理



过路电缆沟路面恢复混凝土浇筑

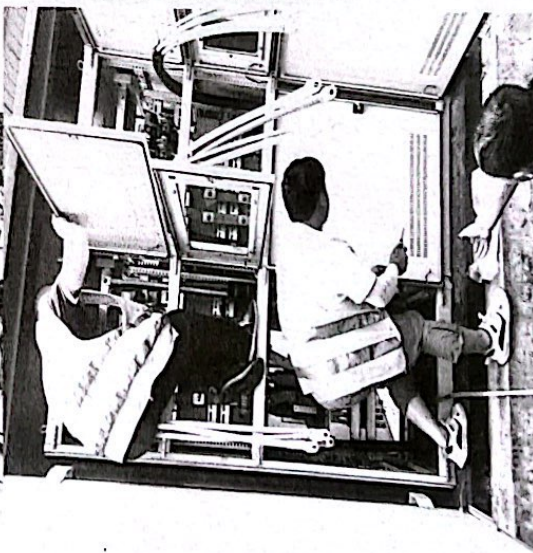


室外并网柜电缆头制作



室内并网柜电缆头制作




交流电缆敷设

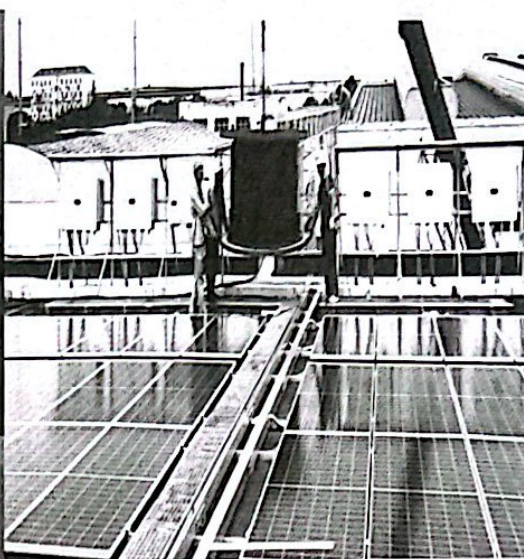


交流电缆敷设




交流电缆敷设

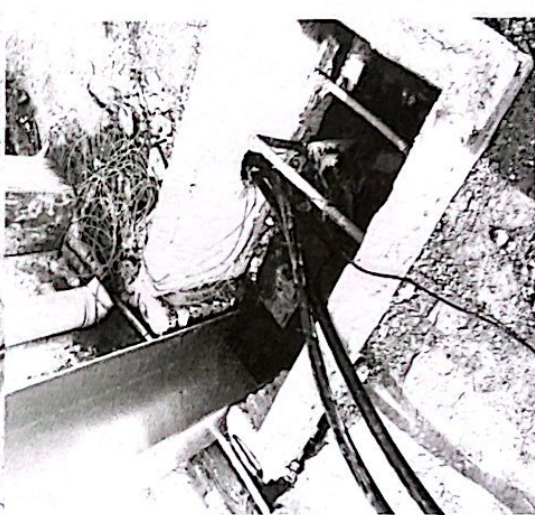

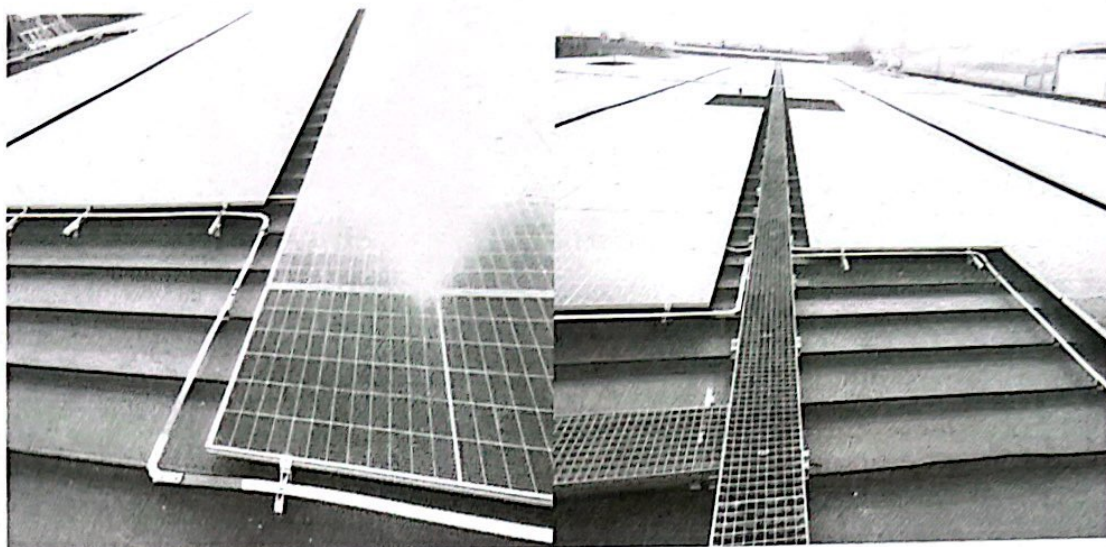

接地扁铁黄绿油漆涂刷

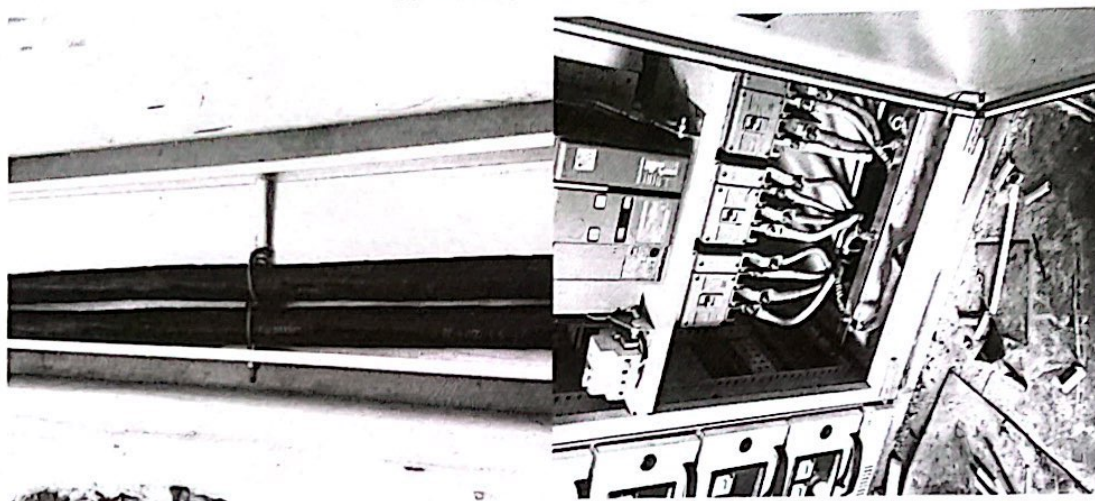

下墙电缆绑扎

并网柜电缆接线

