



编号: JL-(HDZQ)-08

监 理 月 报

工程名称: 华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏

发电项目(一期80MW)

2023年12月第08期

项目监理部(章):

总监理工程师:



报告日期: 2023年12月31日

监 理 月 报

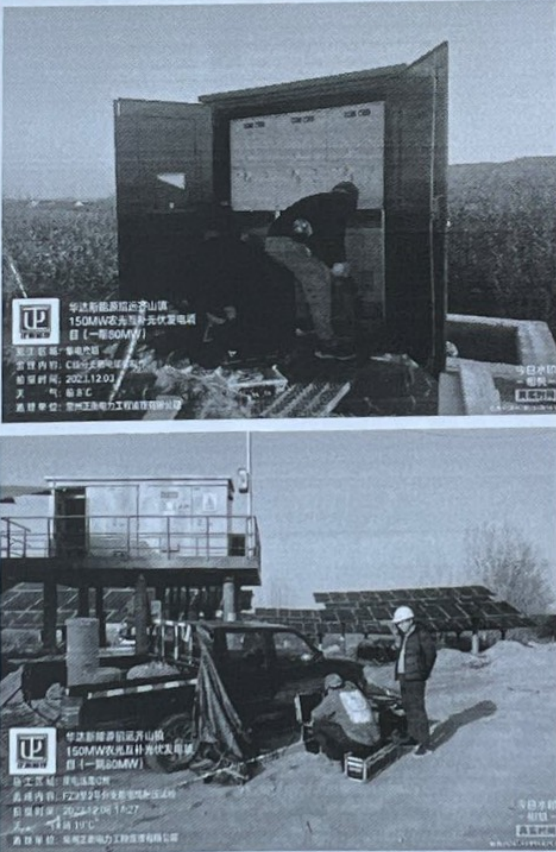
工程名称： 华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目(一期80MW) 月次 第8次 月报

开始时间 2023年12月1日 结束日期 2023年12月31日 监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目(一期80MW)		影像	56张	

一、. 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目(一期80MW) 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	1、送出线路立塔累计完成100%；架线完成100%。 2、升压站配电房累计完成100%；运维楼累计完成100%；地下设备用房累计完成100%；设	1、光伏区支架安装、组件安装，接地焊接完成低压、直流敷设完成。 2、集电线路电缆井砌筑完成。 3、光伏区消缺

  华达新能源铝基青山岭 150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW） 施工区域：集电线路A线 监督内容：FZ0路旁附近电缆敷设 拍摄时间：2023.12.07 11:53 天气：轻度雾霾 11℃ 监理单位：常州通顺电力工程监理有限公司	备基础累计完成100%； 3、光伏区沉桩累计完成100%。 4、组件安装累计完成87.5%，支架安装累计完成87.7% 5、光伏区接地累计64.5%。	
  华达新能源铝基青山岭 150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW） 施工区域：集电线路A线 监督内容：FZ0路旁附近电缆敷设 拍摄时间：2023.12.07 11:53 天气：轻度雾霾 11℃ 监理单位：常州通顺电力工程监理有限公司	6、集电线路B线累计完成100% C线累计完成100% A线累计完成100% 7、倒送电完成，12.31 首次并网成功	
设备交付进度	设备交付100%	/
设计交付进度	交付完成	交付完成
质量体系运作情况	运行良好	继续督促完善质量保证体系

	施工图会审	完成	/
	设计交底	完成	/
	方案审查	审查部分施工方案	/
	技术交底	要求对新进安装人员进行技术交底	督促进行技术交底
	设计变更	无	/
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育培训
	安全交底情况	完成	继续督促施工单位进行安全交底
	安全措施落实情况	基本落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施一般	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	符合设计及规范要求	支架安装, 组件安装, 电气安装
	主要原材料质量	符合设计及规范要求	对进场原材料进行验收

	构(配)件质量	进场构配件合格证齐全, 验收合格	检查进场构配件质量
	设备质量	逆变器、箱变进场, 验收合格	检查进场设备质量
	质量验评情况	工序施工符合要求	对检验批、分项、分部进行检验评定
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同已签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成	累计完成	备注
1	消防			2023.12.1	2023.12.31	100%	100%	
2	排水			2023.12.1	2023.12.31	100%	100%	
3	道路修筑			2023.12.1	2023.12.31	100%	100%	
4	升压站电气施工			2023.12.1	2023.12.31	100%	100%	
5	集电线路C线			2023.12.1	2023.12.31	100%	100%	
6	集电线路B线			2023.12.1	2023.12.31	100%	100%	
7	设备基础			2023.12.1	2023.12.31	100%	100%	
8	组件安装			2023.12.1	2023.12.31	2.1%	87.7%	
9	光伏区接地			2023.12.1	2023.12.31	2%	64.5%	
10	低压电缆敷设			2023.12.1	2023.12.31	30%	60%	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成	备注
----	------	--------	--------	--------	--------	--------	----

1	组件安装	2024.1.1	2024.1.31			100%	
2	支架安装	2024.1.1	2024.1.31			100%	
3	低压电缆沟开挖	2024.1.1	2024.1.31			100%	
4	直流电缆敷设	2024.1.1	2024.1.31			100%	
5	光伏区箱变调试	2024.1.1	2024.1.31			100%	
6	电缆井砌筑	2024.1.1	2024.1.31			100%	
8	光伏区接地	2024.1.1	2024.1.31			100%	
9	逆变器接线	2024.1.1	2024.1.31			100%	
10	低压电缆敷设	2024.1.1	2024.1.31			100%	

四、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件(份)	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	1	189人	3	/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位增加人员、机械；解决阻工问题。	督促要求施工单位增加人力及施工机械投入。
安全管理	实行作业票制度，督促施工单位对现场安全问题进行整改；消除安全隐患，落实安全文明施工措施。	要求施工单位做好安全教育培训，加强现场安全管理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	对工序质量进行验收检查，不合格的要求整改，并复验合格。	督促施工单位严格按照设计要求和标准规范要求 进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，	检查施工单位各项方案及技术措施落实情况。

	现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工	
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	督促施工材料、设备等有序进场	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作

常州正衡华达新能源招远齐山镇150MW 农光互补光伏发电项目
(一期80MW) 监理部

2023年12月31日
