

编号：CHWM-B11-001

监 理 月 报

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目

第 001 期

总监理工程师：王立杰

长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目



报告日期：2022年02月28日

监 理 月 报

一、工程形象进度

1、主要材料、设备进场情况

- 1) 支架到货 2.00232MW，累计到货 100%。
- 2) 540Wp 组件到货 3708 块，累计到货 100%。
- 3) 100kw 逆变器到货 15 台，50kw 逆变器到货 5 台，累计到货 100%。

2、本月施工完成情况

人员情况：管理人员 2 人，施工人员 8 人。

施工设备：吊车 1 台、手电钻 2 台、电动扳手 8 台。

- 1) 本月完成安装临边临时安全护栏，累计完成 100%。
- 2) 本月支架安装完成 1.50232MW，累计完成 75%。

二、主要监理工作情况

1、工程进度控制方面的工作情况

本月工程施工进度按工程总进度计划正常进行，下月需加快施工的进度，确保工程总进度目标的早日实现。

2、工程质量控制方面的工作情况

本月施工质量情况较好，但个别处也存在着支架安装不顺直、偏差较大等问题。针对这些问题，监理项目部已签发了整改通知单，要求施工单位进行整改。整改完成后经复查，符合要求。

3、安全生产管理方面的工作情况

本月施工安全情况较好，但也存在着个别施工人员不戴安全帽、不按安全规定上下爬梯的情况。针对这些问题，监理项目部已签发了整改通知单，要求施工单位立即进行整改，加强现场的安全交底工作，消除一切安全隐患，确保施工人员的安全，并对现场安全管理人员提出了警告。整改完成后经复查，符合要求。

监理项目部采取巡视、平行检验、旁站等多种方式，加强了过程控制，发现问题，立即处理并及时复查整改情况，直到符合要求为止。

4、工程计量与工程款支付方面的工作情况

暂无。

5、合同及其他方面的管理工作情况

- 1) 继续协调好参建单位间的关系，及时解决工程建设过程中存在的问题。
- 2) 对业主所提的要求，及时传达到施工单位。

三、工程存在问题及建议

- 1、施工单位要尽快把开工报审等前期报审资料和已进场材料、设备资料向监理项目部报审和报验，严禁不合格材料进场使用。
- 2、其他未进场的施工材料、设备的进场进度较为缓慢，要求相关单位下月要加快材料、设备的进场进度，采取相应措施、积极协调，确保材料、设备尽快进场。
- 3、施工单位要进一步加强施工现场的安全管理力度，消除一切安全隐患。
- 4、施工单位要加强施工质量的管理，加强三级自检和向监理方报验工作，确保工程按规范、图纸和工程建设的有关要求施工。

四、下月监理工作安排


1、在工程管理方面的工作安排

加强现场的巡视检查力度，在工程进度、质量、安全和协调等方面加大管理力度，把控好进场材料和施工的质量关，把控好人员、设备的安全关，发现问题及时处理，抓好施工安全、质量、进度等方面的管理工作，加强协调与沟通，确保各项工作安全、保质保量的按期完成。

2、在项目监理机构内部管理方面的工作安排

学习专业知识，加强对图纸和规范的了解，加强内部管理，做好资料的审核和整理工作，圆满完成本工程的监理任务。


五、相关影像资料

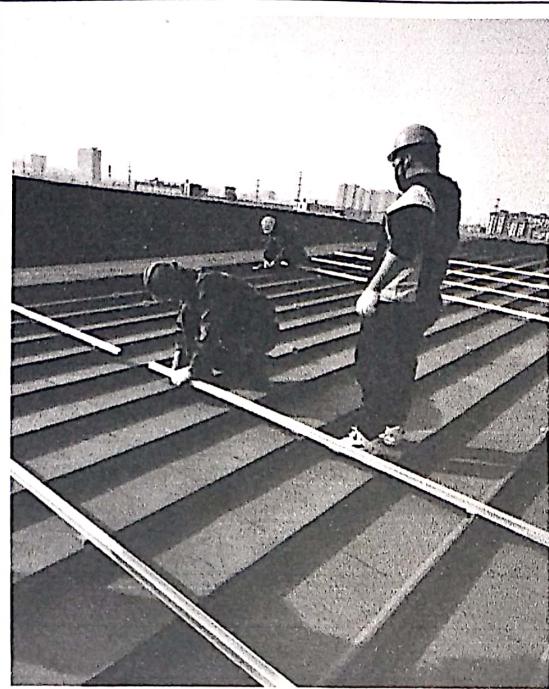


支架安装



支架安装检查

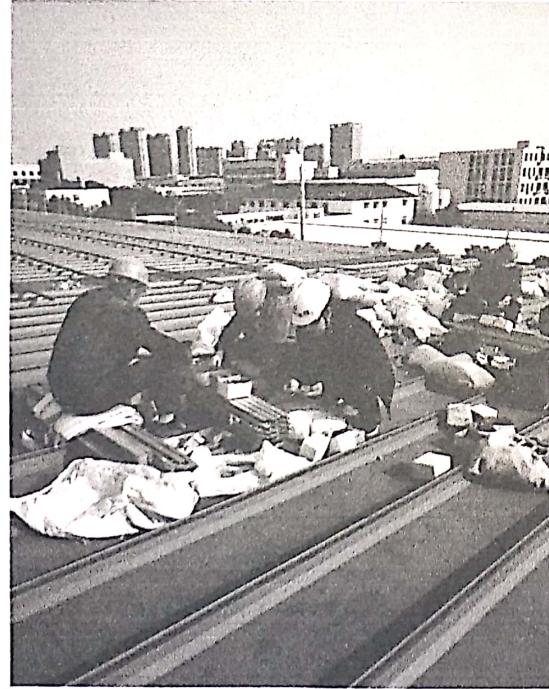

进场材料检查

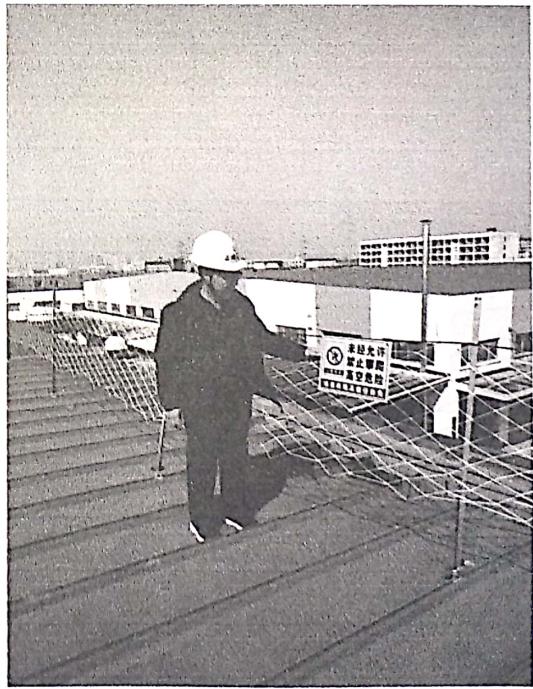

现场安全检查
