

编号: KSHXN-JLYB-002

监 理 月 报

工程名称: 苏州阳刚新能源有限责任公司昆山瀚讯诺电子有限公司
651.91KW 分布式光伏发电项目

2022 年 09 月第 02 期

总监理工程师: 王立杰

监理项目部 (章)

2022 年 09 月 30 日

监 理 月 报

工程名称: 苏州阳刚新能源有限责任公司昆山瀚讯诺电子有限公司 651.91KW 分布式光伏发电项目

月报开始时间 2022 年 09 月 01 日 结束日期 2022 年 09 月 30 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、 监理重点工作情况

专业	影像资料	
进度		防雷接地扁铁焊接
		防雷接地扁铁固定
		运维通道格栅板安装固定



电缆桥架连接固定



光伏支架调整



组件吊装



单人搬运组件



组件搬运分散



组件安装按压组件



公母插头连接



光伏逆变器安装



组件安装固定



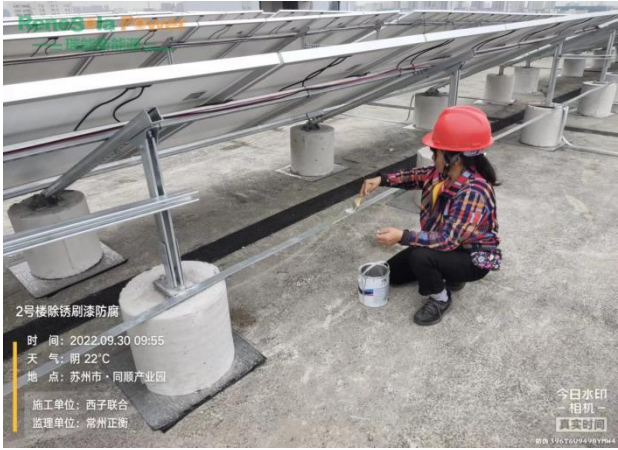
直流电缆穿管保护



光伏逆变器支架焊接固定



光伏逆变器进出口电缆桥架安装

	 2号楼除锈刷漆防腐 时 间: 2022.09.30 09:55 天 气: 阴 22℃ 地 点: 苏州市·同顺产业园 施工单位: 西子联合 监理单位: 常州正衡 今日水印 相机 真实时间  组件安装角度检查 时 间: 2022.09.30 10:44 天 气: 阴 23℃ 地 点: 苏州市·昆山市晶良五金制品有限公司 施工单位: 西子联合 监理单位: 常州正衡 今日水印 相机 真实时间	防雷接地扁铁除锈 刷漆防腐
	设备交付进度	组件及逆变器已到 场
	设计交付进度	电子图纸已出图
	质量体系运作情况	/
	施工图会审	已进行图纸会审
	设计交底	已完成设计交底
	方案审查	未提交
	技术交底	已完成技术交底
	设计变更	已完成设计变更
安全	安全培训情况	新进场员工已进行 安全培训
	安全交底情况	督促施工单位对危 险作业点进行班前 交底

	安全措施落实情况	已落实
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好
质量	主要工序质量	工序验收质量合格
	主要原材料质量	进场原材料符合设计要求，质量证明文件齐全
	构（配）件质量	构配件符合设计要求，质量证明文件齐全
	设备质量	进场设备符合设计要求，质量证明文件齐全
	质量验评情况	/
投资	资金情况	/
	款项支付情况	/
	预算外签证	/
合同	合同签订情况	施工合同签订
	合同执行情况	按合同执行

二、 本月进度情况

1、1 号楼彩钢瓦屋面防雷接地扁铁焊接完成约 50%。运维通道格栅板安装固定完成 100%。组件吊装至屋面完成 100%；组件搬运分散完成 100%；组件安装完成约 70%。光伏逆变器支架焊接安装完成 100%。光伏逆变器安装完成 100%。

2、2 号楼彩钢瓦屋面防雷接地扁铁焊接完成 100%。组件吊装至屋面完成 100%；组件搬运分散完成 100%；组件安装完成 100%。光伏逆变器支架焊接安装完成 100%。光伏逆变器安装完成 100%。

3、3 号楼彩钢瓦屋面防雷接地扁铁焊接完成 100%。组件吊装至屋面完成 100%；组件搬运分散完成 100%；组件安装完成 100%。光伏逆变器支架焊接安装完成 100%。光伏

逆变器安装完成 100%。

4、食宿楼混凝土屋面电缆桥架分散连接安装固定完成 100%。光伏直流电缆敷设完成 100%。防雷接地扁铁焊接完成 100%。组件吊装至屋面完成 100%；组件搬运分散完成 100%；组件安装完成 100%。光伏逆变器支架焊接安装完成 100%。光伏逆变器安装完成 100%。

三、 下月进度计划

- 1、组件安装完成 100%。
- 2、交流电缆敷设完成 100%。
- 3、逆变器接线调试完成 100%。
- 4、并网柜安装调试完成 100%。
- 5、并网发电。

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包 队伍 数量	分包 队伍 人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	/	8 人	/	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管 理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	/

安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人員、特殊工种、特殊作業人員資格證明文件，實施安全監理，發現問題及時提出整改要求並限期改正。	/
质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	/
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	/
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	/
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	/

常州正衡电力工程监理有限公司

苏州阳刚新能源有限责任公司昆山瀚讯诺电子有限公司 651.91KW 分布式光伏发电项目

2022 年 09 月 30 日
