

编号: QCGF-A. 0. 13-013

安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

监 理 月 报

第 013 期

总监理工程师: 王立杰

常州正衡电力工程监理有限公司

安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目监理项目部 (章)

报告日期: 2023 年 09 月 30 日



监 理 月 报

一、工程形象进度

1、本月主要材料、设备进场情况

- 1) 光伏支架到货 0MW，累计到货 27.5MW。
- 2) 550W 组件到货 0MW，累计到货约 28.5MW。
- 3) 逆变器到货 0 台，累计到货 127 台。
- 4) 直流电缆到货 0MW，累计到货 28.5MW。
- 5) 箱变到货 0 台，累计到货 13 台。
- 6) SVG 设备到货 0 台，累计到货 5 台。
- 7) 高压电缆到货 0MW，累计到货 28.5MW。
- 8) 高压柜到货 0 台，累计到货 27 台。
- 9) 交流电缆到货 0MW，累计到货 28.5MW。
- 10) 车棚基础预埋螺栓到货 0 套，累计到货 800 套。
- 11) $\Phi 12$ 车棚基础钢筋到货 0 吨，累计到货 13 吨。

2、本月施工完成情况

人员情况：管理人员 3 人，施工人员 10 人。

施工设备：吊车 1 台、叉车 1 台、挖掘机 1 台、运输车 2 辆。

施工情况：

- 1) 天和厂区机加工车间屋面、联合车间屋面渗水点查修完成。
- 2) 天利厂区车棚基础基坑清理。
- 3) 天利厂区车棚基础现场（原绿化带区域）地表清理完成。
- 4) 欧波厂区车棚基础混凝土浇筑完成。
- 5) 天利、天和、欧波、铸造厂区光伏安装工程尾工消缺。

二、主要监理工作情况

1、工程进度控制方面的工作情况

本月因现场缺少材料和阴雨天气较多等原因，施工进度缓慢，下月需加快材料进场和施工的进度，确保工程早日实现全容量并网。

2、工程质量控制方面的工作情况

本月施工质量情况较好，但仍存在以下质量问题：

欧波厂区光伏车棚基础浇筑前检查时，发现个别钢筋笼安装深度不符合设计图纸要求等

问题，监理项目部已要求施工单位限期整改完成，自检合格后报监理项目部复查。整改完成后经复查符合要求。

3、安全生产管理方面的工作情况

本月施工安全情况较好，但仍存在以下安全问题：

检查发现车棚施工现场个别施工人员安全帽佩戴不规范等问题，已要求施工单位立即整改，消除安全隐患，自检合格后报监理项目部复查。整改完成后经复查符合要求。

监理项目部采取巡视、平行检验、旁站等多种方式，加强了过程控制，发现问题立即处理并及时复查整改情况，直到符合要求为止。

4、工程计量与工程款支付方面的工作情况

无

5、合同及其他方面的管理工作情况

- 1) 继续协调好参建单位间的关系，及时解决工程建设过程中存在的问题。
- 2) 对业主单位所提的要求，及时传达到施工单位。

三、工程存在问题及建议

- 1、施工单位要加快材料进场和施工的进度，确保工程早日实现全容量并网。
- 2、施工单位要加强安全管理的力度，确保施工人员的安全。
- 3、施工单位要加强质量的管理，确保工程质量合格。

四、下月监理工作安排


1、在工程管理方面的工作安排

加强现场的巡视检查力度，在工程进度、质量、安全和协调等方面加大管理力度，把控好进场材料和施工的质量关，把控好人员、设备的安全关，发现问题及时处理，做好施工安全、质量、进度等方面的管理工作，加强协调与沟通，确保各项工作安全、保质保量的早日完成。


2、在项目监理机构内部管理方面的工作安排

加强项目监理机构内部各项工作的管理，圆满完成本工程的监理任务。

五、工程影像资料

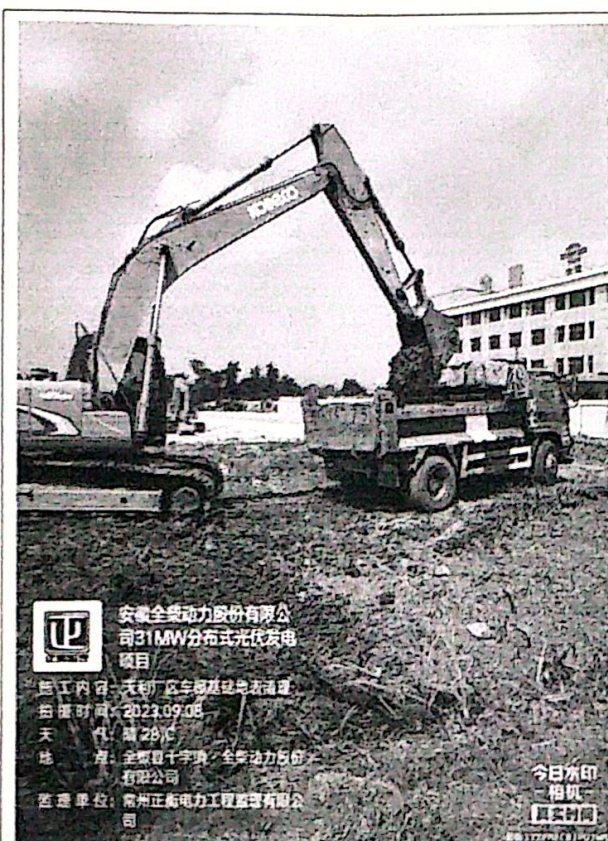


天利厂区车棚基础地表清理

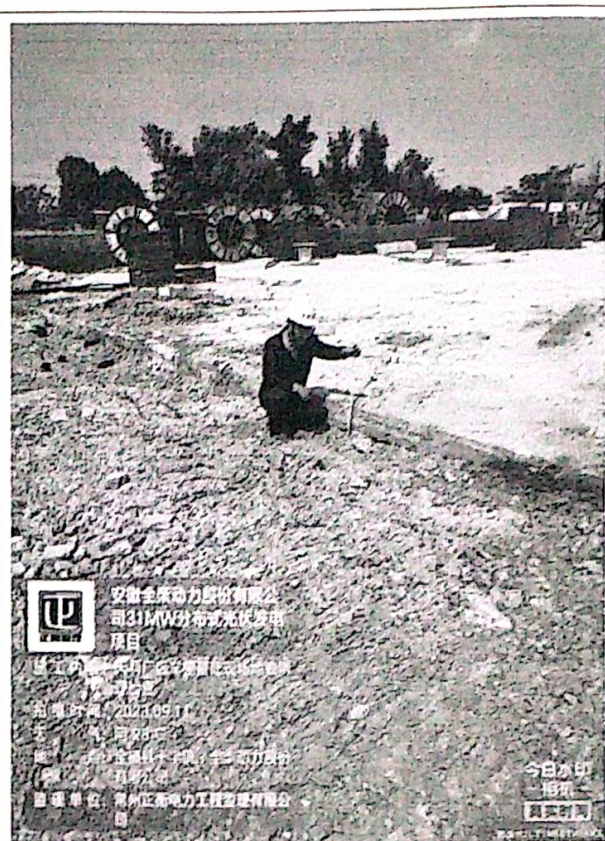

天利厂区车棚基础地表清理检查




天利厂区车棚基础基坑清理

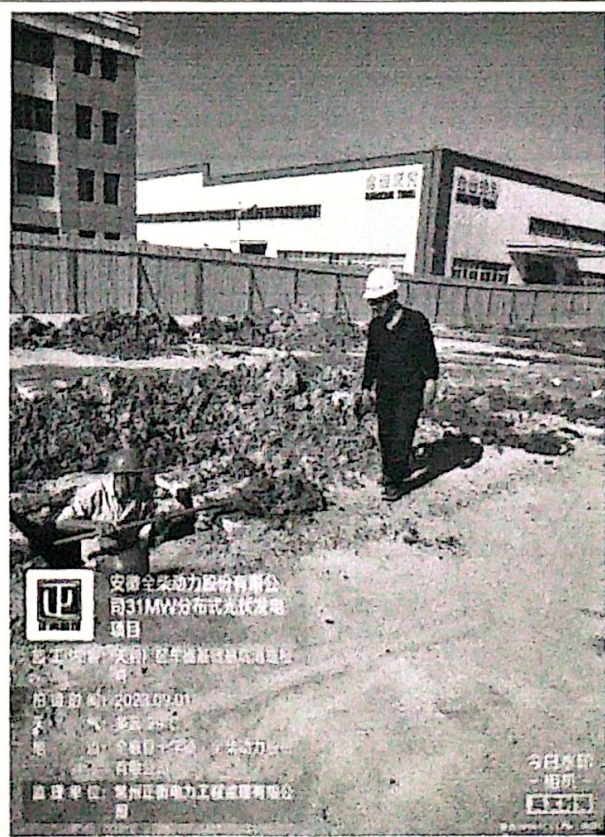

天利厂区车棚基础基坑清理检查




欧波厂区车棚施工现场土方倒运

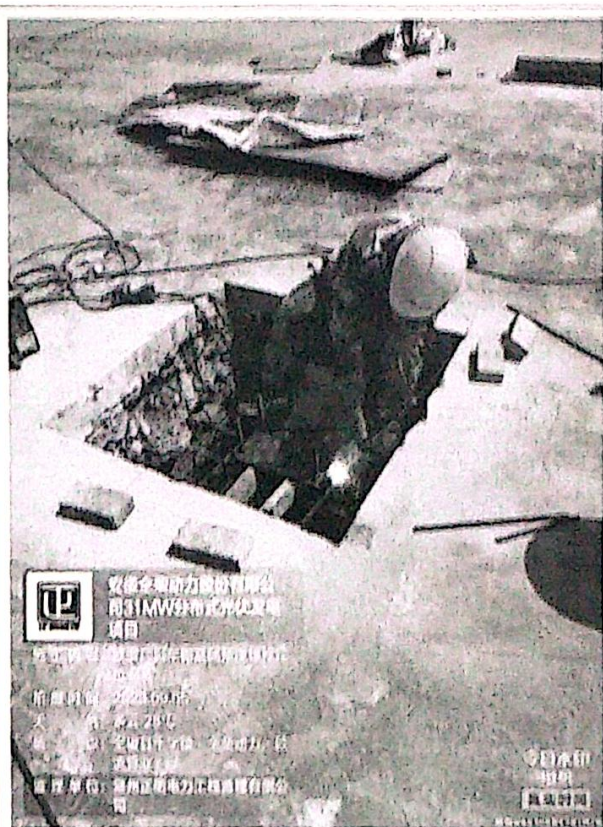


欧波厂区车棚基础预埋螺栓定位安装



欧波厂区车棚基础钢筋检查

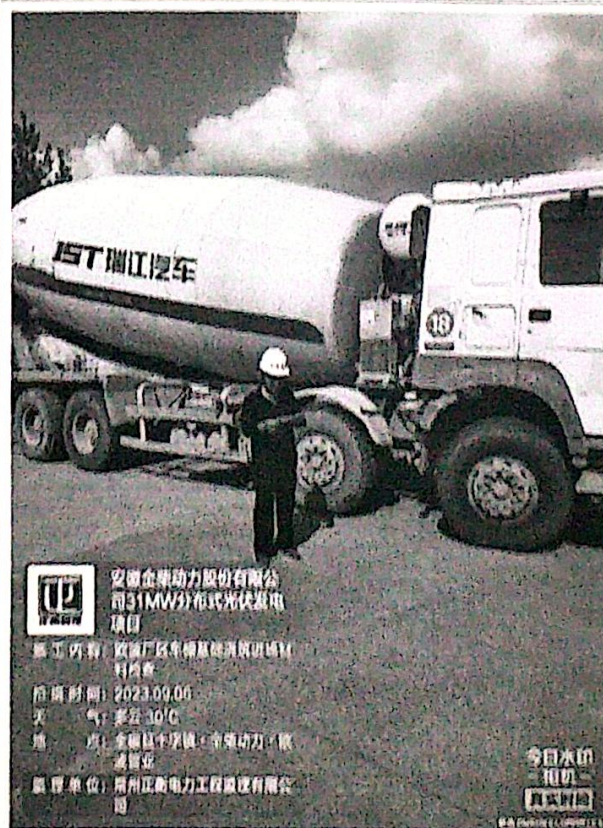

欧波厂区车棚基础浇筑进场材料检查

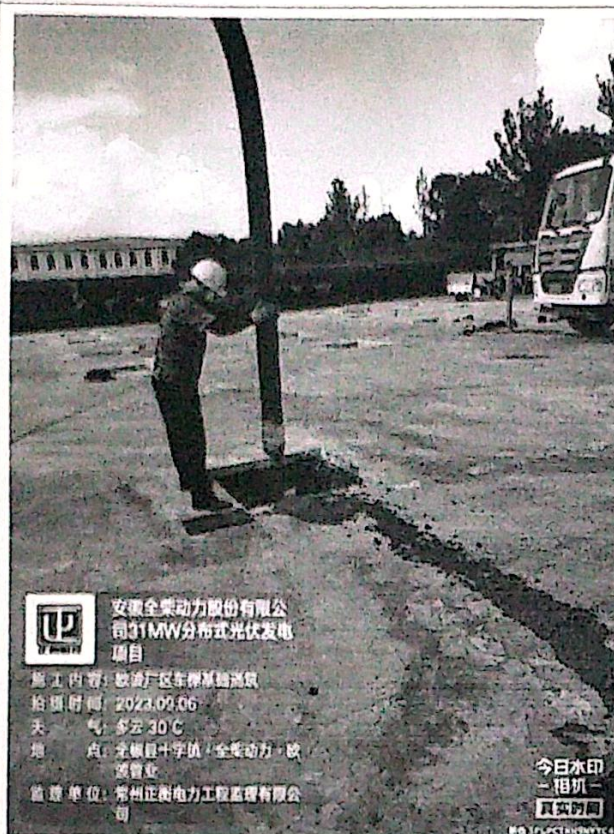


欧波厂区车棚基础浇筑



欧波厂区车棚基础浇筑混凝土见证取样



欧波厂区车棚基础浇筑旁站

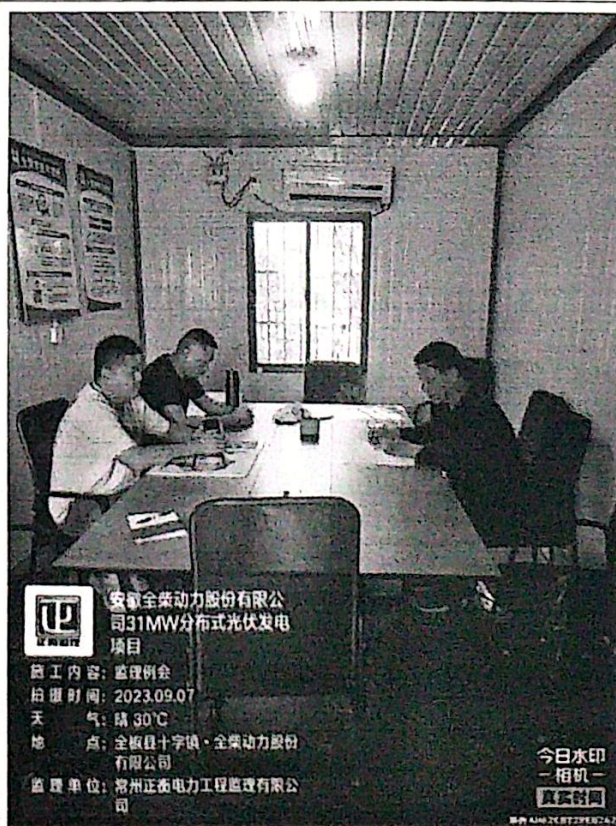

监理例会
