



正衡监理 常州正衡电力工程监理有限公司

监 理 月 报

工程名称： 樱花卫厨（中国）股份有限公司1.49MW分布式光伏发电项目

2022 年 11 月 第 1 期

（2022 年11月 1 日 至 2022年11月 30 日）

项目监理部（章）：

总监理工程师：王立杰

报告日期：2022 年 11 月 30 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司



监 理 月 报

一、安全情况:

1、开工工期18天；安全生产18天。本月项目施工安全生产情况总体平稳，未发生异常不安全事件。

2、监督施工单位对进场施工人员每日班前安全教育会，并对施工单位进行安全交底并签字确认。

3、施工临时用电配电箱进行[三级制]增配新配电箱，定期检查箱内电器开关件的安全有效性。

4、对现场施工工人进行专项检查，发现的超龄人员予以清退，不得入场作业。

5、对施工区高空作业周边主要进出路口安装安全标识标牌。要求施工吊装区域设置警示牌、警戒线、有专职吊装指挥人员、做到安全有序。

6、施工区域内杂物、纸箱、托盘进行有须的堆放，保持周边道路卫生、清理施工现场保持完工脚下清。

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	划文件（份）	人数	分包队	分包队	系统外	系统外
伤	备	故			伍数量	伍人数	包队伍	队伍人
							数量	数
无	无	无		4 人	/	/	/	/

二、本月进度情况:

(1) 昆山旭发电子有限公司1.49MW屋顶分布式光伏发电项目。

序号	工作名称	开始时间	完成时间	备注
	项目启动开工	2022年11月10日	2022年11月10日	
	电缆沟施工	2022年11月23日		已完成45%
	支架安装			
	组件安装			
	桥架安装			
	光伏线敷设			



	交流电缆敷设			
	防雷接地敷设			
	逆变器安装			
	并网柜安装			
	调试及并网验收			

三、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	施工进场准备、图纸会审、电缆沟开挖	夹具及夹具安装、电缆埋管、组件安装、电缆敷设、生产调试、并网。
安全管理	对工人进场三级教育安全培训考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	对新进场人员进行安全教育培训，现场安全围栏等防护措施到位，做好现场安全管理工作。对发现的安全问题整改到位。
质量管理	检查落实电缆沟开挖宽度及深度，电缆沟底平整到位情况。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及规范要求进行施工。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	对现场安装技术进行技术支持和自检，与设计及规范要求对应
造价管理	无	无
物资供应	无	落实现场来料检验。

四、施工质量问题情况：

1. 暂无。



五、其他事宜:


现疫情高爆发期间,要求各参建单位做好疫情防控措施,平时戴口罩、测量温度,中、高风险区域来人禁止进入施工现场。

六、工程形象进度照片

项目航拍图	项目开工仪式
	
每日早班会交底	电缆沟开挖
	
电缆保护管到货	材料堆放区
	
组件技术偏差分析	图纸会审



夹具到货检

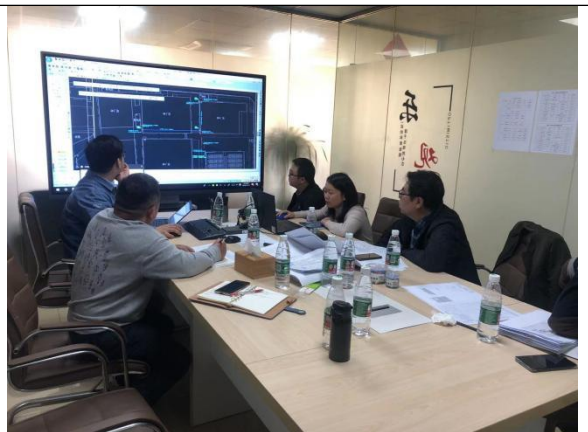

导轨到货检



电缆沟开挖检查



现场临边安全防护



现场施工看板



电缆沟路面切割





彩钢瓦夹具拉拔试验



安全帽检查



现场文明施工



与厂方共同检查登高作业安全



监理例会



吊装作业证检查



常州正衡电力工程监理有限公司

樱花卫厨（中国）有限公司1.49MW屋顶分布式光伏发电项目

监理项目部

2022年12月30日
