



正衡监理 常州正衡电力工程监理有限公司

监 理 月 报

工程名称： 昆山旭发电子有限公司1.49MW屋顶分布式光伏发电项目

2022 年 11 月 第 1 期

(2022 年12月 1 日 至 2022年12月 31 日)

项目监理部（章）：

总监理工程师：王立杰

报告日期：2022 年 11 月 30 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司



监 理 月 报

一、安全情况:

1. 开工工期18天; 安全生产18天。本月项目施工安全生产情况总体平稳, 未发生异常不安全事件。

2. 监督施工单位对进场施工人员每日班前安全教育会, 并对施工单位进行安全交底并签字确认。

3. 施工临时用电配电箱进行[三级制]增配新配电箱, 定期检查箱内电器开关件的安全有效性。

4. 对现场施工工人进行专项检查, 发现的超龄人员予以清退, 不得入场作业。

5. 对施工区高空作业周边主要进出路口安装安全标识标牌。要求施工吊装区域设置警示牌、警戒线、有专职吊装指挥人员、做到安全有序。

6. 施工区域内杂物、纸箱、托盘进行有须的堆放, 保持周边道路卫生、清理施工现场保持完工脚下清。

7. 组织安全教育学习, 对现场所有施工人员进行集中安全教育, 学习公司相关安全制度、相关文件, 事故案例等知识。

8. 吊装作业手续齐全、特种作业人员证件齐全有效

事故(起)			编制安全策划文件(份)	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无		11人	/	/	/	/

二、本月进度情况:

(1) 昆山旭发电子有限公司1.49MW屋顶分布式光伏发电项目。

序号	工作名称	开始时间	完成时间	备注
	项目启动会	2022年11月10日	2022年11月10日	
	电缆沟开挖	2022年11月26日		完成75%
	水泥支墩浇注(2620个)	2022年11月27日		完成8%



	支架安装			
	组件安装			
	桥架敷设			
	光伏线敷设			
	交流电缆敷设			
	防雷接地敷设			
	逆变器安装			
	并网柜安装			
	调试及并网验收			

三、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	进场准备、电缆沟施工完成新厂房一处，7#厂房水泥支墩220个	水泥支墩浇注完成，支架安装完成、组件安装完成、电缆沟施工完成、桥架安装完成、电缆敷设及制作完成、逆变器及并网柜安装完成，具备送电条件
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。本月安全可控。	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	挡板安装检查，接地施工检查；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及规范要求施工、整改完成。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	落实技术管理要求，按技术规范要求施工
造价管理		
物资供应		



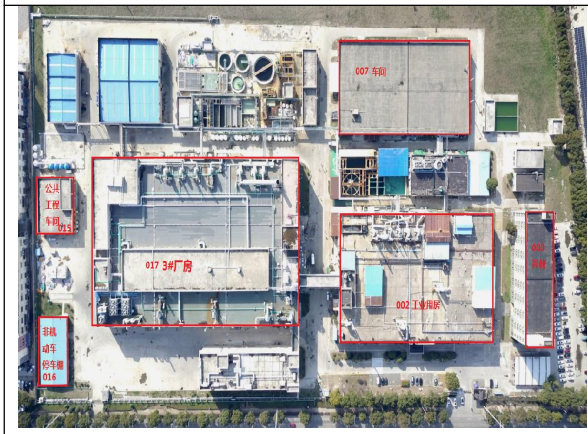
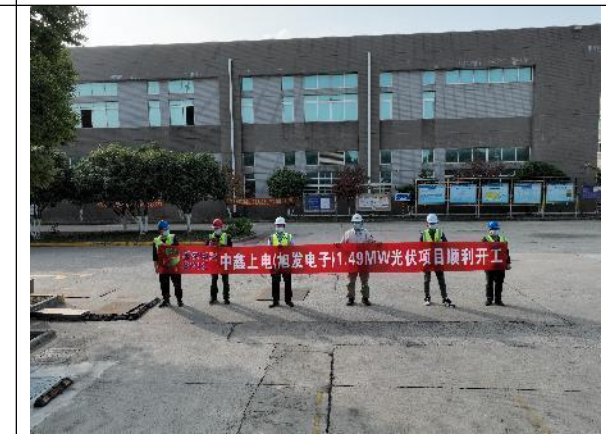
四、施工质量问题情况:

1. 暂无。

五、其他事宜:

现疫情高爆发期间,已通知各参建单位做好疫情防控措施,平时戴口罩、测量温度,中、高风险区域来人禁止进入施工现场。

六、工程形象进度照片

项目航拍图	项目开工仪式
	
图纸会审	项目例会
	
业主单位组件技术会	早班会



安全教育



划线复测



支墩模具检查



特殊作业进场安全培训



进场材料检查



支墩浇注





支墩拆模测量检查



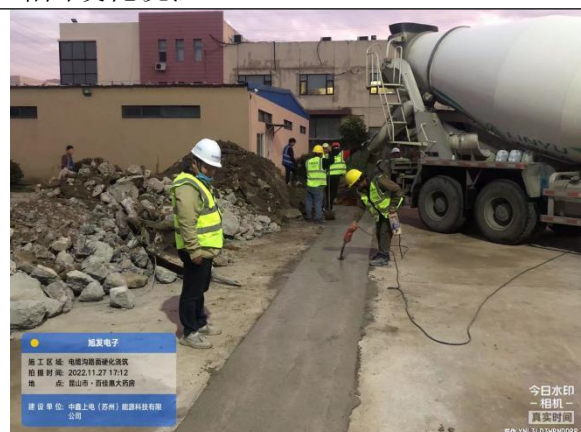
支墩螺栓外露长度检查



路面钢筋网绑扎



路面硬化浇注



直流电缆到货

支墩拆模



常州正衡电力工程监理有限公司



常州正衡电力工程监理有限公司

昆山旭发电子有限公司1.49MW屋顶分布式光伏发电项目监理项目部

2022年 11月 30日
