

监 理 月 报

工程名称：廊坊和平铝业分布式光伏发电项目

2023年01月

项目监理部（章）：

总监理工程师：王海东

报告日期：2023年01月14日



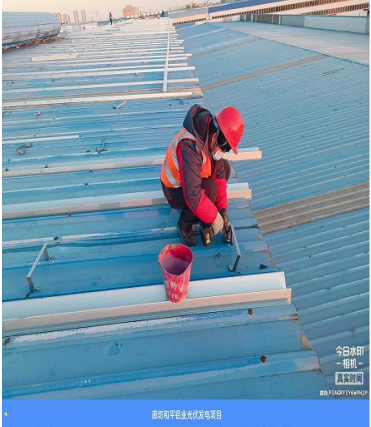
监 理 月 报

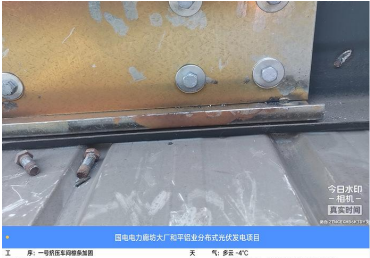
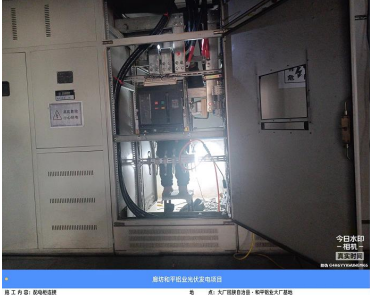
工程名称： 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 月次 第 1 次

月报开始时间 2022 年 12 月 16 日结束日期 2023 年 01 月 15 日

监理单位： 江苏泽翊工程管理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	廊坊和平铝业分布式光伏发电项目		照片	16	进度、质量、安全

	 国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 施工内容: 铺设支架 拍摄时间: 2022.12.26 16:41 天气: 晴 2℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂厂区  国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 施工内容: 铺设支架 拍摄时间: 2022.12.27 15:14 天气: 晴 2℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂厂区  国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 施工内容: 铺设支架 拍摄时间: 2022.12.27 14:45 天气: 晴 2℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂厂区  国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 施工内容: 铺设支架 拍摄时间: 2022.12.29 13:46 天气: 晴 2℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂厂区  国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 施工内容: 三相总柜柜体内部电气改造 拍摄时间: 2022.01.09 15:58 天气: 晴 5℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂厂区	 国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 施工内容: 铺设支架 拍摄时间: 2022.12.20 10:42 天气: 多云 4℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂厂区  国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 施工内容: 建设支架预埋 拍摄时间: 2022.12.21 10:06 天气: 多云 -3℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂厂区  国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 施工内容: 柜体安装 拍摄时间: 2022.01.03 13:21 天气: 晴 5℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂厂区  国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 施工内容: 进一号并柜体柜体安装 拍摄时间: 2022.12.23 14:53 天气: 晴 -1℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂厂区  国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 施工内容: 柜体安装 拍摄时间: 2022.01.03 06:57 天气: 晴 5℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂厂区		
--	---	--	--	--

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
	设备交付进度	厂房加固支架安装组件安装逆变器安装并网柜安装交流电缆放线	支架安装组件安装直流施工并网
	质量体系运作情况	质量体系一般，问题整改落实到位质量保证体系，运行情况进行检查。	继续加强检查，发现问题即时督促整改。
	施工图会审	/	/
	方案审查	/	督促施工单位报施工资料
	技术交底	支架基础施工交底	设备安装及电缆敷设交底
	设计变更	/	/
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	组织新进场员工安全培训
	安全交底情况	临时用电、工器具等安全文明施工进行监督检查。	对设备安装、组件安装登高作业等安全文明施工进行监督检查。
	安全措施落实情况	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。
	安全文明施工情况	巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿、手臂现象。	继续加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	检查支架安装、组件安装，串线及接地等施工质量。	对现场施工质量等要求进行管理，发现问题要求及时通知整改
	主要原材料质量	支架、组件进场开箱检查	电缆、桥架、逆变器、并网柜开箱检查
	构（配）件质量	已检查	继续检查
	设备质量	基本符合要求	对设备进行检查

	质量验评情况	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
--	--------	------------------------------	---------------------

三、本月进度情况

- 1、支架安装完成总量 15%
- 2、组件安装完成 12%
- 3、组件接地扁铁施工完成 0%
- 4、桥架安装 0%
- 6、交流电缆放线完成 100%
- 7、逆变器安装 100%
- 8、并网柜安装 100%

四、下月进度计划

- 1、直流线敷设，支架安装，组件安装，桥架安装，并网

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械设 备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队 伍人数
无	无	无		15 人	1	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管 理	厂房加固施工质量检查，支架安装 组件安装检查，逆变器安装，并网	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，提高

	柜安装检查	施工质量及进度。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	监督施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	原材料的进场检查；检查施工质量；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	已完成项的消缺整改。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	对已交底工序施工质量复查。
造价管理	/	对施工单位申请的工程款及时进行评审
物资供应	督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	支架及组件到货其他材料未到货。

江苏泽翊工程管理有限公司

廊坊和平铝业分布式光伏发电项目

2023 年 01 月 15 日
