

天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目工程月报表

第4期

(2023 年 01月 01日 至 2023 年 01 月 12 日)

本月报内容提要:

- 一. 本月主要工程进展情况概述
- 二. 本月进度、质量、安全执行情况简报
- 三. 本月进度比对及分析
- 四. 主要协调问题及解决情况
- 五. 下月计划主要工作内容
- 六. 现场工程照片

建设单位: 广州市天润沐阳新能源有限公司

施工单位: 福建永福电力设计股份有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位: 九州能源有限公司

日期: 2023 年 01 月 12日

天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

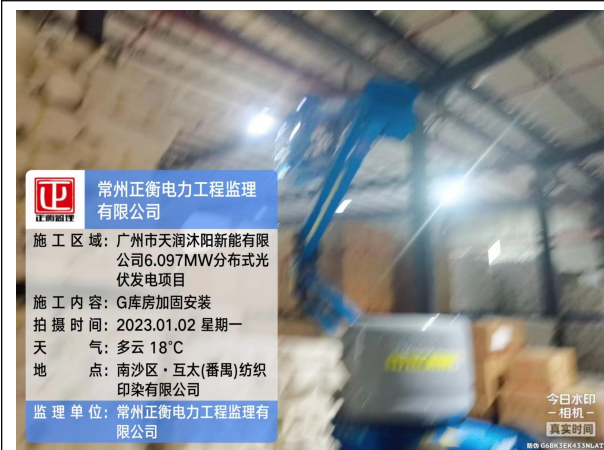
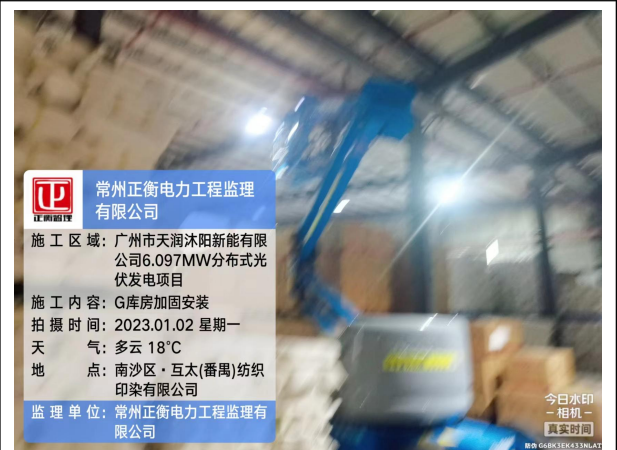
监理单位月报 2023 年 4 期

项目：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目			填报周期：2023 年 01 月 01 日—01 月 12 日	
一、项目总体建设进度汇总： 仓库加固共 860 组，完成 100% ， 支架安装完成 70%。组件安装完成 17.8%。				
二、本月工程建设工作内容及完成情况				
1、支架及组件安装		支架完成 70%； 组件完成 17.8% 水泥基础完成 0%		
2、逆变器及并网柜		并网柜 0%；逆变器 0%。		
3、现场调试		完成 0%。		
4、桥架、接地		桥架 0%；接地 0%；		
5、电缆敷设接线		完成 0%		
6、出图情况		部分图纸。		
7、加固安装		加固完成100。		
8、箱变基础		完成0%		
9、污水池		完成0%		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本月到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	导轨	4 月 23 日	月 日	到货 100%
	直流电缆	月 日	月 日	到货 3 万米
	电缆桥架	月 日	月 日	桥架到货 0%
	加固材料			仓库加固件到货 100%
	并网柜	月 日	月 日	到货 0%

	组件	月 日	12月30日	到货17箱每箱36块共612块累计到货2472块。工程总量的26%
	逆变器	月 日	月 日	到货0%
	电缆设备	3月22日	月 日	到货50%
11、人员/机械情况	施工人数5人，曲臂升降机2台。			
三、截止本月工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首套组件安装	月 日	5月10日	月 日	
2、全容量并网	月 日	月 日	月 日	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下月计划主要工作内容				
1、安装组件	安装完成0%			
2、安装桥架	安装完成0%			
3、检修通道安装	安装完成0%			
4、安装逆变器	安装完成0%			
5、敷设线缆	安装完成0%			
6、安装并网柜	安装完成0%			
7、全容量并网	安装完成0%			

填报人：周飞 审核人：周飞 时间：2023年01月12日

六、工程现场照片

 常州正衡电力工程监理有限公司 施工区域: 广州市天润沐阳新能源有限公司6.097MW分布式光伏发电项目 施工内容: G库房加固安装 拍摄时间: 2023.01.02 星期一 天气: 多云 18°C 地点: 南沙区·互太(番禺)纺织印染有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	 常州正衡电力工程监理有限公司 施工区域: 广州市天润沐阳新能源有限公司6.097MW分布式光伏发电项目 施工内容: G库房加固安装 拍摄时间: 2023.01.02 星期一 天气: 多云 18°C 地点: 南沙区·互太(番禺)纺织印染有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
G 仓库加固安装 2023.01.02	G 仓库加固安装 2023.01.02
 常州正衡电力工程监理有限公司 施工区域: 广州市天润沐阳新能源有限公司6.097MW分布式光伏发电项目 施工内容: 厂房加固连接件喷防腐漆 拍摄时间: 2023.01.03 星期二 天气: 多云 17°C 地点: 南沙区·互太(番禺)纺织印染有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	
G 仓库加固安装 2023.01.03	G 仓库加固安装 2023.01.03
 常州正衡电力工程监理有限公司 施工区域: 广州市天润沐阳新能源有限公司6.097MW分布式光伏发电项目 施工内容: E库房加固安装 拍摄时间: 2023.01.04 星期三 天气: 地点: 我在这 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	 常州正衡电力工程监理有限公司 施工区域: 广州市天润沐阳新能源有限公司6.097MW分布式光伏发电项目 施工内容: E库房加固安装 拍摄时间: 2023.01.05 星期四 天气: 晴 21°C 地点: 南沙区·互太(番禺)纺织印染有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
E 仓库加固安装 2023.01.04	E 仓库加固安装 2023.01.05

	 常州正衡电力工程监理有限公司 施工区域: 广州市天润沐阳新能源有限公司6.097MW分布式光伏发电项目 施工内容: 制作组车间加固安装 拍摄时间: 2023.01.07 星期六 天气: 地点: 我在这里 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
E 仓库加固安装 2023.01.06	制作组车间加固安装 2023.01.07
 常州正衡电力工程监理有限公司 施工区域: 广州市天润沐阳新能源有限公司6.097MW分布式光伏发电项目 施工内容: 制作组车间加固安装 拍摄时间: 2023.01.07 星期六 天气: 地点: 我在这里 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	 常州正衡电力工程监理有限公司 施工区域: 广州市天润沐阳新能源有限公司6.097MW分布式光伏发电项目 施工内容: 打扫卫生 拍摄时间: 2023.01.08 星期日 天气: 小雨 20°C 地点: 南沙区·互太(番禺)纺织印染有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
制作组车间加固安装 2023.01.07	制作组车间加固安装 2023.01.08
