

监 理 月 报

工程名称: 南京顺欣制药 0.8MW 光伏发电项目

2022 年 08 月 第 2 期

监理项目部 (章):



总监理工程师:

丁三杰

报告日期: 2022 年 08 月 31 日




监理月报

一、本月工程实施情况（形象进度表、照片）

1、形象进度表

序号	工作名称	开始时间	完成时间	备注
01	项目启动会	2022年07月14日	2022年07月14日	
02	屋面基础支墩就位	2022年08月02日	2022年08月18日	
03	屋面支架安装	2022年08月15日		
04	组件安装	2022年08月23日		
05	桥架安装	2022年08月27日		
06	直流电缆	2022年8月30日		
07	交流电缆	2022年8月31日		
08	防雷接地安装			
09	接线调试			
10	逆变器安装		/	
11	配电房设备安装		/	
12	调试及并网验收		/	

2、现场进度形象照片

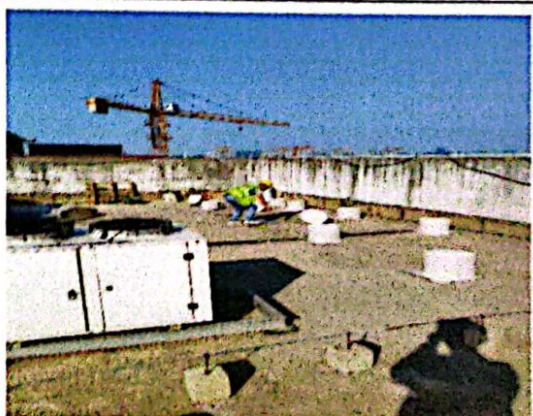	
7#生活楼支墩就位	9#厂房支墩就位






12#厂房支墩就位



7#生活楼安装组件



9#厂房安装组件

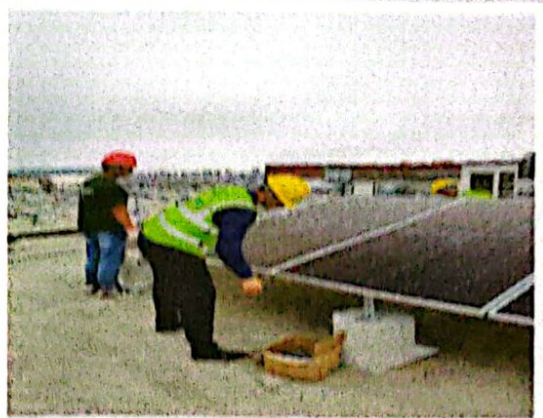

12#厂房安装组件

二、本月监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

- 1、检查现场施工质量情况，对原材料进场进行到货检。
- 2、现场安全旁站支架、组件等材料、设备的吊装。
- 3、检查现场安全文明情况。

三、工程存在问题及建议

现场发现部分安装支架、组件有遮挡现象及其它质量问题，要求总包整改并下发通知单。

四、下月监理工作重点

- 1、组件安装工程施工质量及电缆敷设、设备安装等工程施工质量。
- 2、现场安全文明施工。



3、并网验收相关工作。

4、资料整理及归档。

常州正衡电力工程监理有限公司
南京顺欣制药 0.8MW 光伏发电项目
2022 年 08 月 31 日

