

编号：ZHJL-TJYPGF-JLYB-001

监 理 月 报

工程名称：天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

2022 年 11 月 第 4 期



报告日期：2022 年 11 月 28 日

监 理 月 报

- 1 本月工程实施情况**
- 2 本月监理工作情况**
 - 2.1 工程进度控制方面的工作情况
 - 2.2 工程质量控制方面的工作情况
 - 2.3 安全生产管理方面的工作情况
 - 2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况
 - 2.5 合同其他事项的管理工作情况
- 3 工程存在问题及建议**
- 4 下月监理工作重点**
 - 4.1 在工程管理方面的监理工作重点
 - 4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

1 本月工程实施情况

相关情况登记			
本月日历天	30 天	实际工作日	18 天
建设单位通知单	0 份	工程暂停令	0 份
监理通知单	0 份	监理备忘录	0 份
例会会议纪要	0 份	专题会议纪要	0 份
月报时限	2022 年 10 月 28 日--2022 年 11 月 28 日		
本月工程现场大事记			
工程概况：本工程为天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目施工，天津耀皮玻璃有限公司太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施、运维设施的方案设计、安装和并网调试等。			
本工程于 2022 年 07 月 20 日正式开工。			

2 本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	20122 年 07 月 20 日	工程竣工日期	
本月计划完成至	2022. 11. 28-2022. 11. 30		

本月实际完成至	2022. 10. 28-2022. 11. 30		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）		0 份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
1、海美丽仓库屋铝合金导轨底座摆放安装 1000 个； 2、二线原料电气室至二线转运楼龙门架上焊接电缆桥架支架，焊接 6 个；			
下月工程进度展望			
1、海美丽仓库屋铝合金导轨、组件、逆变器、汇流箱安装完成； 2、电缆桥架、低压电缆敷设完成； 3、并网柜安装完成、设备调试及验收、并网；			

2.2 工程质量控制方面的工作情况

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	4 次	试 验 结 果 不 合 格 次 数	0 次
设 备 开 箱 检 查 次 数	0 次	检 查 不 符 合 要 求 次 数	0 次
本 月 查 验 分 项 工 程	1 项	其中几次验收合格	10 次
发出监理通知单（质量控制类）	0 份		
工程质量情况简析（文字或图表）			
1. 施工质量基本符合要求。			

下月质量情况预计和目标
1. 光伏施工开始后每天坚持 2 次巡视现场，发现问题现场指出，要求立即处理，当场整改。 2. 严格把控现场施工质量过关，对于不符合规范要求的及时提出并落实整改。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	2 次
发出监理通知单（安全类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
1. 检查防疫工作，防疫措施、安全帽佩戴，安全防护隔离措施落实。 2. 检查临时用电规范化。 3. 检查高空作业人员特种作业证件，安全带合格证是否有效。 4. 检查起重吊装过程中的安全措施是否到位。	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	

- 1、加强对施工单位的防疫工作，防疫措施、安全教育的监管；
- 2、消除安全隐患，安全工作中麻痹思想；
- 3、加强现场防疫工作，防疫措施及安全检查；

2.4 合同其他事项的管理工作情况

本月工程合同管理及其它事项

- 1、协调业主和施工单位之间的关系。
- 2、对业主所提的各类要求，由我监理方下达施工单位。


3 工程存在问题及建议

3.1 工程存在问题
3.2 建议

4 下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点 1、严控材料进场关，不符合设计及规范要求材料严禁进场； 2、对分部及分项工程、工序等的验收进行把控； 3、对关键工序、特殊作业进行旁站； 4、依据合同对施工单位进行管理；
4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点 1、组织相关人员学习专业知识； 2、对图纸及规范仔细认真研读，领会设计意图； 3、加强内部管理，做好资料的整理工作；

5 相关照片

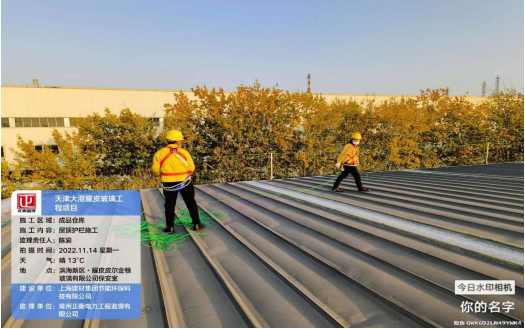
	
海美丽屋围栏安装	导轨、夹具到货



电缆桥架到货



海美丽屋加装防护网

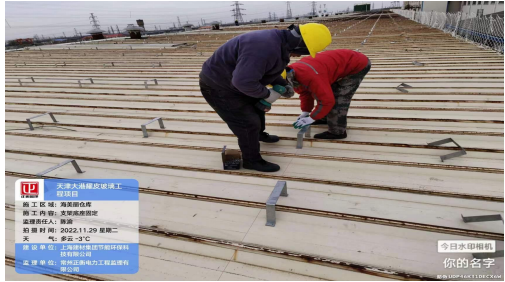

海美丽屋顶导轨底座安装



电缆桥架支架焊接
