

安庆泰亚鞋业有限公司 5.65MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 周 报

(12 月 第 4 周 共累计 12 周)

编 制 时 间：2022.12.25.

监理单位编制人：刘德文

监理单位审核人：赵旭超

常州正衡电力工程监理有限公司

安庆泰亚鞋业有限公司 5.65MW 屋顶分布式光伏

发电项目监理部

项目名称：安庆泰亚鞋业有限公司 5.65MW 屋顶分布式光伏发电项目

建设单位：安庆浙泰新能源有限公司

施工单位：湖州强力电力科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位：杭州鸿晟电力设计咨询有限公司

一、工程概况：本项目为屋顶分布式光伏发电项目，拟利用安庆泰亚鞋业有限公司屋顶面积 48000 平方米建设太阳能光伏发电，采用 545W 单晶硅光伏组件 10368 块，每 18 块组件串联后接入 29 台 125KW 和 25 台 50KW 并网逆变器，逆变器输出交流电接入升压变 500v 母线，经 2 台 2500KVA 变压器升压至 10KV 系统，接入场区配电房 10KV 母线，实现并网。用户侧新增设户外 10KV 预制舱 1 台，高压柜及二次设备安装于预制舱内，本项目装机容量为 5.65MW，采用“自发自用，余电上网”的方式并网。

二、施工概述：本周主要施工为 2#屋面组件安装，电缆桥架、运维通道、环网接地、逆变器接线，电缆敷设、电缆头制作；箱变、预制舱基础粉刷、四周硬化施工。

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基础、电缆沟等）

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量（%）
1		箱变、预制舱基础开挖		5%	100%
2		箱变、预制舱、电缆井砌筑		20%	100%
3					

4					
5					

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、架空线路及电缆、其他电气安装等）

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量（%）
1		夹具、支架安装	2#屋面支架安装完成	2#屋面支架安 100%	100%
2		组件安装		2#屋面组件安装 20%	100%
3		逆变器安装		2#屋面安装 100%	100%
4		电缆敷设	2#屋面电缆敷设	2#屋面电缆敷设完成 90%	95%
5		变压器、预制舱安装调试			
6		一二次设备安装调试			

3、进度情况分析：

四、进场材料、构配件、设备一览表

序号	（进场材料、构配件、设备）名称	进场时间 （年月日）	进场数量 （单位）	拟用部位
1	组件	2022. 11. 02	7200 块	2#、3#、5#、6#屋面
2	支架	2022. 09. 24	5. 69mwp	2#、3#、5#、6#屋面
3	电缆	2022. 10. 17.	1*4=136000 米 3*25=1300 米 3*95=1400 米	2#、3#、5#、6#屋面
4	SVG			
5	二次设备			
6	箱逆变	2022. 09. 24 2022. 10. 19	125KW*29 台 50KW*25 台	2#、3#、5#、6#屋顶
7	高压柜			

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

管理人员：赵旭超、刘德文

2、施工单位：湖州强力电力科技有限公司

(1) 管理人员：黄洪平、周应能

(2) 生产工人：

土建专业：

安装专业：

六、施工质量控制情况

序号	检查验收内容	具体内容	对应形成文件名称
1	材料、构配件、设备进场验收	1、 组件	开箱检验 2 份
		2、逆变器	开箱检验 2 份
		3、	
		4、	
		5、	
2	监理旁站项目	1、安全旁站	安全旁站记录 3 份
		2、质量旁站	质量旁站记录 3 份
		3、	
		4、	
		5	
3	施工质量检查记录	1、夹具、支架安装	质量检查记录 2 份
		2、桥架安装	质量检查记录 2 份
		3、环网接地安装	质量检查记录 2 份
		4、逆变器安装	质量检查记录 2 份
		5、组件安装	质量检查记录 3 份
4	隐蔽工程质量验收	1、	夹具、支架抽检记录 1 份
		2、	直流电缆敷设质量检查 2 份
		3、	交流电缆敷设质量检查 1 份
		4、	电缆头制作质量旁站 1 份
		5	
5	分部分项工程验收	1、	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	

七、施工质量问题

(一) 上周质量问题的整改情况(完成时间、达到的合格标准)。

1、安装工程质量问题：上周质量问题已整改。

2、其他质量问题：

(二) 本周检查的质量问题(出现部位、原因等)及整改要求(完成时间、达到的合格标准)

1、2#厂房屋面桥架局部空间不符合设计及规范要求，现场要求施工人员进行整改。

八、安全文明施工

1、监督检查现场施工人员佩戴安全帽等安全防护用品；

2、要求施工方对土建现场施工垃圾进行清理；

3、沿墙上下桥架安装人员必须正确佩戴安全防护用品，安全责任到人；

4、不定时检查监督现场施工安全；

九、沟通协调

1、督促施工单位落实现场安全施工管理职责，组织施工人员进行施工安全教育；

2、隐蔽工程要求施工方在隐蔽前 24 小时进行报验，必要时可记录、拍照留存，否则将不认可该段施工量；

3、催促施工方提交施工相关资料；

十、其他事宜(变更、签证等事宜)

1、变更： 无 。

2、工程签证： 无。

3、其他：

十一、天气统计表。

日期 天气	周五	周六	周日	周一	周二	周三	周四
晴							
雨							
阴							
雾							

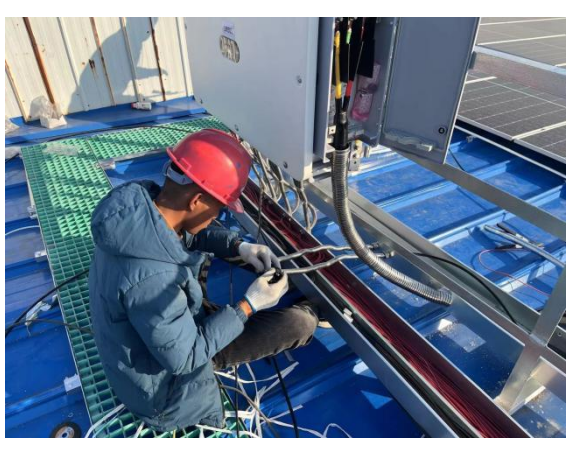
十二、监理工作统计表：

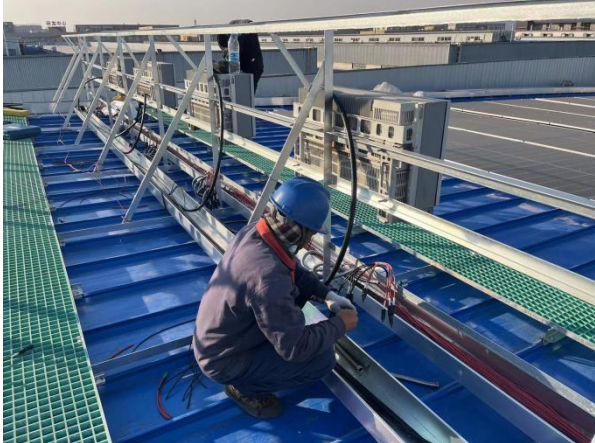
序号	工作项名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议			8	
2	审批施工组织设计（方案）			1	
3	审核施工图纸			1	
4	发出监理通知联系单			4	
5	审批分包单位				
6	原材料审批				
7	构配件审批				
8	设备审批				
9	分项（检验批）工程质量验收			3	
10	分部（子分部）工程质量验收				
11	不合格项验收				
12	监理抽查复试				
13	监理见证取样				
14	清退不合格建筑材料、构配件、设备				
15					

十三、本周监理工作小结：本周对现场 2#屋面组件安装质量旁站，电缆桥架安装、电缆敷设、运维通道、逆变器、环网接地、组件等安装进行全面检查；2#、3#厂房交流电缆展放、箱变、预制舱基础粉刷等监督检查。

附：项目监理周报影像资料

一、形象进度影像

文字描述	2#屋面组件安装	2#屋面组件安装
图片		
文字描述	2#屋面接地安装	2#屋面电缆展放
图片		
文字描述	2#屋面电缆头制作	2#屋面电缆头制作
图片		
文字描述	直流电缆敷设	直流电缆敷设完成

图片		
文字描述	箱变基础粉刷	基础四周硬化
图片		
