



正衡监理

编号：AQTY-JLYB-03

监 理 月 报

安庆泰亚鞋业有限公司 5.65MW 屋顶分布式光伏发电项目

2022年 12月第 03期

总监理工程师：赵旭超

报告日期：2022 年 12 月 31 日

监 理 月 报

工程名称：安庆泰亚鞋业有限公司 5.65MW 屋顶分布式光伏发电项目

月报开始时间 2022 年 12 月 01 日 结束日期 2022 年 12 月 31 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	安庆泰亚鞋业有限公司 5.65MW 屋顶分布式光伏发电项目		影像	12	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	1、2#屋面组件吊装 	本月完成 1、2#、3#屋面：支架、桥架、环网接地、检修通道、直流电缆敷设、逆变器、组件安装完成 100%； 2、5#、6#屋面：直流电缆敷设、组件、逆变器安装完成 100%；	下月完成 1、2#、3#、5#、6#屋面交、直流电缆敷设，电缆头制作；
	2、3#屋面组件吊装 	3、交流电缆展放完成 70%； 4、箱变、预制舱基础施工完成 100%； 5、箱变就位完成。	2、交流电缆敷设、电缆头制作； 3、箱变、预制舱接线、调试及并网； 4、提交完整的施工归档资料。’


3、组件二次搬运




4、组件安装



5、交流电缆敷设

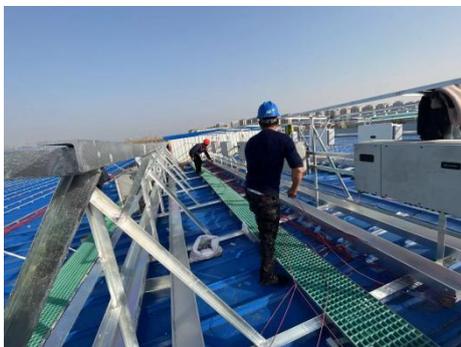

6、逆变器接线、检测施工

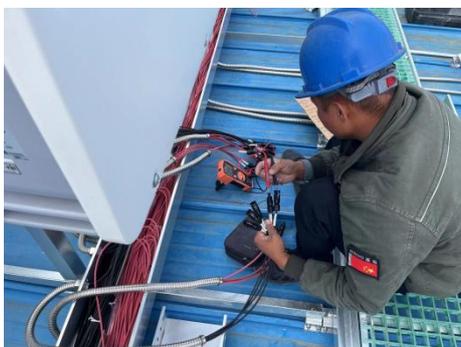

7、交流电缆敷设



8、箱变基础砌砖



9、箱变基础立模、钢筋绑扎



10 箱变、预制舱基础粉刷



11、逆变器安装完成

		
<p>12、设备耐压试验</p>		
		
<p>设备交付进度</p>	<p>箱式变压器全部到货</p>	<p>安装、调试</p>
<p>设计交付进度</p>	<p>图纸完成</p>	
<p>质量体系运作情况</p>	<p>质量体系健全，运行良好 落实质量保证体系， 并对运行情况进行检查</p>	<p>重点部位旁站</p>
<p>施工图会审</p>	<p>已完成</p>	
<p>设计交底</p>	<p>已完成</p>	
<p>方案审查</p>	<p>已审核</p>	<p>督促施工单位提交完整的归档资料</p>
<p>技术交底</p>	<p>完成</p>	<p>现场技术指导</p>
<p>设计变更</p>	<p>无</p>	
<p>安全</p>	<p>安全培训情况</p>	<p>进场员工已进行安全培训</p>
<p>安全</p>	<p>安全交底情况</p>	<p>督促施工单位对危险作业点每天进行班前交底</p>
<p>安全</p>	<p>安全措施落实情况</p>	<p>已落实，发现问题及时</p>
		<p>定期、不定期检查</p>

		整改。	施工现场安全措施落实、执行情况。
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	良好	跟踪监督
	主要原材料质量	电缆外观质量合格。 支架材料检验合格。	变压器、预制舱等设备开箱检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	
	设备质量	符合国家标准	
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	无	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

本月 2#、3#屋面支组件、桥架、直流电缆敷设、环网接地、运维通道、逆变器安装完成 100%；5#、6#屋面支架、桥架、运维通道、环网接地、直流电缆敷设完成 100%；箱变、预制舱基础完成 100%。

三、 下月进度计划

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	督促施工单位完成工程全部消缺、整改施工；交流电缆敷设、接线、设备检测、调试与并网；提交完整的施工归档资料。

安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	每天班前安全教育，定期、不定期进行现场检查监督。
质量管理	对重点部位重点工序进行旁站并监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	按照规范、合同、施工手册要求严格把控质量关。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	对现场电气重点部位关键工序进行现场指导。
造价管理	无	/
物资供应	无	/

安庆泰亚鞋业有限公司 5.65MW 屋顶分布式光伏发电项目
常州正衡电力工程监理有限公司

2022 年 12 月 31 日
