

监 理 月 报

工程名称：海南联瑞、联生分布式光伏发电项目光伏发电项目

2024 年 01 月

项目监理部（章）：

总监理工程师：王



报告日期：2024 年 01 月 25 日




监 理 月 报

工程名称： 海南联瑞、联生分布式光伏发电项目


月报开始时间： 2024 年 01 月 01 日 结束日期 2024 年 01 月 25 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

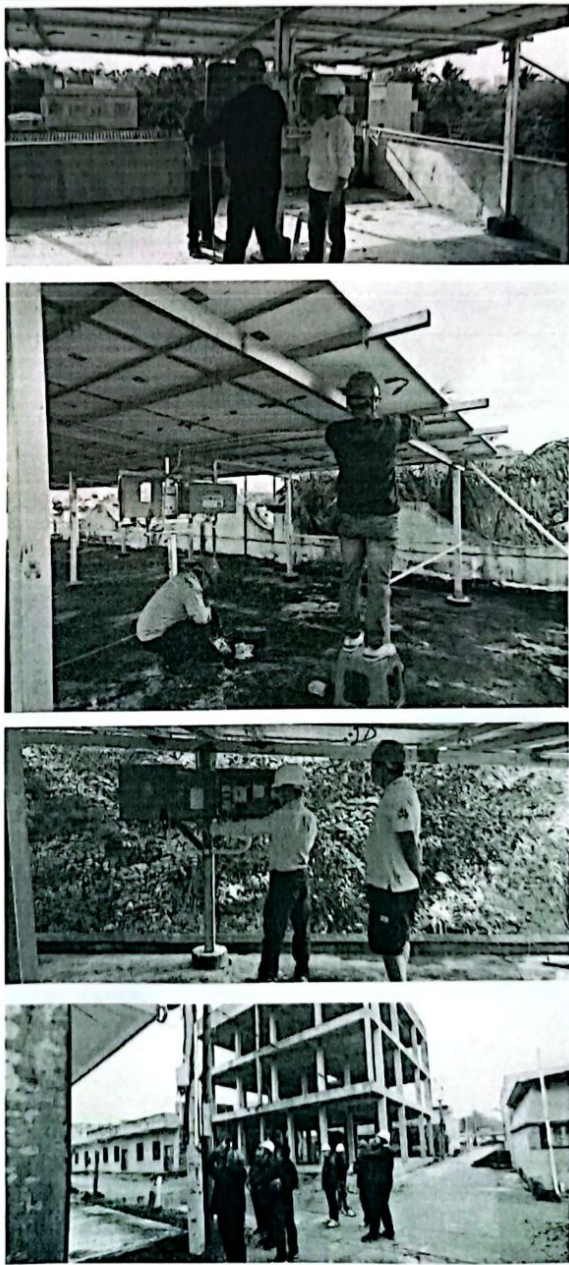序 号	单位工程标准名称	施工项目影像	资料 类型	资料 数量	备 注
1	海南联瑞（联生）分 布式光伏发电项目		照片	8	



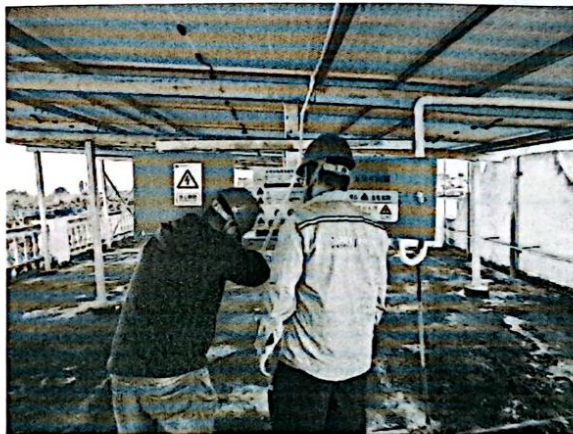

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	1) 支架完成 45 组, 累计完成 1607 组。 2) 组件安装 45 户, 累计完成 94721 块, 容量为 53.21913MWp 3) 逆变器安装 45 台, 累计完成 1607 台。 4) 并网箱安装 45 台, 累计完成 1607 台。	监理本月对以下施工项进行了检查、旁站工作: 1) 本月监理人召开监理例会共 4 次, 专题例会 2 次, 安全月例会 1 次; 2) 开出监理通知单共计 2 份; 3); 对儋州、万宁、海口、澄迈、文昌等地电站进行现场确户; 4) 下发关于并网电站无发电量事宜监理通知单 013; 5) 与业主、总包三方对儋州电站施工前进行现场勘察; 6) 审核总包单位提交的 3.003275MW 安装款付款申请资料; 7) 对海口后台发电量异常电站现场整改情况进行检查; 8) 下发关于并网电站发电量异常且不能正常结算电费的考核单-04; 发电量情况和运行情况; 9) 审批总包方提交的关于春节项目放假暂停施工申请; 10) 会议纪要累计 44 次; 月例会、月安全例会 9 次; 11) 熟悉施工图纸, 完善补充监理资料等。	一、签发关于春节期间暂停施工暂停令, 开工前复工令。监理签发春节期间临时撤场通知单。 二、下月施工计划: 1) 完成施工 35 户, 安装容量完成: 1MWp。 并网计划 1) 计划并网 0.5MWp
	材料/设备交付进度	1) 组件: 累计到货容量为 70.26MWp。 2) 逆变器: 累计到货 2248 台。 3) 并网箱: 累计到货 2229 台。	下月材料到货计划: 组件到货 (0) MW, 逆变器到货 (0) 台。 并网箱到货 (0) 台。
	设计交付进度	电子版图纸完成	要求按现场实际情况出纸质版施工图
	质量体系运作情况	质量体系健全, 运行良好落实质	加强检查, 发现问题即时



		量保证体系，并对运行情况进行检查	督促整改及下联系单、通知单。
	施工图会审	已完成图纸会审	/
	设计交底	设计已交底	对电站变更及以联系单形式签发监理项目部
	方案审查	已基本报审完成	督促施工单位对施工资料与进度同步。
	技术交底	已进行技术交底	对进场人员进行安全技术交底。
	设计变更	暂无变更	如有变更，请签发以变更联系单
安全	安全培训情况	施工人员进行安全培训及安全检查	对安装人员、电气施工人员进行安全技术交底
	安全交底情况	对施工现场安全检查	对施工人员安全交底
	安全措施落实情况	督促安装人员佩戴号安全帽，高空作业人员佩戴安全带，屋面临边安全防护措施。临时用电、消防设施等安全落实情况检查。	认真做好巡视检查，发现安全苗头、隐患及时处理，不留隐患。
	安全文明施工情况	巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、安全带、劳保鞋。加强现场防火消防检查。	加强现场安全文明施工检查力度。
质量	主要工序质量	电站安装质量合格率 80%以上	对各道工序进行检查、验收，对不合格部分责令整改，必要时出整改通知单，整改后报复查。
	主要原材料质量	对进场支架、组件及电气设备抽检，符合设计要求	对进场材料、设备进行开箱抽查。
	设备质量	符合设计要求	对逆变器、并网箱检查，且符合设计及规范要求。
	质量验评情况	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度，责令总包方对不合格问题整改闭环
投资	资金情况	能够按时支付工程进度款	二月份无资金计划
	款项支付情况	对总包单位工程进度预付款申请	二月份无资金支付



合同		进行审核并签字盖章	
	预算外签证	暂无	/
	合同签订情况	工程建设监理合同、EPC 总承包合同已签订	/
	合同执行情况	按合同执行	按合同条约做好合同范围内工作。

三、本月进度情况

主要工序	总工程量	累计完成量	完成率	明细
支架安装	265MW	1607 组	20.08%	联瑞完成 783 户，容量为 25.02376MWp。联生完成 824 户，容量为 28.19537MWp。
组件安装	265MW	94721 块	20.08%	联瑞完成 783 户，容量为 25.02376MWp。联生完成 824 户，容量为 28.19537MWp。
并网箱	265MW	1607 台	20.08%	联瑞：783 台，联生：824 台
逆变器	265MW	1607 台	20.08%	联瑞：783 台，联生：824 台
并网情况	265MW	19.15944MW	7.2%	联瑞已完成并网：400 户，容量为：11.33194MWp 联生已完成并网：265 户，容量为：7.8275MWp

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工人 数	安全分包情况		
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队伍 数量	分包队伍人 数	系统外包队伍数 量
无	无	无	1 份	40 人	10	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度 管理	1、对施工单位提交的 2024 年 1~03 月份进度计划审核 2、督促支架、组件及电气设备安装及并网容量等进度	1、支架及组件及电气设备安装。 2、对具备并网的电站申请并网。 3、对支架组件安装完成的电站进行电气施工。
安全 管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特	1、严格审核进场人员技术、安全交底。 2、督促已并网电站挂安全警示标牌。配置灭火器。 3、加强对电站消防、防火检查。 4、加强支架、组件及电气施工人员，进场作业人员必须佩戴安全帽，超过 2 米



	殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	以上作业必须佩戴安全带、安全帽，屋面临边做好安全防护措施。 5、加强现场临时用电安全。 6、做好春节期间电站值守工作。
质 量 管理	督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的检查计划。	7、组件、支架安装、组件接地、光伏电缆、电气设备等施工质量检查；户用电站工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行检查计划。
技 术 管理	熟悉施工图，针对现场施工必须按设计及相关技术规范要求实施。	督促施工单位对施工人员按施工图进行技术交底，现场检查施工是否按照设计交底及施工图进行作业。
物 资 供应	督促总包单位物资进场，督促施工单位做好物资保管，施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失，并做好现场成品材料的保护。	对进场的支架、组件、设备等进行到货抽检。要求做好成品材料、设备的现场保护工作。

