



编号: ZHJL-YB-2023-03-31

监 理 月 报

工程名称: 分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

2023 年 03 月 第 2 期

监理项目部 (章):

总监理工程师: 王立杰

报 告 日 期: 2023 年 03 月 31 日

监 理 月 报

工程名称：分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

月 次 第 2 次

月报开始时间： 2023 年 03 月 01 日

结束日期： 2023 年 03 月 31 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、监理工作重点

建设单位：分宜晶航新能源有限公司			
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			
施工单位：浙江甬坤能源科技有限公司			
专业	事 项	本 月 重 点 工 作 情 况	下 月 重 点 工 作 计 划
协调	组织. 参加工作	2023年3月12日光伏支架和太阳能组件全部安装完成，防雷接地及低压电气无材料未施工，开关站、设备基础及送出线路开工时间不确定，3月13日开始停工待料，监理人员每天到现场巡视检查，编写平行检查记录4份、监理周报5份、监理月报1份、下发监理工作联系单3份，消缺整改单1份。	监理人员4月6日撤离施工现场
进度	材料/设备交付进度	光伏支架和组件到场 100%。	
	设计交付进度	提供光伏场区电气及结构蓝图5份。	
	质量体系运作情况	无质量管理体系，现场以包代管。	
	技术交底	3 月 12 日至 3 月 31 日停工待料。	
	方案审查		
	设备交付进度		
	施工图会审		
	设计交底		
	设计变更		
安全	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底。	
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实。	
	安全文明施工情况	吸烟、安全帽佩戴不规范等习惯性违章较多。	

	安全培训情况	无	
质量	主要工序质量	支架基础外观质量不合格、蜂窝麻面较多。	
	主要原材料质量	光伏支架斜梁断面出现返锈现象。	
	构（配）件质量	无构（配）件进场	
	设备质量	无设备进场	
	质量验评情况	光伏支架基础施工质量不可控，所有施工资料未报验。	
投资	资金情况	无	
	款项支付情况	无	
合同	合同签订情况	未提供施工合同	
	合同执行情况	无	

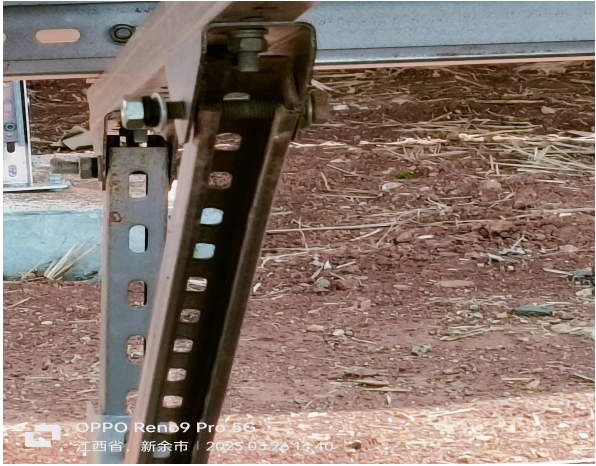
二、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	施工班组数量
人身重伤	机械设备	电网事故			
无	无	无	无	20 名	1

三、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位对光伏区防雷接地、低压电气、箱变基础、开关站、送出线路加紧施工。	监理合同到期，监理人员 4 月 6 日撤离施工现场。
安全管理	对施工人员进行安全培训、提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	
质量管理	督促施工单位提交质量通病防治措施；监督施工单位项目部落实强制性条文的执行计划。	
技术管理	要求施工人员安装图纸要求进行组件安装。	
造价管理	无工程款支付	
物资供应	无物资供应	

四、附图

文字描述	光伏支架连接螺栓未紧固	光伏支架斜梁断面返锈
照片	 OPPO Reno9 Pro 5G 江西省, 新余市 2023.03.26 13:40	 OPPO Reno9 Pro 5G 江西省, 新余市 2023.03.26 13:59
文字描述	光伏支架安装不规范	光伏支架安装不规范
照片	 OPPO Reno9 Pro 5G 江西省, 新余市 2023.03.26 13:41	 OPPO Reno9 Pro 5G 江西省, 新余市 2023.03.26 13:37
文字描述	光伏支架和太阳能组件安装完成	光伏支架和太阳能组件安装完成
照片	 OPPO Reno9 Pro 5G 江西省, 新余市 2023.03.16 15:59	 OPPO Reno9 Pro 5G 江西省, 新余市 2023.03.14 15:40
