



正衡监理

编号: ZHJL-YB-001

监 理 月 报

工程名称: 国投广东生物能源有限公司电化学储能项目

2023 年 2 月

项目监理部 (章):

总监理工程师:



日期: 2023 年 2 月 28 号



扫描全能王 创建

监 理 月 报

开始时间 2023 年 2 月 18 日 结束日期 2023 年 2 月 28 日

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	主要工作	1、定位放线。 2、基础开挖。 3、垫层浇筑。 4、钢筋安装。 5、底板浇筑。 6、基础砌筑。	1. 基础浇筑。 2. 电缆沟、井施工。 3、桥架、电缆敷设。 4、设备吊装、安装。 5、接地网敷设。 6、设备接线、调试。
	设备交付进度	1、钢筋全部到场。 2、接地材料全部到场。	1、桥架电缆全部到位 2、设备全部到位
	设计交付进度	图纸完成	最终图纸移交
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	资料报审滞后	审查报审资料
	技术交底	完成	
	设计变更	目前现场先按图纸施工	若有变更及时解决
安全	安全培训情况	进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育，安全文明施工落实。
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	场地安装及用电安全都已落实	吊装、防火、带电设备安全警示
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度



质量	主要工序质量	严格按照设计及规范要求监管。	强制性质量问题绝不放过
	主要原材料质量	主要材料进行质量检查	把控好材料进场质量问题
	构（配）件质量	把控好进场材料质量关	严抓构配件质量问题
	设备质量		按照要求进行质量验收
	质量验评情况	1、电池舱、升压舱垫层、底板浇筑合格，验筋验模合格	严格按照验收流程把好质量关

二、本月进度情况

- 1、定位放线完成。
- 2、基础开挖完成。
- 3、电池舱、升压舱垫层浇筑完成。
- 4、电池舱、升压舱钢筋安装完成。
- 5、电池舱、升压舱底板浇筑完成。
- 6、电池舱基础砌筑 50%。

三、下月进度计划

- 1、电池舱、升压舱基础施工完成；
- 2、电缆沟、井施工施工完成；
- 3、桥架、电缆敷设完成。
- 4、接地网敷设完成；
- 5、设备吊装、安装、设备接线、调试完成；
- 6、围墙、大门、地面施工完成。

四、安全文明施工情况



事故（起）			编制安全策	施工	施工单位
人身重伤	机械设备	电网事故	划文件（份）	人数	数量
无	无	无	1 份	6 人	1
施工安全 文明交底	每日班前 会已交代	施工现场文明施工情况		良好	


五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	1、定位放线完成。 2、基础开挖完成。 3、垫层浇筑完成。 4、钢筋安装完成。 5、底板浇筑完成。 6、电池舱基础砌筑 50%。 7、安全、消防防护措施落实。	1、基础浇筑完成。 2、电缆沟、井施工完成。 3、桥架、电缆敷设完成。 4、设备吊装、安装完成。 5、接地网敷设完成。 6、设备接线、调试完成。 7、围墙、大门、地面施工完成
安全管理	施工人员安全帽佩戴，反光服穿着， 吊装安全管理，现场防火措施落实。	安全吊装、屋面临时用电安全，动火作业等。
质量管理	发现有质量问题并要求施工方整改	发现有质量问题并要求施工方整改，整改完成后，进行查验。
技术管理	参与过程中重要（关键）环节的施 工技术交底会，监督检查执行情况。	检查现场施工质量
物资供应	督促施工单位进行	




附图

定位放线

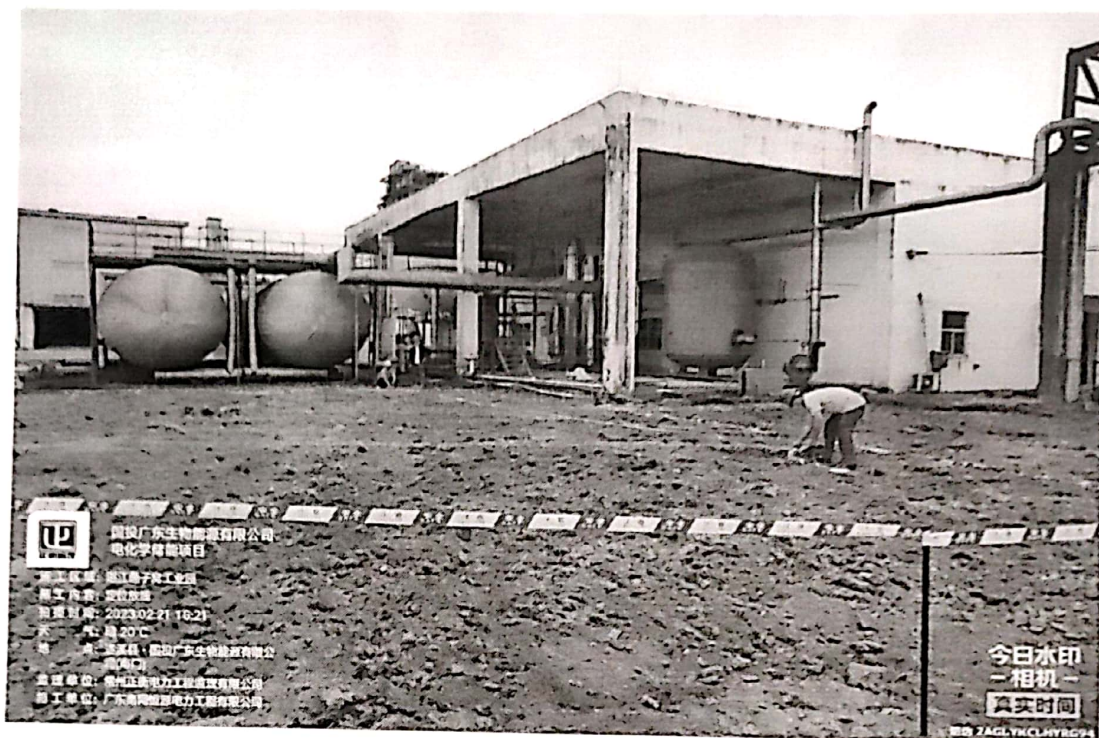


基础开挖

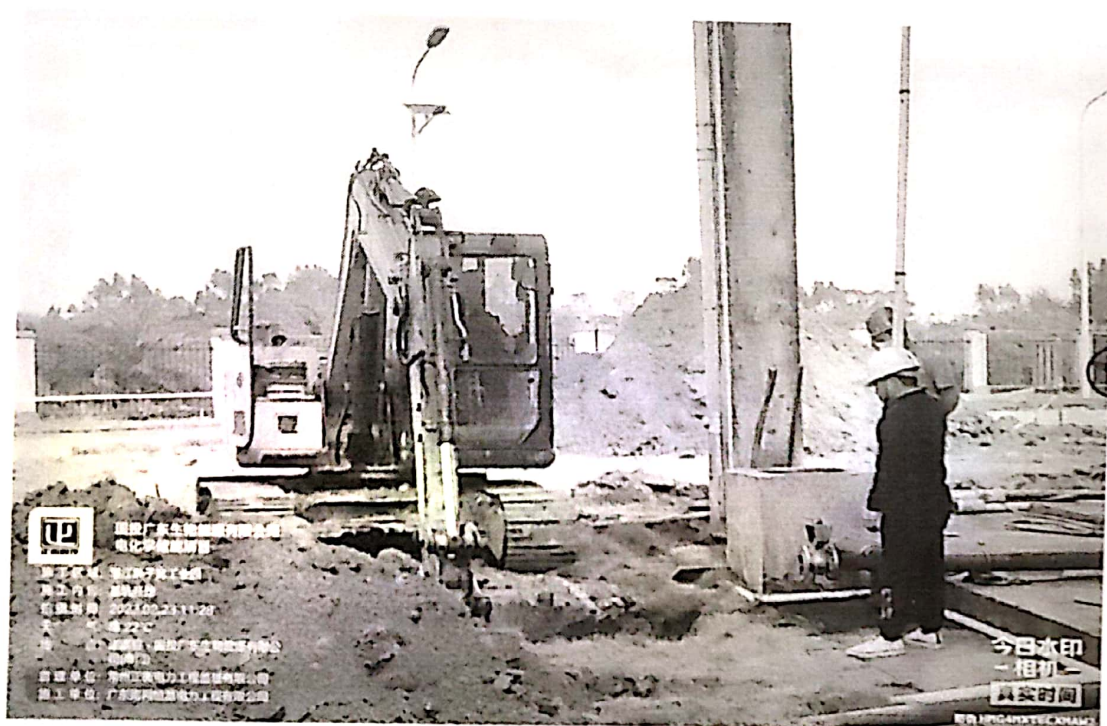

扫描全能王 创建

钢筋安装

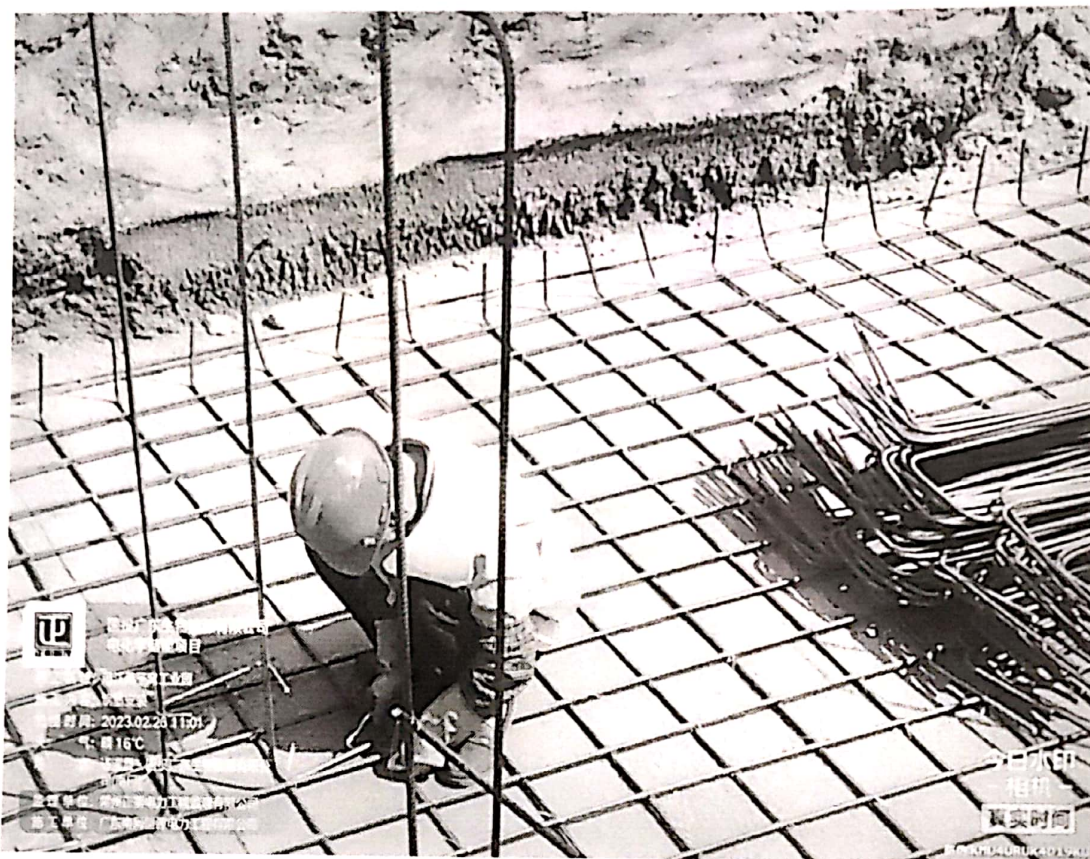

底板浇筑

