



正衡监理

监 理 月 报

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

2023 年 04 月 第 1 期

监理项目部（章）：

总监理工程师：

天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）监理项目部

报告日期： 2023 年 04 月 30 日

监理月报

工程名称： 天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW） 月报 第 1 次月报

开始时间 2023 年 03 月 27 日-结束日期 2020 年 09 月 30 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工单位名称	资料类型	资料数量	备注
1	天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）	中铁电气化局集团第一工程有限公司	影像	13 张	

二、监理重点工作情况

专 业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进 度		1、监理人员进行安全培训及考试。 2、前期策划文件等资料已提交业主签字盖章完成，并已传至监理云平台。 3、工程进度情况：SVG 基础灌注桩施工完成，共计 9 根；2 号主变基础开挖完成，现正在支模、钢筋绑扎；小电阻接地变基础开挖完成，现正在支模。	升压站全部完成； 预制舱基础的施工完成；光伏区打桩



4、主变预埋钢板加工及预埋完成，主变基础支模完成，基础混凝土浇筑完成；基础拆模完成。

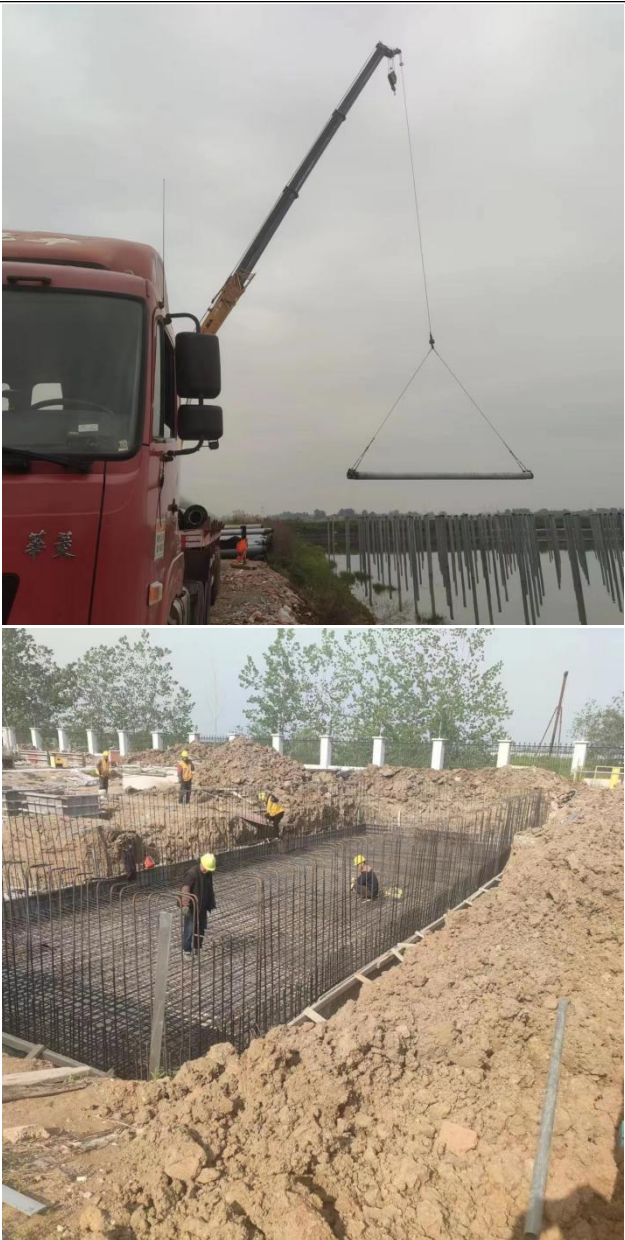
5、主变杯型基础放线、开挖完成，杯型基础垫层浇筑完成，杯型基础钢筋绑扎完成，杯型基础支模完成，主变架构下层承台混凝土浇筑完成。

6、小电阻接地变支模混凝土浇筑完成，拆模完成；

7、35kV 预制舱基础定位放线、开挖完成，预制舱基础、预制舱至主变母线支架基础垫层浇筑完成。

8、SVG 基础垫层钢筋绑扎、浇筑完成，SVG 基础灌孔桩头破除及定位放线完成，预埋件加工已完成，SVG 灌注桩桩基检测完成，SVG 设备基础钢筋绑扎完成。

9、主变、小电阻接地变基础回填完成；

	10、光伏区 32 区预应力管桩打桩 988 根。逆变器 32 区管桩安装完成 11、（4）预制舱垫层浇筑完成、预制舱底板混凝土浇筑完成：	
--	---	--





			
	设备交付进度	基础钢筋全部进场	
	设计交付进度	CAD 图纸已交付	
	质量体系运作情况	质量体系较健全，运行良好	落实质量保证体系， 并对运行情况进行 检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	完成	
	技术交底	完成	
	设计变更	设计变更	
安 全	安全培训情况	进场人员已进行安全培训	对进场新员工进行 安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业 点进行班前交底、审核	
	安全措施落实情况	落实到位	监督施工单位认真 落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理 力度
质	主要工序质量		

量	主要原材料质量	支架型号质量按技术参数，抽检合格	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	进场材料质量合格
	设备质量	进行进场报验、开箱检查	
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	严格按合同执行现场工作

三、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	划文件(份)	人数	分包队	分包队	系统外包	系统外队伍人数
伤	备	故			伍数量	伍人数	队伍数量	
无	无	无		20 人	/	/	/	/

四、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	下月主要进行组件安装，交流电缆敷设是施工等配合业主及各方完成并网。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理文件、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及国标的规范要求进行

	位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	无	
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

2023 年 04 月 30 日
