



监 理 月 报

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

2023年05月

项目监理部（章）：

总监理工程师：王立杰

报告日期：2023年05月30日






监 理 月 报


工程名称： 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 月次 第1次

月报开始时间 2023年04月25日 结束日期 2023年5月30日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	   	照片	11	进度、质量、安全

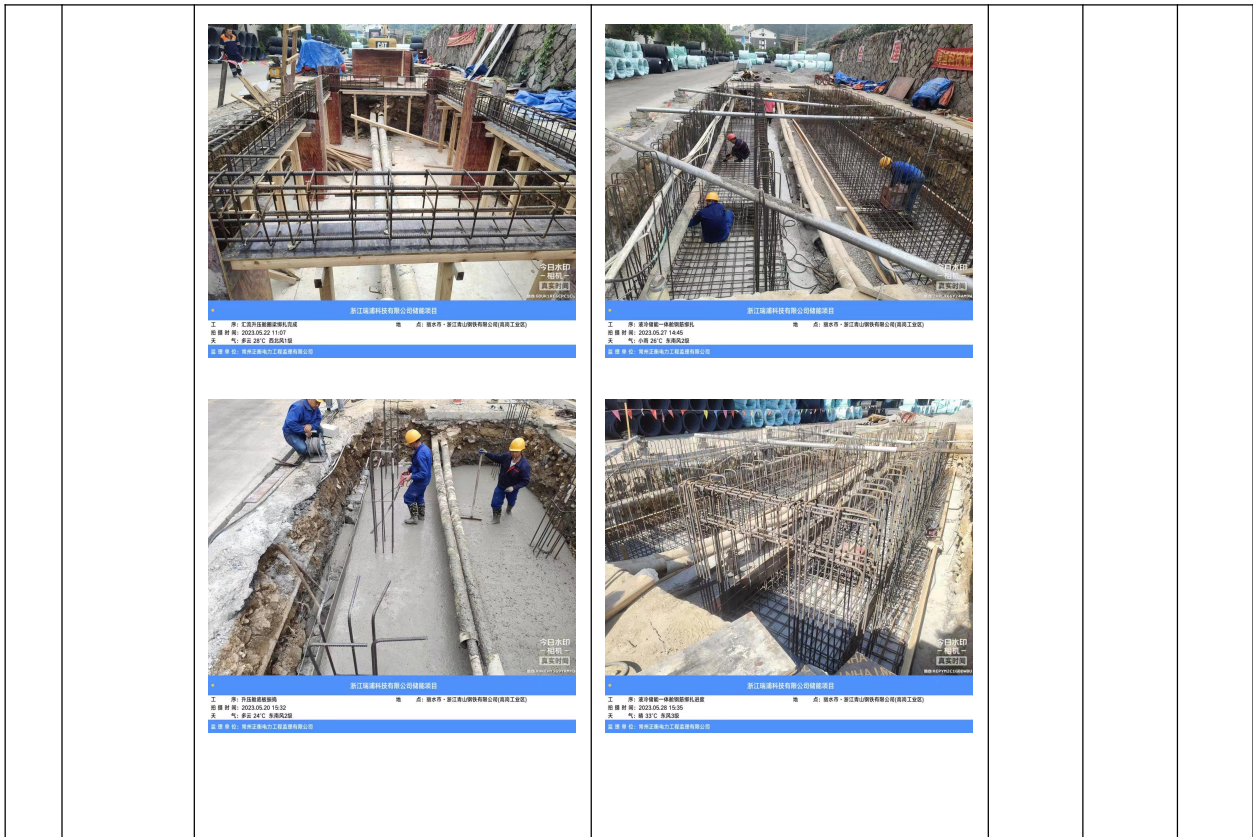

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
	设备交付进度	储能一体舱及汇流升压设备未到场	设备进场安装调试
	质量体系运作情况	质量体系一般，问题整改落实到位质量保证体系，运行情况进行检查。	继续加强检查，发现问题即时督促整改。
	施工图会审	/	/
	方案审查	/	督促施工单位报施工资料
	技术交底	基础施工交底	设备安装及电缆敷设交底
	设计变更	/	/
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	组织新进场员工安全培训
	安全交底情况	临时用电、工器具等安全文明施工进行监督检查。	对设备安装、组件安装登高作业等安全文明施工进行监督检查。

	安全措施落实情况	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。
	安全文明施工情况	巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿、手臂现象。	继续加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	检查电缆沟、电缆井及设备基础施工施工质量。	对现场施工质量等要求进行管理，发现问题要求及时通知整改
	主要原材料质量	钢筋规格型号及混凝土标号预埋穿线管及接地扁铁	\
	构（配）件质量	已检查	继续检查
	设备质量	基本符合要求	对设备进行检查
	质量验评情况	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度

三、本月进度情况

- 1、电缆沟施工完成 80%
- 2、电缆井完成 100%
- 3、设备基础施工完成 40%

四、下月进度计划

- 1、设备基础施工完成，设备到场调试并网，消防及围栏安装。
- 1、全站接地清洗通讯监控施工及消缺

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械设 备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队 伍人数
无	无	无		6人	1	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管 理	电缆沟破路埋管及恢复，电缆井及设备基础施工。	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，提高施工质量及进度。
安全管 理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部《安全文明措施》及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	监督施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管 理	原材料的进场检查；检查施工质量；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	已完成项的消缺整改。
技术管 理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	对已交底工序施工质量复查。

造价管理	/	对施工单位申请的工程款及时进行评审
物资供应	督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	支架及组件到货其他材料未到货。

常州正衡电力工程监理有限公司

浙江瑞浦科技有限公司储能项目

2023年5月30日
