



正衡监理

编号: JLYB-001

监 理 月 报

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

第 2 期

2023.07.01~2023.07.31

项目监理部 (章):

总监理工程师:



报告日期: 2023 年 07 月 31 日

监 理 月 报


工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式发电项目 编号：JLYB-001

一、工程形象进度（形象进度表、照片）

形象进度表

分项名称	施工工序	完成情况	备注
光伏区	围栏安装	100%	
	检修通道安装		
	桥架安装		
	组件安装	70%	
	逆变器安装		
	监控安装		
	清洗系统安装		
	接地网		
二次设备	电缆沟开挖		
	控制柜安装		
	电池、电源柜安装调试		
	环境监测仪		
	测控柜安装调试		
	监控柜安装调试		
	计量柜安装调试		
	开关柜安装调试		
土建	箱变基础开挖		
	基础钢筋绑扎		
	箱变基础浇筑		
	箱变基础砌筑		
	箱变基础粉刷		
	百页窗		
	箱变接地		
	箱变安装		
	基础钢筋绑扎		

形象照片

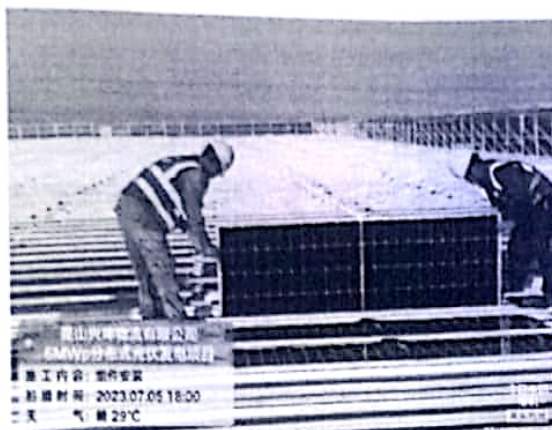

二、主要监理工作（质量、安全、进度）

1、本月因雨水较多，加上施工班组撤场与新班组进的间隔，施工进度有所滞后，目前缺失部分围栏已补装完成。组件也准备安装中，监理人员将对彩钢清理、组件安装等重点监管，并要求进行成品保护，对线插连接的套管切割毛刺进行打磨后安装，确保组件连接线不被划伤，尽量减少对组件的踩踏，同时督促施工单位同步上报过程资料，做好分部分项工程验收工作，监理部定期召开监理例会，对上周进行汇报总结。

2、本监理部在对进场的新班组已督促管理人员做好了进场安全培训和考试，检查意外保险到位，监理部将对新施工队的吊装进行例行检查和安全旁站，并要求新施工队在夏季高温施工中，组织饮用水和防暑用品，确保防暑工作正常，本月安全文明生产状况良好，施工现场未有任何安全问题发生。

3、本月工程进度与原进度计严重滞后，虽有天气因素，也有人为原因，已要求总包重新做好进度倒排计划，确保工程进度按合同要求完成。

三、工程存在问题及建议

现场没有专职安全员，管理人员虽多却看不到问题，通知单发后未回复。

监理部要求总包项目部加强质量管理和安全管理，积极做好自验工作，确保工程质量良好。

四、下月监理工作安排

积极督促总包对组件安装、土建工程、一、二次设备安装质量、安全加强管理，完善现场各工序验收资料。

项目本月大事记

- 1、2023年07月06日建设单位上级领导来现场指导工作。
- 2、2023年07月11日建设方安全、质量技术部门来现场检查指导工作。

2023年07月31日
