



正衡监理

编号: JLYB-001

监 理 月 报

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

第 1 期

2023.06.01~2023.06.30

项目监理部 (章):

总监理工程师:



报告日期: 2023 年 06 月 30 日

监 理 月 报


工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式发电项目 编号：JLYB-001

一、工程形象进度（形象进度表、照片）

形象进度表

分项名称	施工工序	完成情况	备注
光伏区	围栏安装	100%	
	检修通道安装		
	桥架安装		
	组件安装	35%	
	逆变器安装		
	监控安装		
	清洗系统安装		
	接地网		
二次设备	电缆沟开挖		
	控制柜安装		
	电池、电源柜安装调试		
	环境监测仪		
	测控柜安装调试		
	监控柜安装调试		
	计量柜安装调试		
	开关柜安装调试		
箱变	箱变基础开挖		
	基础钢筋绑扎		
	箱变基础浇筑		
	箱变基础砌筑		
	箱变基础粉刷		
	百页窗		
	箱变接地		
	箱变安装		
	基础钢筋绑扎		

形象照片

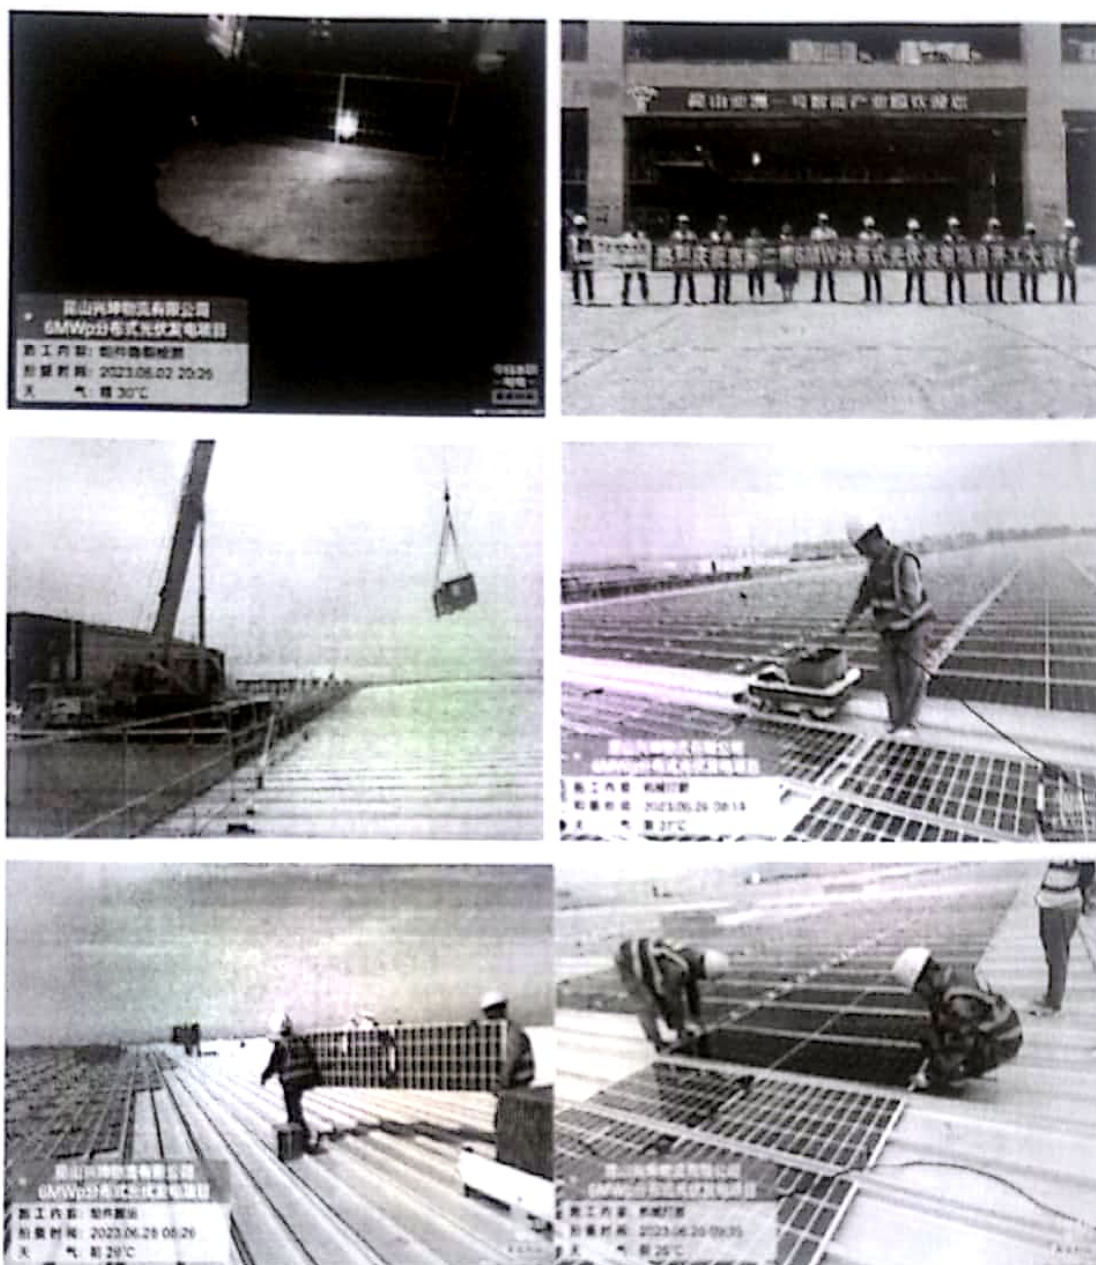

二、主要监理工作（质量、安全、进度）

1、监理部重点对进场材料、设备进行平行检查，发现围栏材料的厚度及镀锌层不符合要求，已及时要求总包对围栏材料进行撤场，并已重新安排合格围栏材料进场。在组件安装过程中，监理人员对彩钢清理度、打胶粗细度、组件安装等进行抽查，加大了清理力度，对组件安装严重错位的责令进行了整改，确保组件安装符合了，要求并做好监理日记，严格施工程序，同时督促施工单位同步上报过程资料，做好分部分项工程验收，监理部定期召开监理例会，对上周进行汇报总结。

2、本监理部在日常监理过程中特别重视安全方面的监理工作，对进场的新工人督促管理人员做好进场安全培训，对吊装进行例行检查和安全旁站，对临时用电、消防、场容场貌等进行严格管理，在夏季高温施工中，提前要求组织饮用水和防暑用品，确保防暑工作正常，本月安全文明生产状况良好，施工现场未有任何安全问题发生。

3、工程进度与原进度计划相比有些滞后，虽有天气因素，也有人为原因，已要求总包重新做好进度倒排计划，确保工程进度按时完成。

三、工程存在问题及建议

现场没有专职安全员，通知单发后未回复。

监理部要求总包项目部加强质量管理和安全管理，积极做好自验工作，确保竣工顺利完成。

四、下月监理工作安排

积极督促总包对质量、安全加强管理，完善现场各工序验收资料。

项目本月大事记

- 1、2023年06月02日第三方检测机构进行第一批组件检测。
- 2、2023年06月08日开工典礼。
- 3、2023年06月15日建设方来现场检查。
- 4、2023年06月15日第三方检测机构进行第二批组件检测。

2023年06月30日
