



正衡监理

编号: JXM15-SYAC-01

监 理 月 报

工程名称: 安川电机(沈阳)有限公司 2842.4kWp 屋顶分布式光伏电站项目

2023 年 9 月

项目监理部(章):

总监理工程师: 焦猛



报告日期: 2023 年 9 月 16 日

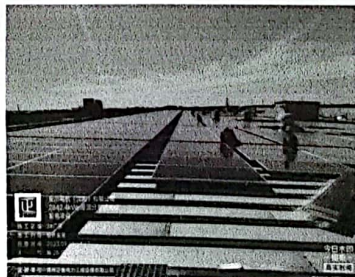
监 理 月 报

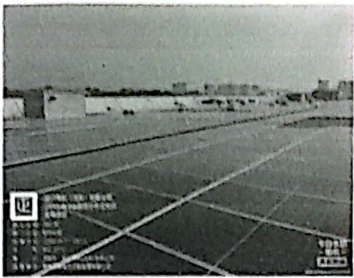
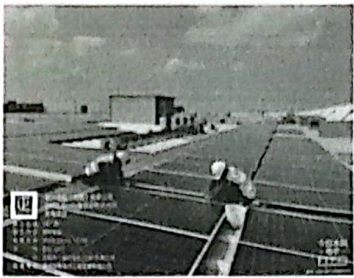
工程名称: 安川电机(沈阳)有限公司 2842.4kWp 屋顶分布式光伏电站项目 月次 第 1 次

月报开始时间 2023 年 8 月 16 日 结束日期 2023 年 9 月 16 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称		资料类型	资料数量	备注
1	安川电机(沈阳)有限公司 2842.4 kWp 屋顶分布式光伏电站项目			照片	10	进度、质量、安全
						
						

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
	设备交付进度	现场组件及光伏支架、电缆桥架、交直流电缆、逆变器已全部到场	逆变器、桥架、交直流电缆、并网柜到场安装
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查	继续加强检查，发现问题即时督促整改。
	施工图会审	无	无
	方案审查	无	审查报审资料
	技术交底	已交底	/
	设计变更	无	/
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	加强对施工人员的安全培训
	安全交底情况	对临时用电、工器具等安全文明施工进行监督检查。	对现场安全文明施工进行监督检查。
	安全措施落实情况	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。
	安全文明施工情况	巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿、	继续加强现场安全管理力度

		手臂现象。	
质量	主要工序质量	检查支架、接地扁铁、电缆敷设情况	对现场施工质量等要求进行管理，发现问题要求及时整改
	主要原材料质量	检查支架质量	检查进场气象站设备质量
	构（配）件质量	检查夹具、电缆桥架质量	检查安装质量
	设备质量	基本符合要求	对到场设备进行检查
	质量验评情况	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度

三、本月进度情况

- 1、夹具、支架全部完成。
- 2、1#屋面组件安装完成 15%，2#屋面组件安装完成 60%，3#屋面组件安装完成 95%。
- 3、1#屋面桥架安装完成 15%，2#屋面桥架安装完成 30%，3#屋面桥架安装完成 50%。

四、下月进度计划；

- 1、逆变器吊装，安装
- 2、电缆桥架安装
- 3、气象站安装
- 4、并网柜到场安装接线

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件(份)	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无		20 人	/	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
----	----------	----------

进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性。	优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部《安全文明措施》及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	监督施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	原材料的进场检查；检查施工质量；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。
技术管理	/	/
造价管理	/	/
物资供应	/	/

安川电机（沈阳）有限公司 2842.4kWp 屋顶分布式光伏电站项目监理项目部

2023年9月16日

