

监理月报

工程名称： 轩凯生物科技(滁州)有限公司
2.248MW 分布式光伏发电项目

2023 年 11 月 2023 年第 1 期

总监理工程师：徐耀生

轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248MW 分布式光伏发电项目 监理部



填报周期 2023-11-21-2023-11-30

一. 工程概况:

项目名称	轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248MW 分布式光伏发电项目		
项目概况	<p>该项目位于安徽省滁州市兰州路与新安江路交叉口东南侧，利用轩凯生物科技（滁州）有限公司厂房屋面 23121 平米和停车棚屋面 300 平米，主要在构筑物屋面铺设 3875 块高效晶硅光伏组件，即 2.248MW。</p> <p>项目建成后，形成平均年发电量 236 万千瓦时的规模。本项目采用自发自用、余电上网的模式。</p>		
项目批复概算 (万元)	750	项目累计完成投资 (万元)	
设计单位	湖南动力源电力勘测设计有限公司		
施工单位	山东博达电力工程有限公司		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
主要设备制造厂家	1.组件厂家:晶科能源; 2 支架厂家:天津宝利鑫钢铁有限公司; 3. 逆变器:深圳古瑞瓦特新能源有限公司; 4.交流电缆:上海上进电缆有限公司; 5.组件铝合金导轨:清源股份(厦门)有限公司		

二.项目进展情况:

1. 五金车间和公用工程用房屋面支架配重块 650 个，已全部到场，并已吊装到两个屋面。
2. 五金车间和公用工程用房屋面已开始支架安装。
3. 五金车间. 公用工程用房. 粉剂车间屋面上人爬梯已完成安装。
4. 发酵车间屋面监控两台，已完成安装
5. 电缆顶管已完成 2 路拉管。
6. 五金车间屋面支架安装完成 55%。
7. 公用工程用房屋面支架安装完成 40%。
8. 主要设备. 材料到场情况:

轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248MW 分布式光伏发电项目月报

名 称	厂家规格型号	本周到货	备 注
组件	晶科能源 IKM580N-72H4-V	2278×1134×35 mm.	4008 片, 已到货 100%
逆变器	深圳古瑞瓦特新能 源有限公司	125KW11 台, 50KW12 台	已到货 100%
交流电缆	上海上进电缆有限 公司	3883m	已到货 100%
铝合金导轨	清源股份(厦门)有 限公司		
支架	天津宝利钢铁	6m492 根, 4m275 根	已到货 100%
接地扁铁	天津宝利钢铁	40×4 2562m	已到货 100%
防护围栏	天津宝利钢铁	650m	已到货 100%
电缆桥架		1558m	已到货 100%
直流电缆		22000m	已到货 100%

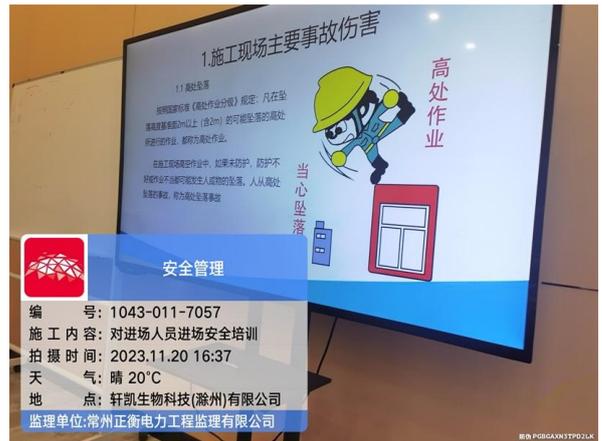
三. 项目安全施工管理。

对新进场的作业人员坚持进行安全学习培训, 现场巡查注重安全管理, 发现安全隐患及时排除, 对安全违章人员严肃处理。现场施工安全管控措施基本落实到位, 施工安全管理受控。

四.人员及机械配置情况							
土建							
序号	名称	型号	规格	单位	数量	人员	
						管理人员	施工人员
1	支架混凝土配重块		H300×Φ500 mm	个	650		
2							
支架及组件安装							
序号	名称	型号	规格	单位	数量	人员	
						管理人员	施工人员
1	支架安装	Q235B	41×41×2.5 41×52×2.5	根	6m492根, 4m275根	3	10
2	组件安装	580	2278×1134×35	片	4008		
3	铝合金导轨安装						
五. 下月计划主要工作内容							
1. 计划组件安装完成 100%。 2. 计划电气设备安装接线完成 100%。 3. 计划完成所有安装施工任务 100%。							

2.工程照片

文字描述	新进场人员安全学习培训	新进场人员安全学习培训
------	-------------	-------------

<p>照片</p>	 <p>安全管理</p> <p>编号: 1043-011-7056 施工内容: 轩凯对进场人员进场安全培训 拍摄时间: 2023.11.20 16:16 天气: 晴 20°C 地点: 轩凯生物科技(滁州)有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司</p>	 <p>安全管理</p> <p>编号: 1043-011-7057 施工内容: 对进场人员进场安全培训 拍摄时间: 2023.11.20 16:37 天气: 晴 20°C 地点: 轩凯生物科技(滁州)有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司</p>
<p>文字描述</p>	<p>进场作业吊车钢丝绳及吊具检查</p>	<p>项目监理例会</p>
<p>照片</p>	 <p>安全管理</p> <p>编号: 1054-110-2156 施工内容: 对汽车吊钢丝绳、吊具进行检查 拍摄时间: 2023.11.22 09:05 天气: 雾 7°C 地点: 轩凯生物科技(滁州)有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司</p>	 <p>监理例会</p> <p>编号: 1057-183-1255 拍摄时间: 2023.11.24 18:44 天气: 晴 7°C 东风3级 地点: 安徽省滁州市·滁州大道</p>
<p>文字描述</p>	<p>屋面支架配重块吊装</p>	<p>屋面支架配重块摆放尺寸核查</p>

照片



文字描述

公用工程用房屋面支架安装

五进车间屋面支架安装

照片

