

监理月报

日期： 2024 年 01 月 28 日



一、本月工程进展情况

工程进度情况：

1、9号厂房彩钢瓦屋面支架安装完成 30%；桥架安装完成 30%；交流电缆敷设完成 50%；逆变器安装完成 70%。

2、15号厂房彩钢瓦屋面支架安装完成；运维通道、桥架安装完成 70%；直流电缆敷设完成 70%；组件安装完成 40%。

3、19号厂房彩钢瓦屋面支架安装完成；运维通道、桥架安装完成 90%；交、直流电缆敷设完成 80%；组件安装完成；逆变器安装完成 80%。

4、开关站、箱变、预制仓、SVG、并网柜安装、接线完成（本工程为高压并网，暂未做第三方测试）。

本月完成工作：

1、9号厂房彩钢瓦屋面支架安装完成 30%；桥架安装完成 30%；交流电缆敷设完成 50%；逆变器安装完成 70%。

2、15号厂房彩钢瓦屋面运维通道、桥架安装完成 70%；直流电缆敷设完成 70%；组件安装完成 40%。

3、19号厂房彩钢瓦屋面运维通道、桥架安装完成 90%；交、直流电缆敷设完成 80%；组件安装完成；逆变器安装完成 80%。

4、开关站、箱变、预制仓、SVG、并网柜安装、接线完成（本工程为高压并网，暂未做第三方测试）。

下月进度计划：

1、安装工程全部完成，测试完成并网发电；

2、项目竣工验收；

3、资料交接完成。

二、工程设计及图纸、设备材料的供给情况

1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图，只有一份电子版简图，需尽快提供。

2、进场材料满足现场施工要求。

3、施工资料报审工作滞后，已要求施工单位尽快完成报审工作，否则一切责任后果自行承担。

三、工程安全、健康及环境保护管理情况

1、安全设施配置齐全，安全情况可控。

四、工程质量情况

1、出现导轨安装不放线、安装错位现象，已要求施工单位及时整改。

2、出现组件方阵中心线偏差现象，已要求施工单位及时整改。

3、出现直流线电缆头制作芯线损伤现象，已要求施工单位及时整改。



扫描全能王 创建

3、出现直流线电缆头制作芯线损伤现象，已要求施工单位及时整改。

五、本周工程进度分析

1、本周进度滞后，滞后主要因素：厂方规章制度及吊装限流。

六、本周主要施工资源投入情况

1、光伏支架、运维通道、采光格栅板、桥架、逆变器、交直流电缆、组件、开关站、箱变、预制仓、SVG、并网柜。

七、投资控制及工程款支付情况

无


八、工程存在问题及监理要求

- 1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图，需尽快提供到位。
- 2、施工资料报审滞后，总包需尽快完成报审工作，监理撤场后将不再提供资料补签工作。
- 3、开关站、箱变、预制仓、SVG、并网柜安装、接线完成（暂未做第三方测试）；本工程为高压并网，测试完成前禁止并网发电。若施工单位私自行为，一切责任后果自负。
- 4、接地系统安装完成前禁止并网发电。若施工单位私自行为，一切责任后果自负。

九、监理发文

本月监理文件签发：会议纪要 4 份。

十、工程照片

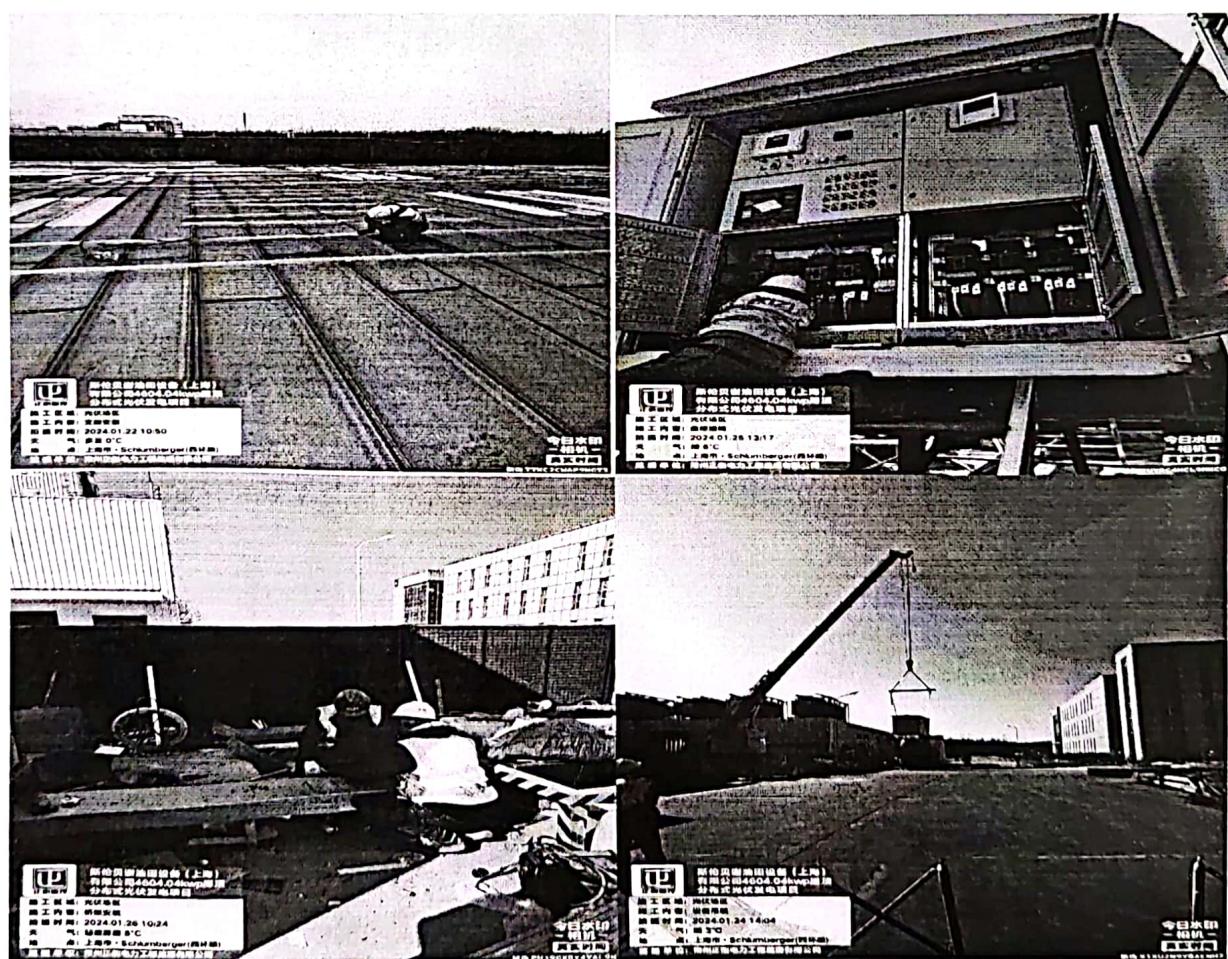

扫描全能王 创建
