

编号: JLYB-001



正衡监理

监 理 月 报

工程名称: 建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp

分布式光伏发电项目

第 1 期

2024.02.20~2024.03.19

项目监理部 (章):

总监理工程师:



李俊平

报告日期: 2024 年 03 月 19 日

监 理 月 报

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式发电项目 编号：JLYB-001


一、工程形象进度（形象进度表、照片）

形象进度表

分项名称	施工工序	完成情况	备注
光伏区安装	桥架安装	95%	
	组件安装	100%	
	逆变器安装	100%	
	监控安装	0%	
	清洗系统安装	0%	
	走道安装	无无	
	接地网	30%	
配电房安装	电缆沟开挖	无	
	电缆敷设	100%	
	并网柜安装	100%	
	环境监测仪	0%	

形象照片



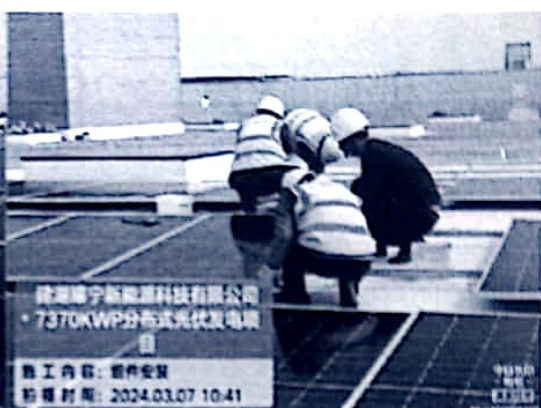



二、主要监理工作（质量、安全、进度）

1、本月度因雨雪天气较多，施工进度有点滞后，目前所有组件全部安装完成，桥架安装完成，交直流电缆完成，逆变安装完成，并网柜安装完成，组件安装过程中，严禁背运及踩踏，并要求进行成品保护，对组串线插连接的要求垫板踩踏，确保组件不被隐裂，进行到货检合格率良好，过程中对提出的问题不整改的已发通知单要求整改。在管控质量和进度的同时，督促施工单位同步上报进场及过程资料，做好自检自查工作，监理部定期召开监理例会，对上周工作进行汇报总结。

2、监理部在对吊装进行例行检查和安全旁站，吊装过程中能拉好警示线，警示线两侧专人看护，管理人员现场指挥，本月安全文明生产状况良好，施工现场未有任何安全问题发生。

3、本月工程进度与原进度计滞后，但除了三号配电房外，都已并网发电，目前桥架盖板、防雷接地正常施工中。

三、工程存在问题及建议

现场没有持证专职安全员，管理人员偏少忙不过来，通知单发后还未收到回复。

监理部要求总包项目部加强质量和安全管理工作，积极做好自验自查工作，在后续的施工确保工程质量良好，安全生产正常。

四、下月监理工作安排

积极督促总包单位对桥架安装、接地网安装、清洗系统施工中加强质量安全管理，完善现场各进进场和工序验收资料。

2024年03月19日
