

监 理 月 报

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目

2024年 08月 第 二 期

(2024 年08月01 日 至 2024年08月 31日)

项目监理部（章）：

监理工程师：张献年

报告日期：2024年 08月 31 日

监 理 月 报

一、安全情况：

1. 开工工期62天；安全生产62天。本月项目施工安全生产情况总体平稳，未发生不安全事件。
2. 监督施工单位对进场施工人员每日班前安全交底会。
3. 施工临时用电配电箱使用三级配电箱，并按要求做到“一机一闸一漏”，定期检查箱内电器开关件的安全有效性。
4. 对现场施工工人进行专项检查，发现的超龄人员予以清退，不得入场作业。
5. 对施工区高空作业周边主要进出口装设安全标识标牌。要求施工吊装区域设置警示牌、警戒线、做到安全有序。
6. 施工区域内杂物、纸箱、托盘进行有须的堆放，保持周边道路卫生、清理施工现场保持“工完料尽场地清”。
7. 组织施工管理人员对业主单位文件进行安全教育学习，监督施工单位对现场所有施工人员进行三级安全教育，学习公司相关安全制度、相关文件，事故案例等知识。
- 8、吊装作业手续齐全、特种作业人员证件齐全有效。

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无	2份	30人	/	/	/	/

二、本月进度情况：

序号	工作名称	开始时间	完成时间	备注
1	混凝土墩子	2024年7月1日	2024年7月4日	已完成100%
2	支架	2024年7月4日	2024年7月20日	已完成100%
3	直流电缆	2024年8月20日	安装中	已完成0.2%
4	组件	2024年7月23日	安装中	已完成11%
5	逆变器			
6	接地扁铁			
7	桥架			
8	交流电缆			
9	箱变			
10	一二次设备			

三、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	混凝土墩子安装完成100%水泥屋面支架安装完成100%。水泥屋面组件安装100%，8%，15-16加固完成，17-18加固有序进行中，一分厂组件安装，护栏安装完成，15-16安全防护措施安装，电缆沟开挖破路。	组件安装100%，护栏安装完成100%，逆变器安装17台，光伏线接线完成100%，走道板安装完成100%，交流电缆放线完成100%，电缆敷设完成。
安全管理	督促施工单位对新进场施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。每日施式班会落实到位。施工手续齐全，特种作业证人证合一，主要机械操作人员证件齐全有效，现场安全文明施工基本正常，临时用电基本正常。本月安全基本可控。	现场安全围栏等防护措施到位，做好现场安全管理工作，对发现的安全问题整改到位。对已带电设备做警示标识，施工人员保持安全距离作业。
质量管理	BIPV组件、支架安装牢固，导轨螺栓拧紧；现场施工过程影相资料全。督促施工单位做好质量通病防治措施及落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照设计施工图纸、施工工艺、规范要求进行施工。巡视检查现场施工过程质量控制。
技术管理	对施工人员进行技术交底，检查并复核是否按照施工方案及技术交底内容进行施工。进场材料设备及时提供厂家质检报告和厂家资质。	对现场安装技术进行技术支持和自检，与设计及规范要求对应
造价管理	无	无
物资供应	辅材采购中暂未进场。	无

四、施工质量问题情况：

- 1、 组件胶条安装位置错误
- 2、 组件光伏线未绑扎。
- 3、 直流线缆未就近绑入组件下方支架。
- 4、 方管未安装连接件禁止铺瓦。
- 5、 一体化盖条个别列缝隙偏大及时调整。

五、监理工作情况

- 1、组件安装巡视。
- 2、BIPV支架平行巡视。
- 3、直流电电缆敷设巡视。
- 4、每周安全质量监理检查。
- 5、日常巡视检查。
- 6、每周安全质量监理检查。
- 7、日常巡视检查。
- 9、监理日志及会议纪要整理。
- 10、施工报审资料审核。
- 11、资料完善并上传系统

七、其他事宜：

- 1、无。

八、工程形象进度照片

业主屋面巡视  江西台鑫钢铁有限公司 分布式光伏发电二期 5999KW项目 施工内容：建设单位现场巡视 拍摄时间：2024.08.27 17:30 地点：上饶市·320国道	一分厂几字形支架安装  江西台鑫钢铁有限公司 分布式光伏发电二期 5999KW项目 施工内容：一分厂几字形支架安装 拍摄时间：2024.08.28 18:18 地点：·上饶市·320国道
加固施工  江西台鑫钢铁有限公司 分布式光伏发电二期 5999KW项目 施工内容：17-18加固施工 拍摄时间：2024.08.29 08:38 地点：上饶市·工业大厦	组件检测  江西台鑫钢铁有限公司 分布式光伏发电二期 5999KW项目 施工内容：组件检测到货验收 拍摄时间：2024.08.27 20:27 地点：上饶市·320国道

采光瓦铺设



监理例会




BIPV材料检查



采光瓦铺设检查



建设单位领导现场巡视

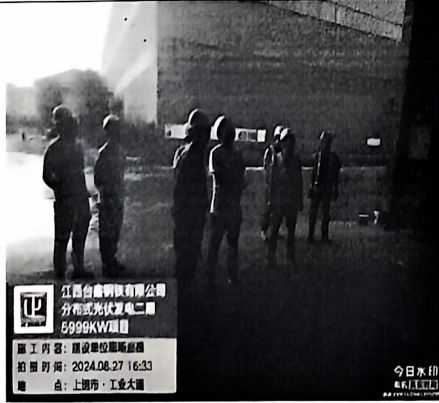


爬梯焊接



材料检查

爬梯焊接

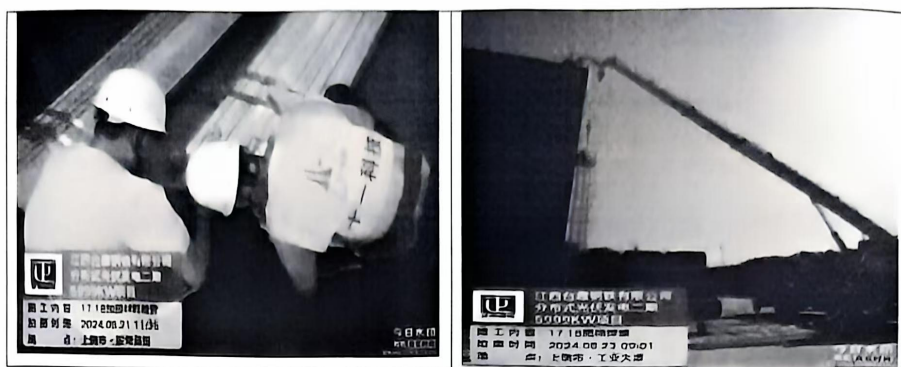

常州正衡电力工程监理有限公司

江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目

2024 年 08月31日
