



编号：YFDK-A13-02

监 理 月 报

工程名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

分布式光伏发电项目

2024年8月

项目监理部（章）：

总监理工程师：张献兵

报告日期：2024 年 8 月 29 日

监 理 月 报

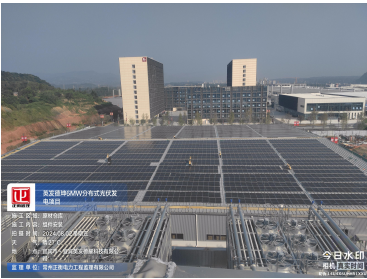
工程名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

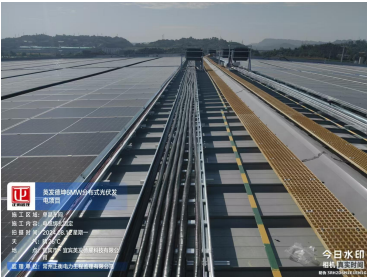
月次 第 2 次

月报开始时间 2024 年 7 月 28 日结束日期 2024 年 8 月 29 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目 分布式光伏发电项目	 	照片	10	进度、质量、安全

		 	 			
--	--	---	---	--	--	--

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
	设备交付进度	现场主要设备已全部到场	检查到场设备外观、合格证、检验报告
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查	继续加强检查，发现问题即时督促整改。
	施工图会审	无	无
	方案审查	审查开工资料	审查报审资料
	技术交底	已交底	/
	设计变更	无	/
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	加强对施工人员的安全培训
	安全交底情况	对临时用电、工器具等安全文明施工进行监督检查。	对现场安全文明施工进行监督检查。
	安全措施落实情况	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。
	安全文明施工情况	巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿、手臂现象。	继续加强现场安全管理力度

质量	主要工序质量	检查组件、逆变器安装情况 旁站设备就位，试验	对现场施工质量等要求进行管理，发现问题要求及时整改
	主要原材料质量	检查逆变器支架焊接	检查消缺整改情况
	构（配）件质量	检查进场电力管道符合要求	检查安装质量
	设备质量	预制仓、箱变站用变符合要求	对到场设备进行检查
	质量验评情况	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度

三、本月进度情况

- 1、送出线路电缆沟开挖埋管已全部完成。
- 2、交直流电缆已全部敷设完成。
- 3、预制仓、箱变、站用变已到场就位。
- 4、电缆桥架安装完成 100%。
- 5、逆变器及支架安装完成 100% 。

四、下月进度计划；

- 1、交流电缆敷设接线
- 2、接地扁铁焊接
- 3、视屏监控安装调试
- 4、设备接线，调试并网
- 5、消缺整改

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件(份)	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无		48 人	/	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性。	优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	监督施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	原材料的进场检查；检查施工质量；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。
技术管理	/	/
造价管理	/	/
物资供应	/	/

英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目
 监理项目部
 2024 年 8 月 30 日
