



编号: YFDK-A13-01

监 理 月 报

工程名称: 英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

分布式光伏发电项目

2024 年 7 月



总监理工程师: 张献兵

报告日期: 2024 年 7 月 29 日

监 理 月 报

工程名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目分布式光伏发电项目


月次第 1 次

月报开始时间 2024 年 6 月 28 日结束日期 2024 年 7 月 29 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序 号	单位工 程标准 名称	施工项目名称		资料 类型	资料 数量	备 注
1	英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目 分布式光伏发电项目			照片	10	进 度 、 质 量 、 安 全
						
						

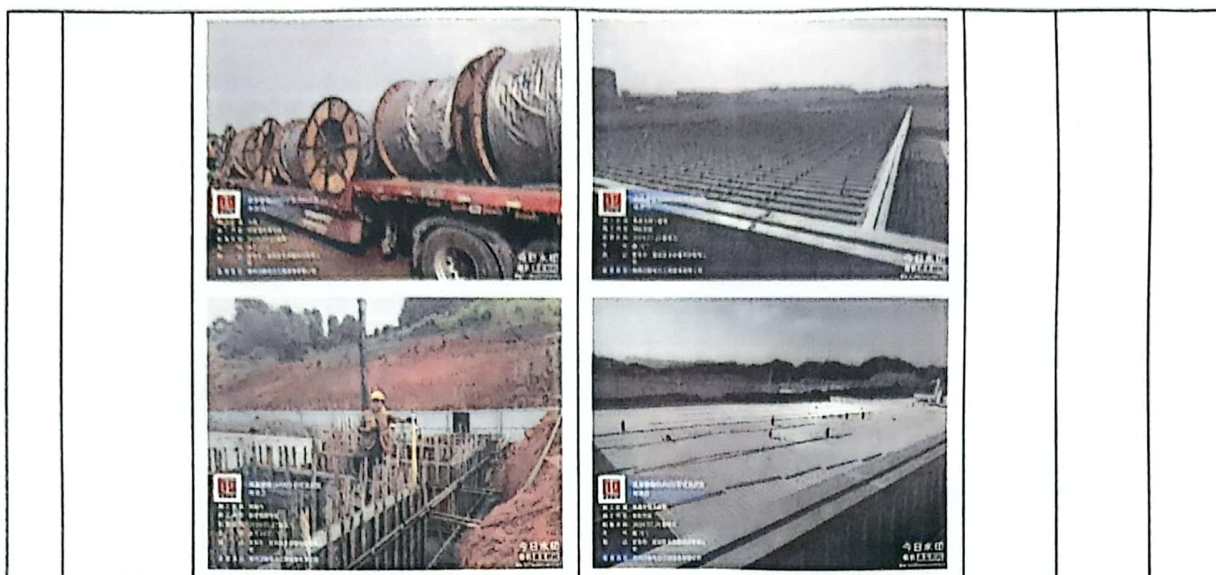

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
	设备交付进度	现场夹具支架及组件逆变器已全部到场	预制仓、箱变、SVG、站用变到场
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查	继续加强检查，发现问题即时督促整改。
	施工图会审	无	无
	方案审查	审查开工资料	审查报审资料
	技术交底	已交底	/
	设计变更	无	/
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	加强对施工人员的安全培训
	安全交底情况	对临时用电、工器具等安全文明施工进行监督检查。	对现场安全文明施工进行监督检查。
	安全措施落实情况	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。
	安全文明施工情况	巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿、手臂现象。	继续加强现场安全管理力度

质量	主要工序质量	检查支架、组件安装情况 旁站设备基础浇筑	对现场施工质量等要求进行管理，发现问题要求及时整改
	主要原材料质量	检查支架质量	检查进场设备质量
	构（配）件质量	检查夹具、支架质量、桥架符合要求	检查安装质量
	设备质量	基本符合要求	对到场设备进行检查
	质量验评情况	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度

三、本月进度情况

- 1、各屋面安全护栏、夹具、支架全部完成。
- 2、组件安装完成 70%。
- 3、设备基础浇筑完成。
- 4、电缆桥架安装完成 60%
- 5、逆变器支架安装完成 80%

四、下月进度计划：

- 1、交流电缆敷设接线
- 2、接地扁铁安装
- 3、逆变器安装
- 4、设备就位安装调试

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件(份)	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无		48 人	/	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性。	优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	监督施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	原材料的进场检查；检查施工质量；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。
技术管理	/	/
造价管理	/	/
物资供应	/	/

英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目 分布式光伏发电项目

