



编号：GD-ZHJL-YB-20241125

监 理 月 报

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光
互补光伏发电项目

2024 年 11 月 第 01 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：高立标



报告日期：2024 年 11 月 25 日

监 理 月 报

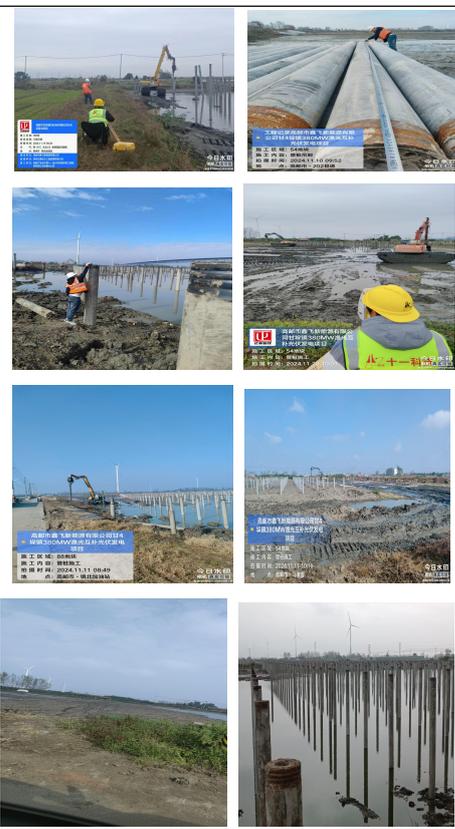
工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

月次 第 1 次

月报开始时间 2024 年 10 月 26 日 结束日期 2024 年 11 月 25 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位 工程 标准 名称	施工项目影像	资料类 型	资料数量	备注
1	高 邮 市 鑫 飞 新 能 有 限 公 司 甘 垛 镇 380M W 渔 光 互 补 光 伏 发 电 项 目		照片	8	/

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	1、检查管桩进场材料到货质量情况， 2、安全旁站管桩卸货情况。 3、旁站桩基施工质量情况。 4、查看塘口改造情况。	1、光伏区桩基等施工质量、安全进行检查。 2、材料进场检查检验情况。	1、光伏区桩基等施工质量进行检查，同时加强安全的监督。 2、升压站土方基础等施工质量进行检查。
	设备交付进度	/	/
	设计交付进度	图纸未完成	图纸未完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	未见图纸会审资料	
	设计交底	未完成	督促完成设计交底
	方案审查	开工资料未完善	督促完善
	技术交底	未齐全	督促完善
	设计变更	/	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促新进员工安全培训
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	完善班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	完善安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施差	增加施工现场安全警示标识标牌，施工现场垃圾处理等。
质量	主要工序质量	核对图纸，光伏区检查桩基施工质量、安全等情况。	严格控制光伏区桩基施工质量。
	主要原材料质量	管桩进场质量较差，已要求施工单位退场处理两次。	主要材料进场我项目监理部实行平行检验，不合格材料退场处理

	构（配）件质量	未进场	/
	设备质量	/	/
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强检查力度、抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	预付款支付单已审批	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）	备注
1	88区桩基施工	/	/	2024.10.30	2024.11.15	100%		
2	55区桩基施工	/	/	2024.11.11	2024.11.18	100%		
3	70区桩基施工	/	/	2024.11.16	2024.11.23	100%		
4	53区桩基施工	/	/	2024.11.10	/	80%		
5	54区桩基施工	/	/	2024.11.05	/	85%		
6	71区桩基施工	/	/	2024.11.19	/	90%		

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成	本月实际完成（完成	权值
						完成	完成	

						量 / 总量)	量 / 总量)	
1	53区桩基施工	/	/	2024.11.10	/	100%		
2	54区桩基施工	/	/	2024.11.05	/	100%		
3	71区桩基施工	/	/	2024.11.19	/	100%		
4	其它区(塘口改造进程)	/	/	/	/	/		

五、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策划文件(份)	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无	无	管理人员: 4人, 安全员 1人, 打桩人员 12人	/	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配 置, 充分调动施工人员的积极性	根据工作面合理增加人员及机械, 增加塘口改造 进度及交付情况, 严格控制桩基施工质量, 陆续 开展各塘口桩基施工。

安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	材料到场进行平行检验；重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照要求，安排人员、机具进行施工。
