



正衡监理

编号: GD-ZHJL-YB-20241225

监 理 月 报

工程名称: 高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光
互补光伏发电项目

2024 年 12 月 第 02 期

项目监理部(章):

总监理工程师: 高立标



报告日期: 2024 年 12 月 25 日

监 理 月 报

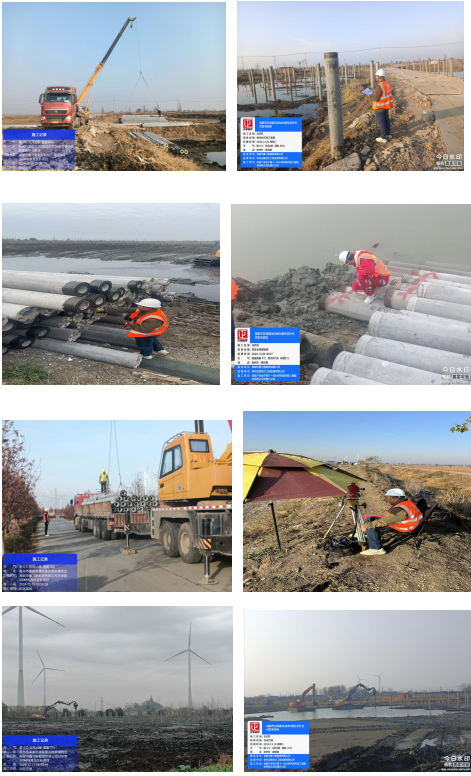
工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

月次 第 2 次

月报开始时间 2024 年 11 月 26 日 结束日期 2024 年 12 月 25 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位 工程 标准 名称	施工项目影像	资料类 型	资料数量	备注
1	高 邮 市 鑫 飞 新 能 源 有 限 公 司 甘 垛 镇 380M W 渔 光 互 补 光 伏 发 电 项 目		照片	8	/

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	1、检查管桩进场材料到货质量情况， 2、安全旁站管桩卸货情况。 3、旁站桩基施工质量情况。 4、查看塘口改造情况。 5、核对各区域已完成塘口打桩数量。 6、审查施工单位报审资料。	1、本月召开 4 次监理例会（签发会议纪要 4 份、监理通知单 4 份，联系单 4 份，考核单 4 份）； 2、对光伏区打桩进行旁站，检查桩顶标高、管桩垂直度、桩间距； 3、对管桩吊装进行安全旁站； 4、本月对 PHC 混凝土管桩进场检查检验，多次发现进场管桩不合格并下达考核单四份（总考核施工单位 62400 元）； 5、参加塘口改造验收情况； 6、组织召开站班会，督导施工单位每天开班会； 7、每日巡视，检查施工质量和安全；检查吊车是否持证上岗情况，本月检查发现个别司机未持证上岗； 8、定期联合总包单位对光伏区进行安全、质量检查，对发现的问题要求总包单位立即整改闭环； 9、本月审查施工单位资料，并下达施工单位报审文件	1、光伏区桩基作业、吊装作业进行安全旁站；桩基施工进行质量旁站。 2、进行冬季施工安全检查，重点检查用电安全、防滑、防火、防寒、防冻安全措施及安全演练落实情况； 3、督促总包单位严格执行“安全文明施工管理规定”，加强特种作业、大型机械人员的证件审查； 4、督导总包单位按照总包合同约定目标，做好安全管理、质量、进度控制工作； 5、要求总包单位强化电力工程安全生产管理，加强基建现场风险隐患排查治理，有效防范各类安全事故，保障冬季施工安全； 6、督导总包单位落实材料进场自检工作； 7、督促总包单位报审施工资料，确保资料要和现场进度同步。 8、督促总包单位做好关于春节长假前施工现场安全检

		审查记录表 3 份，要求施工单位及时整改完善资料； 10、参加业主单位组织的图纸会审。	查事宜。
	设备交付进度	/	/
	设计交付进度	图纸不齐全	督促 EPC 总承包单位完善图纸
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	未见图纸会审资料	完善图纸会审资料
	设计交底	未见设计交底资料	督促完成设计交底
	方案审查	开工资料未完善	督促完善
	技术交底	未齐全	督促完善
	设计变更	/	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促新进员工安全培训
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	完善班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	完善安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施落实不到位，已要求施工单位认真落实	增加施工现场安全警示标识标牌，施工现场垃圾处理等。
质量	主要工序质量	核对图纸，光伏区检查桩基施工质量、安全等情况。	严格控制光伏区桩基施工质量。
	主要原材料质量	管桩进场质量较差，已要求施工单位退场处理多次并下达考核单四份。	主要材料进场我项目监理部实行平行检验，不合格材料退场处理
	构（配）件质量	未进场	/

	设备质量	/	/
	质量验评情况	工序施工符合要求	加大检查力度、抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	预付款支付单已审批	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）	备注
1	88 区桩基施工	/	/	2024.10.30	2024.11.15	100%		
2	55 区桩基施工	/	/	2024.11.11	2024.11.18	100%		
3	70 区桩基施工	/	/	2024.11.16	2024.11.23	100%		
4	53 区桩基施工	/	/	2024.11.10	2024.12.08	100%		
5	54 区桩基施工	/	/	2024.11.05	2024.12.06	100%		
6	71 区桩基施工	/	/	2024.11.19	2024.12.04	100%		
7	50 区桩基施工	/	/	2024.12.01	2024.12.13	100%		
8	60 区桩基施工	/	/	2024.12.07	2024.12.25	25%		
9	76 区桩基施工	/	/	2024.12.08	2024.12.25	50%		
10	25 区桩基施工	/	/	2024.12.09	2024.12.14	100%		
11	84 区桩基施工	/	/	2024.12.10	2024.12.25	25%		

12	74 区桩基施工	/	/	2024.12.13	2024.12.25	20%		
13	26 区桩基施工	/	/	2424.12.15	2024.12.19	100%		
14	31 区桩基施工	/	/	2024.12.15	2024.12.25	30%		
15	83 区桩基施工	/	/	2024.12.19	2024.12.25	10%		
16	58 区桩基施工	/	/	2024.12.22	2024.12.25	5%		
17	56 区桩基施工	/	/	2024.12.23	2024.12.25	3%		
18	85 区桩基施工	/	/	2024.12.23	2024.12.25	8%		

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量/总量）	本月实际完成（完成量/总量）	权值
1	60 区桩基施工	/	/	2024.12.07	/	100%		
2	76 区桩基施工	/	/	2024.12.08	/	100%		
3	84 区桩基施工	/	/	2024.12.10	/	100%		
4	74 区桩基施工	/	/	2024.12.13	/	100%		
5	31 区桩基施工	/	/	2024.12.15	/	100%		
6	83 区桩基施工	/	/	2024.12.19	/	100%		
7	58 区桩基施工	/	/	2024.12.22	/	100%		
8	56 区桩基施工	/	/	2024.12.23	/	100%		
9	85 区桩基施工	/	/	2024.12.23	/	100%		

五、安全文明施工情况

事故（起）	编制	施工人数	安全分包情况
-------	----	------	--------

人身 重伤	机械设 备	电网 事故	安全 策划 文件		分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	无	打桩人员 16 人	/	/	2	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	根据工作面合理增加人员及机械，增加塘口改造进度及交付情况，严格控制桩基施工质量，陆续开展各塘口桩基施工。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，增强作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	材料到场进行平行检验；重点部位施工进行旁站；督促施工单位落实质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照要求，安排人员、机具进行施工。
