



正衡监理

编号：GD-ZHJL-YB-20250625

监 理 月 报

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光
互补光伏发电项目

2025 年 06 月 第 08 期

项目监理部

总监工程师：高立标

高邮市甘垛镇 380MW
渔光互补光伏发电项目
监理项目部

报告日期：2025 年 06 月 25 日

监 理 月 报

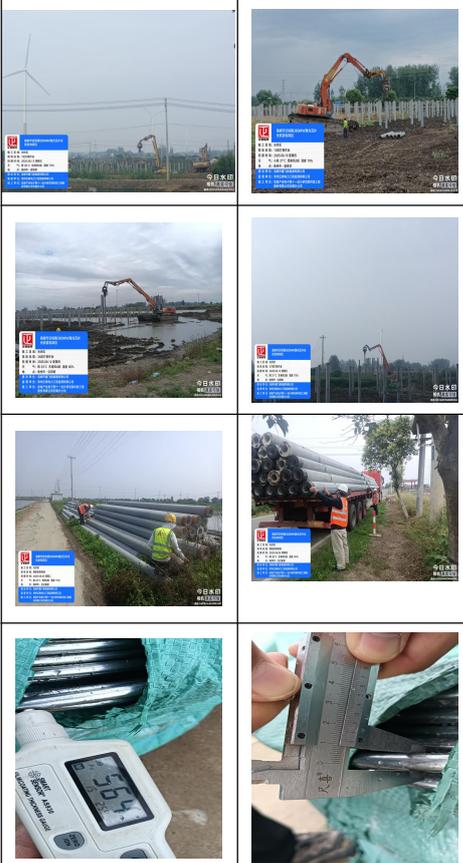
工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

月次 第 8 次

月报开始时间 2025 年 05 月 26 日 结束日期 2025 年 06 月 25 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位 工程 标准 名称	施工项目影像	资料类 型	资料数量	备注
1	高 邮 市 鑫 飞 新 能 源 有 限 公 司 甘 垛 镇 380M W 渔 光 互 补 光 伏 发 电 项 目		照片	8	/

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	1、每周进行安全专项检查并记录。 2、每日旁站桩基施工质量情况。 3、审查施工单位报审资料。 4、检查管桩、锌包钢进场材料到货质量情况。 5、检查施工单位强条执行情况。 6、参加总包单位组织的防暑降温应急演练。	1、召开监理例会并下达会议纪要； 2、对光伏区打桩进行旁站，检查桩顶标高、管桩垂直度、桩间距等； 3、本月对 PHC 混凝土管桩进场检查检验，基本合格； 4、每日巡视，检查施工质量和安全，本月检查发现施工现场安全问题并记录； 6、定期联合总包单位对光伏区进行安全、质量检查，对发现的问题要求总包单位立即整改闭环； 7、检查施工单位项目资料，查缺补漏； 8、每日施工检查出来的相关问题要求施工单位现场整改，拒不整改的下达监理通知单及考核单； 9、检查管桩、锌包钢材料进场质量情况； 10、参加总包单位组织的防暑降温应急演练；	1、要求施工单位加强施工现场安全管理，进入施工现场必须正确佩戴安全帽； 2、督促总包单位完善项目资料，查缺补漏； 3、要求施工单位及时报审进入施工现场的特种车辆及特种作业人员； 4、要求施工单位及时闭环监理通知单； 5、督导总包单位落实材料进场自检工作并做好相关材料进场检查记录； 6、要求总包单位及时提供设计图纸，按图施工； 7、要求施工单位加快施工进度； 8、要求总包单位做到“工完、料净、场地清”。 9、要求总包单位必须按合同约定品牌要求进场相对应的材料、设备。
	设备交付进度	/	/
	设计交付进度	图纸不齐全	督促 EPC 总承包单位完善图

			纸
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	已完成桩基图纸会审	完善图纸会审资料
	设计交底	已完成桩基设计交底	督促完成设计交底
	方案审查	已完善	完善
	技术交底	已齐全	根据项目工程进度督促完善
	设计变更	/	/
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促新进员工安全培训
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	完善班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	完善安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施落实不到位，已要求施工单位认真落实。	增加施工现场安全警示标识标牌，施工现场管桩堆放等。
质量	主要工序质量	核对图纸，光伏区检查桩基施工质量、安全等情况。	严格控制光伏区桩基施工质量。
	主要原材料质量	管桩、锌包钢进场质量基本合格。	主要材料进场我项目监理部实行平行检验，不合格材料退场处理。
	构（配）件质量	未进场	/
	设备质量	/	/
	质量验评情况	工序施工符合要求	加大检查力度、抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	预付款支付单已审批	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）	备注
1	1区桩基施工	/	/	2025.05.28	2025.06.18	100%		
2	2区桩基施工	/	/	2025.05.25	2025.05.26	5%		
3	5区桩基施工	/	/	2025.06.10	2025.06.11	10%		
4	6区桩基施工	/	/	2025.05.22	2025.06.09	100%		
5	10区桩基施工	/	/	2025.06.17	2025.06.25.	60%		
6	14区桩基施工	/	/	2025.06.15	2025.05.25	72%		
7	34区桩基施工	/	/	2025.05.04	2025.06.07	100%		
8	35区桩基施工	/	/	2025.06.12	2025.06.19	100%		
9	37区桩基施工	/	/	2025.06.12	2025.06.18	100%		
10	51区桩基施工	/	/	2025.01.01	2025.06.10	100%		
11	53区桩基施工	/	/	2024.11.10	2025.06.12	100%		
12	67区桩基施工	/	/	2024.11.11	2025.05.30	100%		
13	69区桩基施工	/	/	2025.05.27	2025.05.28	20%		
14	72区桩基施工	/	/	2025.05.31	2025.06.18	100%		
15	73区桩基施工	/	/	2025.05.27	2025.05.28	20%		
16	74区桩基施工	/	/	2024.12.13	2025.05.28	100%		
17	97区桩基施工	/	/	2025.05.15	2025.06.09	100%		
18	111区桩基施工	/	/	2025.05.27	2025.06.09	100%		
19	升压站设备基础桩基施工	/	/	2025.06.24	2025.06.25	3%		

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量/总量）	本月实际完成（完成量/总量）	权值
1	2区桩基施工	/	/	2025.05.25	/	100%		
2	5区桩基施工	/	/	2025.06.10	/	100%		
3	10区桩基施工	/	/	2025.06.17	/	100%		
4	14区桩基施工	/	/	2025.06.15	/	100%		
5	69区桩基施工	/	/	2025.05.27	/	100%		
6	73区桩基施工	/	/	2025.05.27	/	100%		
7	升压站设备基础桩基施工	/	/	2025.06.24	/	100%		

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设 备	电网事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	无	打桩人员 33 人	/	/	2	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	根据工作面合理增加人员及机械，增加塘口改造进度及交付情况，严格控制桩基施工质量，陆续开展各塘口桩基施工；严格控制升压站工程施工质量，完善相关资料及现场质量控制。

安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，增强作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	材料到场进行平行检验；重点部位施工进行旁站；督促施工单位落实质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照要求，安排人员、机具进行施工。
