



正衡监理

监 理 月 报

工程名称：天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目

第 10 期

（2025 年 7 月 1 日---2025 年 7 月 31 日）

提交部门：监理项目部

编 制：朱健康

签 发：高立标

日 期：2024. 7. 31

监 理 月 报

工程名称：天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目

月次 10 次

月报开始时间 2025 年 7 月 1 日 结束日期 2025 年 7 月 31 日

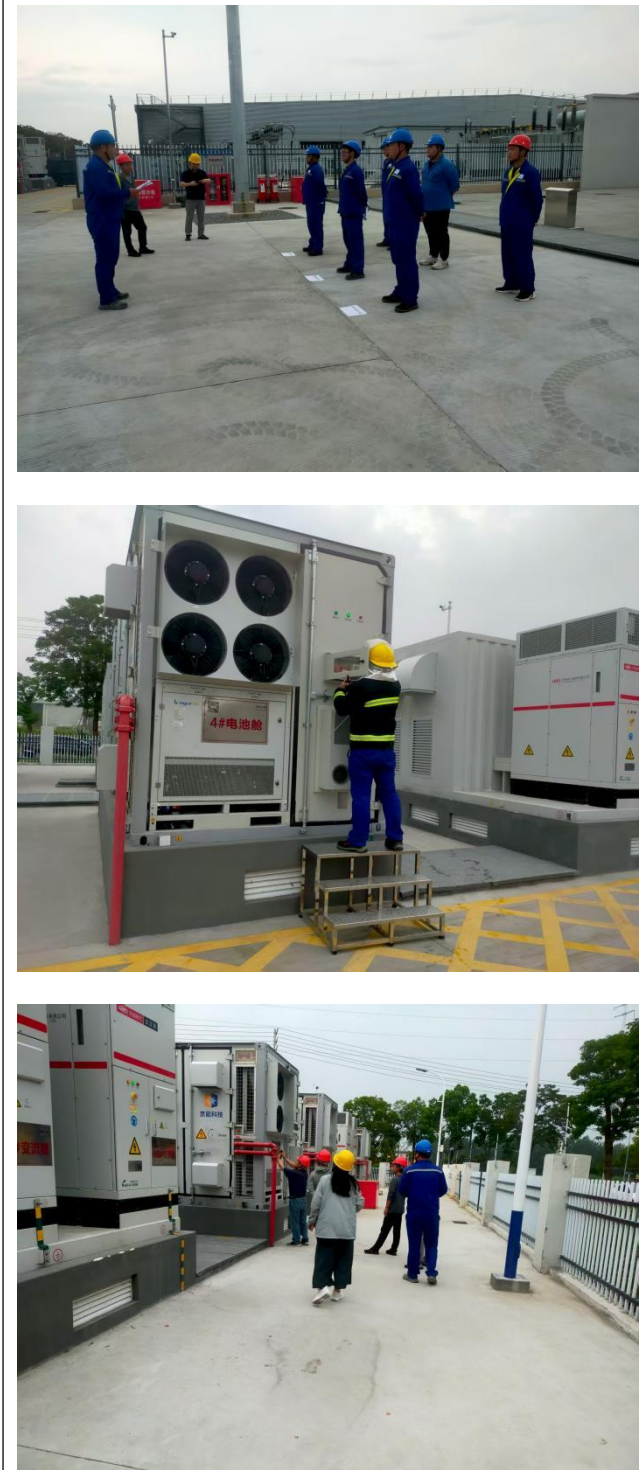
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目		影像	4 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划

进度		截止 2025.7.31 本项目共计 26 个设备基础，包括电池舱和 PCS 舱，基础浇筑全部完成，电缆沟砌筑完成，设备全部吊装完成，电气施工完成，与 12.27 并网成功，场地硬化完成，围墙砌筑完成，防爆墙砌筑完成，真石漆喷涂完成，围栏、大门安装完成，路灯、监控安装完成，设备爬梯完成，消缺项整改基本完成。竣工图纸已出。性能试验全部完成。 土建资料整理和电气资料整理基本完成，由总包负责整理归档。	下个月计划安排： 由京能公司安排竣工验收。
-----------	--	--	-------------------------------------

			
	设计交付进度	施工图纸到项目部	电气图纸已进行图审和交底
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	已完成	
	设计交底	已完成	
	方案审查	已审查	督促施工单位按方案执行
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工

			进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位 认真落实	监督施工单位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	土方开挖、混 填、垫层浇筑、 钢筋绑扎、支 模、浇筑等施工 质量符合要求	按规范和设计 要求施工
	主要原材料质量	设备外观检查 合格，到货检 合格；需送检材料 及时送检	对主要材料进 行检查，已进行 材料报验，并见 证取样送检，材 料送检报告已 上报监理部
	构（配）件质量	进场材料质量 合格	把控好进场材 料质量关
	设备质量	设备质量合格	已进行材料报 验
	质量验评情况	工序施工基本 符合要求	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/

	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
1	基础浇筑							
2	接地环网焊接							
3	电缆沟砌筑							
4	设备吊装							
5	并网					12.27 已并网		
6								
7								
8								
9								
10								

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	下月计划完成量	备注
1	基础浇筑				
2	接地环网				
3	设备吊装				
4	电缆敷设				
5	电气接				

	线、调试				
6	并网				

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	划文件（份）	人数	分包队	分包队	系统外	系统外
伤	备	故			伍数量	伍人数	包队伍	队伍人
							数量	数
无	无	无		2 人	/	/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，加大开发力度，增加施工户数	要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。安全检查 2 次	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。安全隐患排查二次	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及土建规范要求施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理		对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单

物资供应	协助总包单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照工完场清的原则，不浪费材料
------	--	-----------------------

常州正衡电力工程监理有限公司

天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目监理部

2025 年 7 月 31 日
