

ZHJL-ZXYFGH-JLYB-20250530

监 理 月 报

宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目 (F 地块、G 地块、
H 地块)

2025 年 05 月 第三期

总监理工程师:

戚平

常州正衡电力工程监理有限公司

宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目 (F 地块、G 地块、H 地块)

分布式光伏发电项目监理部

2025 年 05 月 30 日

监 理 月 报

工程名称: 宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目 (F 地块、G 地块、H 地块)

2025 年 05 月 第三次 月报

开始时间 2025 年 03 月 10 日 结束日期 2025 年 07 月 07 日 施工工期为 120 天


监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目 (F 地块、G 地块、H 地块)	宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目 (F 地块、G 地块、H 地块)	影像	12 张	

二、监理重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划	施工影相
	1、本月 F 地块支墩摆放、支架安装完成，组件安装完成 100%， 2、战 H 地块支墩摆放、支架安装、桥架和直流线敷设完成，组件安装完成 100%，交流电缆线敷设完成 50%。 3、G 地块条形支墩材料进场。	1、F 地块 1#, 2#楼桥架安装完成、接地焊接完成。 2、H 地块交流电缆线敷设完成，并网柜安装完成，环境检测仪安装完成。 3、G 地块对防水卷材，支墩和支架进行吊装完成，支架安装完成。	

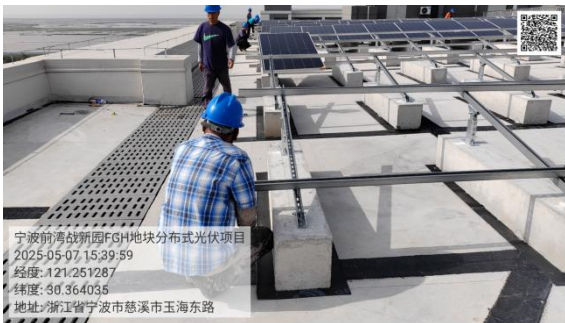

宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目
2025-05-07 15:39:59
经度: 121.251267
纬度: 30.364035
地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路



宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目
2025-05-07 15:48:30
经度: 121.251258
纬度: 30.3643
地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路



宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目
2025-05-17 10:21:30
经度: 121.252189
纬度: 30.365626
地址: 浙江省宁波市慈溪市



宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目
2025-05-17 10:11:09
经度: 121.252682
纬度: 30.365725
地址: 浙江省宁波市慈溪市



宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目
2025-05-18 16:05:04
经度: 121.256883
纬度: 30.364349
地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路




宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目
2025-05-18 16:24:09
经度: 121.256957
纬度: 30.364509
地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路



宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目
时间: 2025-05-28 15:19:57
经度: 121.251966
纬度: 30.365774
地址: 浙江省宁波市慈溪市



宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目
时间: 2025-05-27 09:11:33
经度: 121.251712
纬度: 30.365264
地址: 浙江省宁波市慈溪市

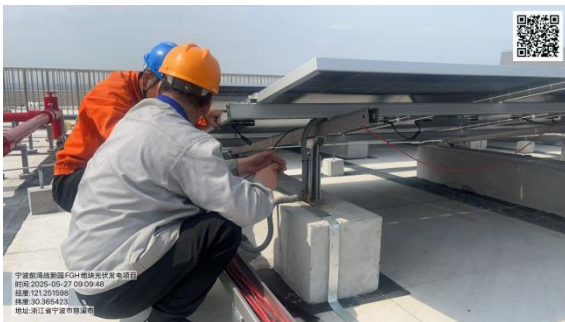

宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目
时间: 2025-05-27 09:09:48
经度: 121.251966
纬度: 30.365433
地址: 浙江省宁波市慈溪市



宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目
时间: 2025-05-26 15:41:12
经度: 121.251643
纬度: 30.365491
地址: 浙江省宁波市慈溪市



进度			
	设计交付进度	图纸已交付	图纸已交付
	质量体系运作情况	质量体系健全运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	图纸变更联系单进行中
	设计交底	设计交底完成。	
	方案审查	施工专项方案已审核待批准后交付实施。	督促施工单位按报审资料组织施工。
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训交底。	督促施工单位对进场新员工进行安全检查
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实较彻底，已要求施工单位认真执行	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	光伏电缆线敷设，逆变器安装	光伏组件第三方检测单位检测完成，符合要求。
	主要原材料质量	光伏电缆线逆变器品牌及规格符合设计要求，材料进场时有完整的质量证明文件	对主要材料光伏电缆线经第三方单位进行检测。
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	符合设计和外观要求	进场报验
	质量验评情况	工序施工质量符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	截止目前累计完成工程量约404.6万元，占比约37.5%。截止目前总投资合计约676.0(设备材料)30.0（劳务机械）=706.0万元，约占总合同价的65.5%(合同价为1079.89万元)	完成全部投资的65.5%。

	款项支付情况	已完成全部农名工工资的支付。	无
	预算外签证	无	无
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、 本月进度情况

宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块） 进度百分比			
序号	名称	总预算金额（万元）	完工百分比
1	桥架	8	20%
2	接地扁铁	5	40%
3	直流电缆线	15	35%
4	交流电缆线	178	21%
注：该项目已于 2025 年 03 月 04 日开工，目前施工进度完成约 55%。			

四、 安全文明施工情况

事故（起） 无			编制安全策 划文件（份）	施 工 人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械 设备	电网 事故			分包队伍 数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队伍 人数
无	无	无	1	15 人	无	无	无	无

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	本月主要对 H 地块、F 地块光伏组件进行安装，光伏桥架安装，接地扁铁焊接，光伏直流线敷设，交流电缆线敷设。	要求施工单位合理安排施工,对 G 地块进行支架安装，组件安装、接地扁铁焊接。

安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	过程检验在安装过程中，对每一道工序进行检验，组件安装完成后进行组件质量检验，直流电敷设完成进行检查，及时发现和纠正质量问题	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求安装
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程进度款及时进行评估	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助施工单位做好物资进场工作，督促施工单位做好物资保管使用工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照施工具体计划的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）监理部

2025 年 05 月 30 日
