



正衡监理 常州正衡电力工程监理有限公司

监 理 月 报

工程名称： 德必福宠物食品（滁州）有限公司0.78MW屋顶分布式光伏发电项目

2025年 04 月 第 1 期

(2025 年03月27 日 至 2025年04月 30日)

项目监理部（章）：

总监理工程师：孟飞

报告日期：2025 年 04月 30 日



监 理 月 报

一、安全情况：

1. 开工工期35天；安全生产35天。本月项目施工安全生产情况总体平稳，未发生不安全事件。
2. 监督施工单位对进场施工人员每日班前安全交底会。
3. 施工临时用电配电箱使用三级配电箱，并按要求做到“一机一闸一漏”，定期检查箱内电器开关件的安全有效性。
4. 对现场施工工人进行专项检查，发现的超龄人员予以清退，不得入场作业。
5. 对施工区高空作业周边主要进出口装设安全标识标牌。要求施工吊装区域设置警示牌、警戒线、做到安全有序。
6. 施工区域内杂物、纸箱、托盘进行有须的堆放，保持周边道路卫生、清理施工现场保持“工完料尽场地清”。
7. 组织施工管理人员对业主单位文件进行安全教育学习，监督施工单位对现场所有施工人员进行三级安全教育，学习公司相关安全制度、相关文件，事故案例等知识。
8. 吊装作业手续齐全、特种作业人员证件齐全有效。

事故（起）			编制安全	施工	安全分包情况			
人身	机械	电网	策划文件	人数	分包队	分包队	系统外	系统外
重伤	设备	事故	（份）		伍数量	伍人数	包队伍数量	队伍人数
无	无	无		14人	/	/	/	/

二、本月进度情况：

序号	工作名称	开始时间	完成时间	备注
1	水泥墩摆放	2025年4月2日	2025年4月5日	已完成100%
2	水泥屋面支架安装	2025年4月7日	2023年4月30日	已完成90%
3	电缆沟埋管及浇筑	2025年4月12日	2025年4月14日	已完成100%
4	彩钢瓦屋面夹具安装	2025年4月19日	2025年4月30日	已完成85%
5	彩钢瓦屋面导轨安装	2025年4月29日	2025年4月30日	已完成25%
6	水泥屋面桥架安装	2025年4月25日	2025年4月30日	已完成70%
7	逆变器安装	2025年4月26日	2025年4月30日	逆变器支架帽未安装
8	彩钢瓦屋面护栏安	2025年4月20日 ₂	2025年4月30日	已完成100%



	装			
9	彩钢瓦屋面运维通道导轨安装	2025年4月21日	2025年4月30日	已完成15%

三、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	1号楼水泥墩摆放完成100%。支架安装完成90%。彩钢瓦挖煤屋面夹具、导轨安装完成15%，桥架安装完成50%。 2号屋面水泥墩摆放完成100%，支架安装完成100%，桥架安装完成100%，接地网完成90%，逆变器安装完成100%，	1号楼组件安装完成100%，交流电缆敷设完成100%，接地环网安装完成100%， 2号组件安装完成100%，直流电缆敷设完成100%，接地扁铁安装完成100%。设备安装完成100%
安全管理	督促施工单位对新进场施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。每日施式班会落实到位。施工手续齐全，特种作业证人证合一，主要机械操作人员证件齐全有效，现场安全文明施工基本正常，临时用电基本正常。本月安全基本可控。	对进场施工人员进行安全教育培训，现场安全围栏等防护措施到位，做好现场安全管理工作，对发现的安全问题整改到位。对已带电设备做警示标识，施工人员保持安全距离作业。
质量管理	组件支架安装牢固，导轨螺栓拧紧；直流电缆敷设过程中无损坏，转弯处做好保护措施；现场施工过程影相资料全。督促施工单位做好质量通病防治措施及落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照设计施工图纸、施工工艺、规范要求施工。巡视检查现场施工过程质量控制。
技术管理	对施工人员进行技术交底，检查并复核是否按照施工方案及技术交底内容进行施工。进场材料设备及时提供厂家质检报告和厂家资质。	对现场安装技术进行技术支持和自检，与设计及规范要求对应
造价管理	无	无
物资供应	夹具、导轨、桥架、直流电缆、逆变器全部到货，其余材料采购中。	无

四、施工质量问题情况：



1. 1楼与屋面主其华片安装顺序与图纸不符，要求整改。
2. 电缆桥架与梁埋挂外未做防腐
3. 1楼与屋面主其安装紧固未到位已要求整改。

五、监理工作情况


1. 主其、导轨吊装旁站。
2. 逆变器、排地扁铁吊装旁站。
3. 主其平行检验
4. 导轨平行检验
5. 桥架平行检验
6. 直流电缆敷设平行检验。
7. 逆变器安装平行检验。
8. 每周安全质量监理检查。
9. 日常巡视检查。

七、其他事宜：

1. 无。

八、工程形象进度照片

业主单位领导工作检查



主其进场卸货



水泥堆分散


主其组装



施工材料吊运



班前会

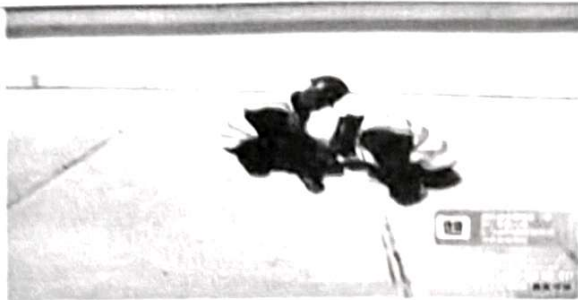

定位放线




水泥墩摆放




立柱安装检查



立柱安装




斜梁安装



接地扁钢加工




吊车进场检查相关证件

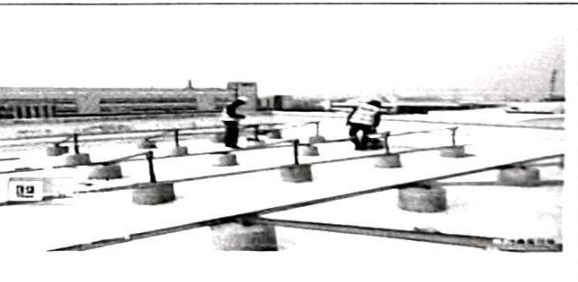


檩条安装



电缆沟破路



电缆沟开挖



中组片安装




光伏组件




逆变器支架安装



支架标识安装




安全培训

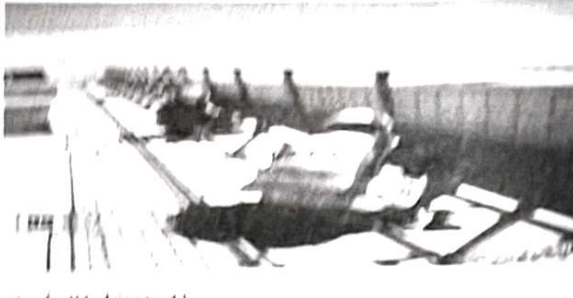

安全防护安装



桥架安装



桥架安装

常州正衡电力工程监理有限公司

德必福宠物食品（滁州）有限公司0.78MW屋顶分布式光伏发电项目

2025 年 04月 30日
