

编号：SKQN-FDGF-JLYB-002

监 理 月 报

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

2025 年 05 月 第 02 期

监理项目部（章）：

总监理工程师：子祥浩



报告日期：2025 年 05 月 26 日

监理月报






一、本月工程实施情况（形象进度表、照片）

1、形象进度表

序号	工作名称	开始时间	完成时间	备注
1	项目启动会	2025 年 03 月 27 日	2025 年 03 月 27 日	
2	支架基础摆放	2025 年 04 月 04 日	2025 年 04 月 05 日	
3	支架安装	2025 年 04 月 10 日	2025 年 04 月 21 日	
4	组件安装	2025 年 04 月 17 日	2025 年 04 月 23 日	
5	铝合金桥架敷设	2025 年 04 月 15 日	2025 年 04 月 17 日	
6	光伏线敷设	2025 年 04 月 20 日	2025 年 05 月 12 日	
7	交流电缆敷设	2025 年 05 月 12 日	2025 年 05 月 16 日	
8	防雷接地敷设	2025 年 04 月 19 日	2025 年 05 月 13 日	
9	并网柜安装	2025 年 04 月 24 日	2025 年 04 月 24 日	
10	逆变器安装	2025 年 05 月 02 日	2025 年 05 月 17 日	
11	并网发电	2025 年 05 月 28 日	2025 年 05 月 28 日	

2、现场进度形象照片



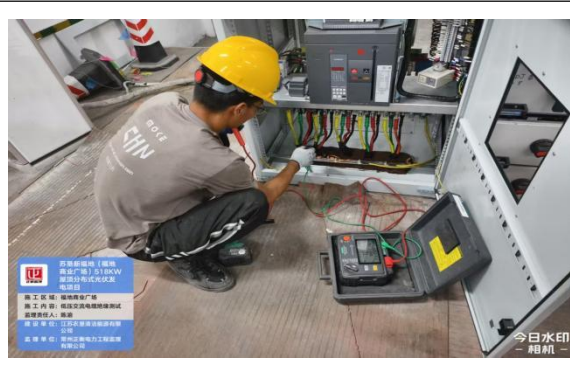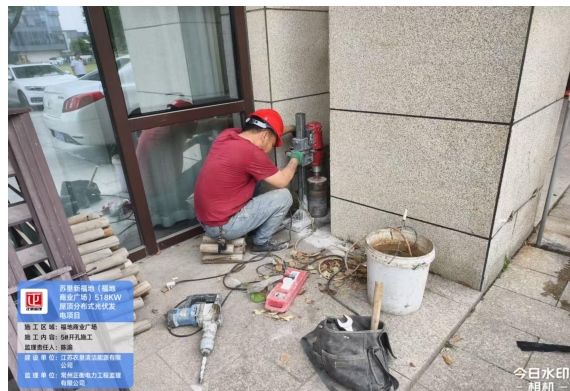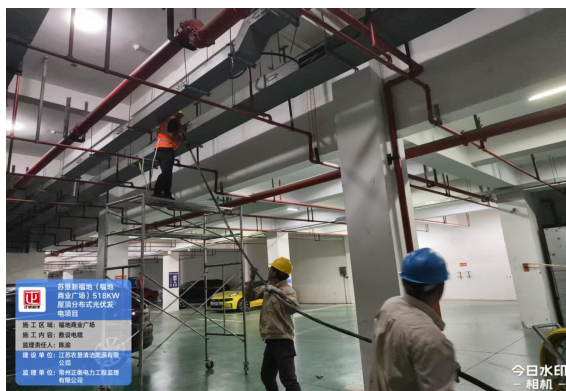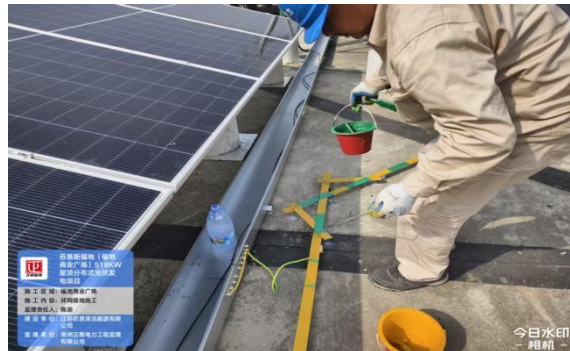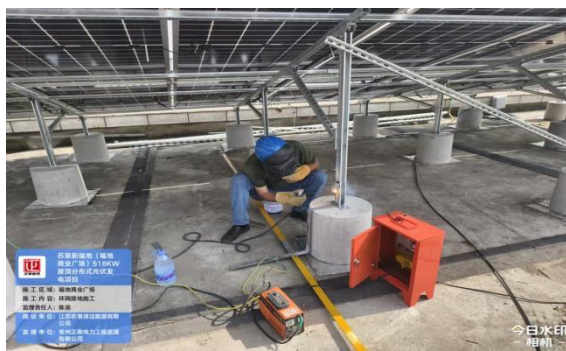

二、本月监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

- 1) 组织召开监理例会；
- 2) 下发 3 份监理通知单（已整改）、1 份监理联系单；
- 3) 平行检查支架安装、组件安装、电缆敷设、接地敷设、逆变器安装、并网柜安装等；
- 4) 巡视检查现场施工情况；
- 5) 检查特种机械操作人员证件；

三、工程存在问题及建议

由于备案出现问题，现以重新备案，影响并网进程。

四、下月监理工作重点

预计在 5 月 28 号并网，为全容量并网。准备相关工作。

常州正衡电力工程监理有限公司

苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

2025 年 05 月 26 日
