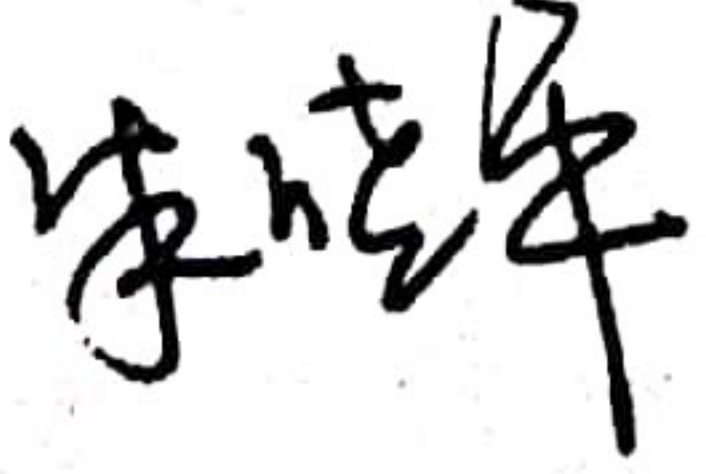



工程施工强制性条文执行检查表

编号: CZZH-DQ-QTJC-010

工程名称	蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目		
单位(子单位) 工程名称	电气装置安装工程	分部(子分部) 工程名称	主变压器带电运行
施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	项目经理	陈明毅
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010			
1	4.12.1 变压器、电抗器在试运行前,应进行全面检查,确认其符合运行条件时,方可投入试运行。 检查项目应包含以下内容和要求: 3 事故排油设施应完好,消防设施齐全。	已执行	施工记录
2	5 变压器本体应两点接地。中性点接地引出后,应有两根接地引线与主接地网的不同干线连接,其规格应满足设计要求。	已执行	接地检查记录
3	6 铁芯和夹件的接地引出套管、套管的末屏接地应符合产品技术文件的要求;电流互感器备用二次线圈端子应短路接地,套管顶部结构的接触及密封应符合产品技术文件的要求。	已执行	接地检查记录
4	4.12.2 变压器、电抗器试运行时应按下列规定项目进行检查: 1 中性点接地系统的变压器,在进行冲击合闸时,其中性点必须接地。	已执行	接地检查记录
5			
6			
项目总工: 		专业监理工程师: 	
2020年07月12日		2020年07月12日	
