


### 桩基工程检查记录表

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号：1311-CZZH-JCJL-018

|                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 单位/子单位工程                                                                                                                                                                               | 光伏区土建工程                                  | 分部工程                                             | 4#箱逆变桩基基础       |
| 检查依据                                                                                                                                                                                   | 《电力建设施工质量验收规程 第1部分 土建工程》DL/T 5210.1-2021 | 检查日期                                             | 2025 年 5 月 20 日 |
| 序号                                                                                                                                                                                     | 检查项目                                     | 标准或要求                                            | 检查结果            |
| 1                                                                                                                                                                                      | 承载力                                      | 管桩竖向抗压承载力最大 220KN                                | 符合设计要求          |
| 2                                                                                                                                                                                      | 桩身完整性                                    | 小应变试验                                            | 符合设计要求          |
| 2                                                                                                                                                                                      | 原材料检验                                    | 成品桩应有出厂合格证，并进行进场后的外观检验，表面应平整，颜色均匀，蜂窝面积小于总面积 0.5% | 合格              |
| 3                                                                                                                                                                                      | 桩位                                       | 设计要求中心位移偏差为 $\pm 30\text{mm}$                    | 合格              |
| 4                                                                                                                                                                                      | 桩顶标高                                     | 桩顶标高偏差 $\pm 50\text{mm}$                         | 合格              |
| 5                                                                                                                                                                                      | 桩身垂直度                                    | 垂直度偏差 $\leq 1.0\%$                               | 合格              |
| <p>结论：</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">符合要求</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">             监理人员（签字）： <u>朱敏全</u>      日 期： <u>2025.5.20</u> </p> |                                          |                                                  |                 |



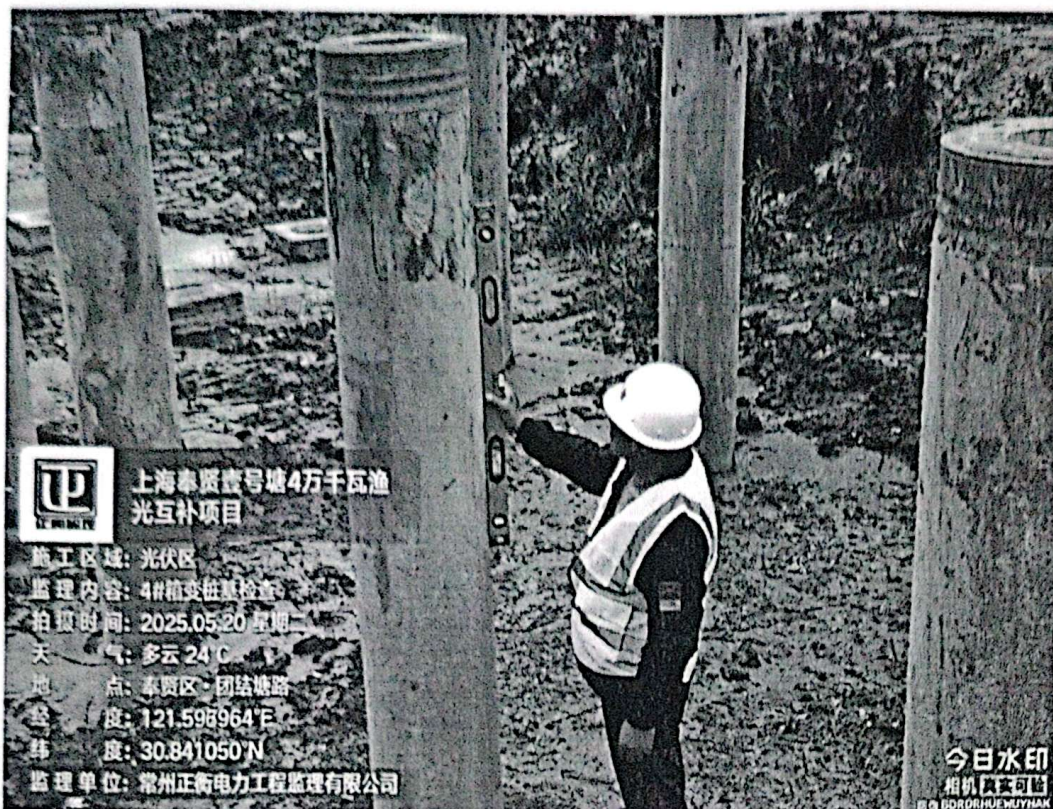

上海奉贤黄号塘4万千瓦渔  
光互补项目

施工区域: 光伏区

监理内容: 4#箱变桩基检查

拍摄时间: 2025.05.20 星期二

天气: 多云 24°C

地点: 奉贤区-团结塘路

经度: 121.598964°E

纬度: 30.841050°N

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印

相机[1111]

水印 B0D0R1H0E0W0Y0M0K



扫描全能王 创建
