

## 旁站监理记录表

工程名称：广东江门凌志屋顶分布式光伏发电项目 编号：GF-JMLZ-01

日期及气候：2015.3.24 晴 工程地点：凌志厂区

旁站监理的部位或工序：主电缆沟线缆管和煤气管道交叉敷设

旁站监理开始时间：9:00: 10: 30 旁站监理结束时间：10: 46

施工情况：施工位置见施工方隐蔽工程报审所标的液化气管道位置。

施工人员 4 人，施工负责 1 人，准备好电缆预埋管，分配好人员的站位，首先把 5 根 Φ110 和 1 根 Φ32 的 PVC 管从煤气管道的下面穿过，两者之间隔 200mm，填细沙土 100mm 后在两者之间放长 900mm 宽 550mm 厚 40mm 的钢板 1 块后再填细沙土直至把液化气管道掩埋至 300mm 夯实后再垫泥土夯实。（如图铁隔板在黑色的液化气管道下面的细沙土里隐隐可见图 2）。

监理情况：

监理现场进行旁站，施工人员在施工过程中按图施工，人工回填仔细认真，听从指挥，施工过程符合安全质量技术要求。


发现问题：

处理意见：

备注：



(图 1)



(图 2)

承包单位：江门电力设计院有限公司

项目经理部：江门凌志光伏发电项目

质检员（签字）：钟世章

2015年3月24日

监理单位：新亚国际电力有限公司

项目监理机构：新亚国际电力有限公司凌志项目部

旁站监理人员（签字）：齐华生

2015年3月24日

## 旁站监理记录表

工程名称：广东江门凌志屋顶分布式光伏发电项目 编号：GF-JMLZ-02

日期及气候：2015.3.26 晴 工程地点：凌志厂区

旁站监理的部位或工序：主电缆沟线缆管回填

旁站监理开始时间：9:00 旁站监理结束时间：17:30

### 施工情况：

施工人员 10 人，施工负责 1 人，准备好回填所需材料：细沙土，电缆预埋管，和施工工具：羊镐、铁锹等，首先主电缆沟底部铺细沙土 100mm 而后把 5 根  $\varnothing 110$  和 1 根  $\varnothing 32$  的 PVC 管（设计过道部分用镀锌管）敷设上去，之后在 PVC 管上回填细沙土夯实后回填泥土夯实。（详细见备注图）


### 监理情况：

监理现场进行旁站，施工人员在施工过程中按要求施工，人工回填很辛苦，施工过程符合安全质量技术要求。

### 发现问题：

### 处理意见：

### 备注：

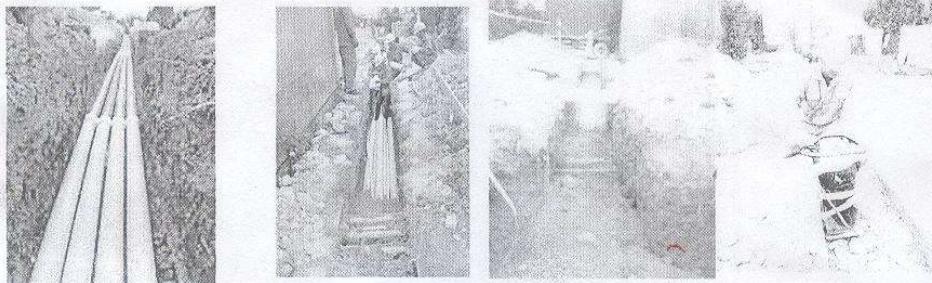

承包单位：江门电力设计院有限公司

项目经理部：江门凌志光伏发电项目

质检员（签字）：钟世章

2015 年 3 月 26 日

监理单位：常州正衡电力工程有限公司

项目监理机构：常州正衡电力工程有限公司凌志项目部

旁站监理人员（签字）：高帮军

2015 年 3 月 26 日

## 旁站监理记录表

工程名称: 广东江门凌志屋顶分布式光伏发电项目 编号: GF-JMLZ-003

日期及气候: 2015. 4.14 上午 晴 工程地点: 仓 1 屋顶屋面

旁站监理的部位或工序: 防雷接地扁铁的焊接

旁站监理开始时间: 9: 30 旁站监理结束时间: 11: 30

### 施工情况:

由广东火电项目安全负责人李红辉到凌志安全科开具《动火证》，凌志公司指派安全消防员到现场踏勘确认后在现场做施工技术交底，安全负责人李红辉落实安全措施，核对焊接人员资质，准备焊接器具，进行人员分工。然后开始焊接，焊接施工 2 人，焊接步骤: 1) 检查焊接电源的等级是否和焊机相符 2) 检查电源线是否安全可靠。 3) 带好安全带，准备好绝缘隔板、消防灭火器 4) 把要焊接扁铁位置放好，另一人配合焊接。

### 监理情况:

- 1) 监理现场进行旁站，现场情况如下:
- 2) 接地扁铁和原建筑的接地圆钢焊接点符合技术要求；
- 3) 扁铁和扁铁之间的联接处焊接充分；
- 4) 各焊接点经过涂漆防锈处理；
- 5) 防阻燃安全垫符合安全要求；
- 6) 焊接现场见备注图片；


### 发现问题:

接地扁铁和原建筑接地焊接面积和长度不够规范。

### 处理意见:

广东火电派专人将接地扁铁焊接技术交底，直到符合规范。

### 备注:



承包单位: 江门电力设计有限公司

项目经理部: 江门凌志光伏发电项

质检员(签字): 钟世章

2015年4月14日

监理单位: 广东正衡电力有限公司


项目监理机构: 广东正衡电力工程有限公司项目

旁站监理人员(签字): 李红辉

2015年4月14日

## 旁站监理记录表

工程名称：广东江门凌志屋顶分布式光伏发电项目 编号：GF-JMLZ-004

日期及气候：2015.4.27 上午 晴	工程地点：仓3 屋顶屋面
旁站监理的部位或工序：组串开路电压的检测	
旁站监理开始时间：9: 30	旁站监理结束时间：11: 30
<b>施工情况：</b> 由广东火电项目专业电气人员检测仓3 屋顶屋面组串的开路电压，检测人员2人，检测工具胜利牌电子万用表，检测步骤：1) 把每个组串的正负极线找准后二根线绑扎在一起头分开做好标记；2) 从 C01--01 开始测量到 C3-01;3) 用电子万用表逐一测量每个组串的正负极电压，万用表正极接组串正极为正向电压，负表笔接正极，正表笔接组串负极为反向电压；4) 所有测试电压值均在 640V 左右；（详见施工检测记录）	
<b>监理情况：</b> 监理现场进行旁站，现场情况如下：1) 检测人员和报审资料相符； 2) 测量方法及步骤符合测量技术要求； 3) 所测数据真实可信；	
<b>发现问题：</b> 阴天和晴天辐照度差别大，测出的电压差别也大；	
<b>处理意见：</b> 施工方安排测量时在天晴测量比较好。	
<b>备注：</b>  	
承包单位： 项目经理部： 质检员（签字）： 2015年4月27日	监理单位： 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 2015年4月27日
