



JZLB8

旁站监理记录表

工程名称: 邢台西里村30MW光伏电站(一期20MW)

编号:

日期及气候: 2016年9月8日 晴	工程地点: 光伏区(西山)
旁站监理的部位或工序: 高压电缆头制作	
旁站监理开始时间: 8:25	旁站监理结束时间: 11:10
施工情况: 施工人员到达现场, 工器具准备完毕, 现场施工负责人施工交底后, 开始施工。	
监理情况: 检查施工人员资质, 工器具合格证, 操作本提醒工作人员, 注意铝铠层编织线与屏蔽层编织线应互接, 切勿短路绝缘层。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
 日期: 2016年9月8日	 监理项目部:  旁站监理人员:  日期: 2016年9月8日

注: 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。

JZLB8

旁站监理记录表

工程名称: 邢台西董村10kV光伏发电项目(一期20MW)

编号:

日期及气候: 2016年8月24日 晴	工程地点: 西董村光伏区
旁站监理的部位或工序: 4#、5#箱变基础	
旁站监理开始时间: 上午 8:00	旁站监理结束时间: 下午 13:45
施工情况: 采用商品混凝土C25, 石子5人, 模板工2人, 主筋绑扎人员1人, 参加旁站, 顺利浇筑, 浇筑混凝土20m³, 振捣棒2台。	
监理情况: 施工前检查施工准备情况, 核对混凝土配合比资料, 检查人员到岗情况, 符合事前安排, 满足要求, 检查模板加固支撑情况, 满足要求, 测得坍落度为: $180 \pm 20 (165)$。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工项目部: 张立书 安装施工: 胡洋 质检员: 胡洋 日期: 2016年8月24日	监理单位: 林玉峰 旁站监理人员: 林玉峰 日期: 2016年8月24日

注 本表由监理单位填写, 监理单位存____份。

旁站监理记录表

编号:

工程名称: 荆门市掇刀区30万吨/年复合肥项目C-区20#楼	
日期及气候: 2016年4月22日 阴	工程地点: 西头, 兴山区.
旁站监理的部位或工序: 6#、7# 搅拌站 浇筑基础.	
旁站监理开始时间: 上午 8:25	旁站监理结束时间: 下午 16:22
施工情况: 项目部施工人数 20 人, 项目经理、施工员、质检员均在现场。 机械运行正常, 振动棒 2 台, 采用商品混凝土 C25。	
监理情况: 检查商品混凝土混凝土配合比, 符合要求。 检测混凝土坍落度, 170, 符合要求。 检查模板支撑牢固情况, 符合要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工项目部: 张占杰 质检员: 胡洋 日期: 2016 年 4 月 22 日	监理单位: 荆门市工程管理有限公司 旁站监理人员: 林云锋 日期: 2016 年 4 月 22 日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。

JZLB8

旁站监理记录表

工程名称: 开平西董村500kV变电站升压站工程(一期2016.10.10)		编号:
日期及气候: 2016年5月25日	工程地点: 综合站	
旁站监理的部位或工序: 500kV室外高压断路器基础平面浇筑		
旁站监理开始时间:	旁站监理结束时间:	
施工情况: 1. 采用商品混凝土C30, 运输车 4 辆, 保证混凝土运输距离要求。 2. 人员安排: 石工 6 人, 钢筋工 2 人, 模板工 2 人, 施工班长 1 人, 技术员 1 人, 质检员 1 人, 安全员 1 人, 旁站监理 1 人。 3. 机械准备: 混凝土泵车 1 辆, 振捣棒 2 根, 满足混凝土浇筑要求。 4. 材料准备: 钢筋 10 吨, 模板 10 平方米, 满足混凝土浇筑要求。 5. 检查人员到岗情况符合旁站要求, 满足要求。 6. 检查模板加固情况符合旁站要求, 满足要求, 加固度为 175mm。 7. 检查混凝土浇筑高度, 符合旁站要求, 并按要求浇筑同条件养护试块。		
发现问题: 无		
处理意见: 无		
备注: 无		
施工项目部: 河北三建建筑工程有限公司 质检员: 胡洋 日期: 2016年5月25日		监理单位: 河北三建建筑工程有限公司 旁站监理人员: 林书峰 日期: 2016年5月25日

注 本表由监理单位填写, 监理单位存 份。

JZLB8

旁站监理记录表

工程名称: 开阳县农村电网30kV及以下中压电网工程(一期)2016(1) 编号:

日期及气候: 2016.5.24 晴	工程地点: 西山村头光伏区
旁站监理的部位或工序: 19#箱变基础。	
旁站监理开始时间: 13:00	旁站监理结束时间: 16:50
施工情况: 1. 采用商品混凝土C25。 2. 人员安排: 砼工6人, 模板工2人, 施工班长、质检员1人参加旁站, 顺序浇筑。 3. 机械设备: 准备就绪, 振捣棒等, 满足浇筑质量。 4. 检查人员到岗情况: 符合事前安排, 满足要求。 5. 检查模板加固情况: 满足要求。 6. 检查混凝土浇筑过程中的振捣质量及在侧面无漏浆情况。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工项目部: 河北建投新能源工程有限公司 质 检 员: 胡洋 日期: 2016年5月24日	监理单位: 河北建投新能源工程有限公司 旁站监理人员: 林玉峰 日期: 2016年5月25日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。

JZLB8

旁站监理记录表

工程名称: 邢台市董村金盛光伏项目一期(光伏区)

编号:

日期及气候: 2016年5月5日 晴	工程地点: 东山头·光伏区
旁站监理的部位或工序: 1#井·钢管桩施工	
旁站监理开始时间: 9:45	旁站监理结束时间: 11:50
施工情况: 项目部人员已到位, 采用商品混凝土施工, 现场有2名工人, 1名质检员, 1名安全员, 能保证混凝土施工质量。 振捣棒2台。	
监理情况: 检查, 商品混凝土配比资料, 符合要求。 检查, 人员到岗情况, 符合事前安排, 满足要求。 抽检, 坍落度为: 175。 检查, 模板未支, 支撑情况, 满足要求。	
发现问题:	
无	
处理意见:	
无	
备注:	
 日期: 2016年5月5日	监理项目部: 张永强 旁站监理人员: 杜玉强 日期: 2016年5月5日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存一份。

JZLB8

旁站监理记录表

工程名称: 邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目 (一期 20 兆瓦)

编号: 13

日期及气候: 晴, 2016.5.3.	工程地点: 石马厂村
旁站监理的部位或工序: 16#塔基	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 12:30
施工情况: 浇筑方案: ☐有 ☒无 ☐可行 ☐不可行 人员组织到岗情况: 质检员 ☒是 ☐否、施工员 ☒是 ☐否、安全员 ☒是 ☐否、电工 ☐是 ☐否、振捣工 ☒是 ☐否、其他配合人员 ☒是 ☐否。 机械准备情况: 振动棒: ☒ 平板振动器: ☒ 商品混凝土供应商资质: ☒有 ☐无; 商品混凝土合格证: ☒有 ☐无; 混凝土配合比单号: _____; 混凝土强度等级: C 25 设计坍落度 (mm): _____ 监理情况: 1. 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间 ☒符合要求 ☐不符合要求 2. 施工缝处理 ☐未按方案处理 ☒按方案处理 ☐未接浆 ☐已接浆 3. 混凝土质量 ☐现场加水 ☒和易性好 ☐和易性差 ☒泌水性符合要求 ☐泌水性不符合要求 ☐有离析现象 ☒无离析现象 4. 振捣方式 ☐间距过大 ☐振捣时间过短 ☐振捣时间过长 ☒振捣时间适宜 ☐有漏振现象 ☐无漏振现象 ☐有爆模现象 5. 钢筋踩踏情况 ☐有专人负责, 修复较好 ☐无专人负责, 不加修复 ☐梁板上皮钢筋保护厚度实测 6. 收光质量 ☐时间掌握过短 ☐时间掌握过长 ☒时间掌握适宜 ☐收光时加水 ☐收光时撒干水泥 ☐养护工作到位 ☐养护工作不到位 7. 安全措施 ☒有安全巡视 ☐无安全巡视 ☐安全措施落实情况好 ☐安全措施落实情况差 现场塌落度为 189mm	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
施工项目部: _____ 质检员: 张利军 日期: 2016年5月3日	监理项目部: _____ 旁站监理人员: 林玉峰 日期: 2016年5月3日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。

JZLB8

旁站监理记录表

工程名称: 邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目 (一期 20 兆瓦)

编号: 12

日期及气候: 晴, 2016.5.2	工程地点: 石马丁村
旁站监理的部位或工序: 外线 16# 塔基	
旁站监理开始时间: 10:30	旁站监理结束时间: 14:40
施工情况: 浇筑方案: ☐有 ☒无 ☐可行 ☐不可行 人员组织到岗情况: 质检员 ☐是 ☐否、施工员 ☐是 ☐否、安全员 ☐是 ☐否、电工 ☐是 ☐否、振捣工 ☒是 ☐否、其他配合人员 ☒是 ☐否。 机械准备情况: 振动棒: ☒ 平板振捣器: ☐ 商品混凝土供应商资质: ☒有 ☐无; 商品混凝土合格证: ☐有 ☐无; 混凝土配合比单号: _____; 混凝土强度等级: C 25 设计坍落度 (mm): 180±20	
监理情况: 1. 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间 ☒符合要求 ☐不符合要求 2. 施工缝处理 ☐未按方案处理 ☐按方案处理 ☐未接浆 ☐已接浆 3. 混凝土质量 ☐现场加水 ☐和易性好 ☐和易性差 ☒泌水性符合要求 ☐泌水性不符合要求 ☐有离析现象 ☒无离析现象 4. 振捣方式 ☐间距过大 ☐振捣时间过短 ☐振捣时间过长 ☒振捣时间适宜 ☐有漏振现象 ☐无漏振现象 ☐有爆模现象 5. 钢筋踩踏情况 ☐有专人负责, 修复较好 ☐无专人负责, 不加修复 ☐梁板上皮钢筋保护厚度实测 6. 收光质量 ☐时间掌握过短 ☐时间掌握过长 ☐时间掌握适宜 ☐收光时加水 ☐收光时撒干水泥 ☐养护工作到位 ☐养护工作不到位 7. 安全措施 ☒有安全巡视 ☐无安全巡视 ☐安全措施落实情况好 ☐安全措施落实情况差 现场坍落度为 174mm	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
施工项目部: _____ 质 检 员: 李利平 日 期: 2016 年 5 月 2 日	监理项目部: _____ 旁站监理人员: 林文峰 日 期: 2016 年 5 月 2 日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。

JZLB8

旁站监理记录表

工程名称: 邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目 (一期 20 兆瓦)

编号: 11

日期及气候: 晴 2016.5.1	工程地点: 西山区
旁站监理的部位或工序: 外线 17# 塔基	
旁站监理开始时间: 9:30	旁站监理结束时间: 13:00
施工情况: 浇筑方案: ☐有 ☒无 ☐可行 ☐不可行 人员组织到岗情况: 质检员 ☒是 ☐否、施工员 ☒是 ☐否、安全员 ☒是 ☐否、电工 ☐是 ☐否、振捣工 ☒是 ☐否、其他配合人员 ☐是 ☐否。 机械准备情况: 振动棒: ☒ 平板振动器: ☒ 商品混凝土供应商资质: ☒有 ☐无; 商品混凝土合格证: ☒有 ☐无; 混凝土配合比单号: _____; 混凝土强度等级: C25 设计坍落度 (mm): 160±20	
监理情况: 1. 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间 ☒符合要求 ☐不符合要求 2. 施工缝处理 ☐未按方案处理 ☐按方案处理 ☐未接浆 ☐已接浆 3. 混凝土质量 ☐现场加水 ☒和易性好 ☐和易性差 ☐泌水性符合要求 ☐泌水性不符合要求 ☐有离析现象 ☒无离析现象 4. 振捣方式 ☐间距过大 ☐振捣时间过短 ☐振捣时间过长 ☒振捣时间适宜 ☐有漏振现象 ☐无漏振现象 ☐有爆模现象 5. 钢筋踩踏情况 ☐有专人负责, 修复较好 ☐无专人负责, 不加修复 ☐梁板上皮钢筋保护厚度实测 6. 收光质量 ☐时间掌握过短 ☐时间掌握过长 ☒时间掌握适宜 ☐收光时加水 ☐收光时撒干水泥 ☐养护工作到位 ☐养护工作不到位 7. 安全措施 ☒有安全巡视 ☐无安全巡视 ☐安全措施落实情况好 ☐安全措施落实情况差 现场坍落度为 160mm	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
施工项目部: _____ 质检员: 冯利平 日期: 2016 年 5 月 1 日	监理单位: _____ 旁站监理人员: 林玉峰 日期: 2016 年 5 月 1 日

注 本表由监理单位填写, 监理单位存____份。

JZLB8

旁站监理记录表

工程名称: 邢台西黄村镇30兆瓦光伏发电项目(一期20兆瓦)

编号: 09.

日期及气候: 2016.4.22 晴	工程地点: 西山区.
旁站监理的部位或工序: 外线19#塔基.	
旁站监理开始时间: 9:40.	旁站监理结束时间: 13:00.
施工情况: 浇筑方案: ☒有 ☐无 ☐可行 ☐不可行 人员组织到岗情况: 质检员 ☒是 ☐否、施工员 ☒是 ☐否、安全员 ☒是 ☐否、电工 ☐是 ☐否、振捣工 ☒是 ☐否、其他配合人员 ☐是 ☐否。 机械准备情况: 振动棒: ☒ 平板振动器: ☐ 商品混凝土供应商资质: ☐有 ☐无; 商品混凝土合格证: ☐有 ☐无; 混凝土配合比单号: _____; 混凝土强度等级: C25 设计坍落度(mm): 180±20.	
监理情况: 1. 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间 ☒符合要求 ☐不符合要求 2. 施工缝处理 ☐未按方案处理 ☐按方案处理 ☐未接浆 ☐已接浆 3. 混凝土质量 ☐现场加水 ☒和易性好 ☐和易性差 ☒泌水性符合要求 ☐泌水性不符合要求 ☐有离析现象 ☒无离析现象 4. 振捣方式 ☐间距过大 ☐振捣时间过短 ☐振捣时间过长 ☒振捣时间适宜 ☐有漏振现象 ☐无漏振现象 ☐有爆模现象 5. 钢筋踩踏情况 ☐有专人负责, 修复较好 ☐无专人负责, 不加修复 ☐梁板上皮钢筋保护厚度实测 6. 收光质量 ☐时间掌握过短 ☐时间掌握过长 ☒时间掌握适宜 ☐收光时加水 ☐收光时撒干水泥 ☐养护工作到位 ☐养护工作不到位 7. 安全措施 ☒有安全巡视 ☐无安全巡视 ☒安全措施落实情况好 ☐安全措施落实情况差 现场混凝土坍落度: 195mm	
发现问题:	
无	
处理意见:	
施工项目部: _____ 质检员: 李利平 日期: 2016年4月22日	监理项目部: _____ 旁站监理人员: 张瑞 日期: 2016年4月22日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。

JZLB8

旁站监理记录表

工程名称: 邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目 (一期 20 兆瓦)

编号: 08

日期及气候: 2016.4.20 晴	工程地点: 西黄村
旁站监理的部位或工序: 外线 2#、3# 基础	
旁站监理开始时间: 8:40	旁站监理结束时间: 16:00
施工情况: 浇筑方案: ☒有 ☐无 ☐可行 ☐不可行 人员组织到岗情况: 质检员 ☐是 ☐否、施工员 ☐是 ☐否、安全员 ☒是 ☐否、电工 ☐是 ☐否、振捣工 ☒是 ☐否、其他配合人员 ☐是 ☐否。 机械准备情况: 振动棒: ☒ 平板振动器: ☐ 商品混凝土供应商资质: ☒有 ☐无; 商品混凝土合格证: ☒有 ☐无; 混凝土配合比单号: _____; 混凝土强度等级: C25 设计坍落度 (mm): 180±20	
监理情况: 1. 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间 ☒符合要求 ☐不符合要求 2. 施工缝处理 ☐未按方案处理 ☐按方案处理 ☐未接浆 ☐已接浆 3. 混凝土质量 ☐现场加水 ☒和易性好 ☐和易性差 ☒泌水性符合要求 ☐泌水性不符合要求 ☐有离析现象 ☒无离析现象 4. 振捣方式 ☐间距过大 ☐振捣时间过短 ☐振捣时间过长 ☒振捣时间适宜 ☐有漏振现象 ☐无漏振现象 ☐有爆模现象 5. 钢筋踩踏情况 ☐有专人负责, 修复较好 ☐无专人负责, 不加修复 ☐梁板上皮钢筋保护厚度实测 6. 收光质量 ☐时间掌握过短 ☐时间掌握过长 ☒时间掌握适宜 ☐收光时加水 ☐收光时撒干水泥 ☐养护工作到位 ☐养护工作不到位 7. 安全措施 ☒有安全巡视 ☐无安全巡视 ☒安全措施落实情况好 ☐安全措施落实情况差 现场坍落度为 185mm	
发现问题: 无	
处理意见:	
施工项目部: _____ 质检员: 冯利广 日期: 2016年4月20日	监理项目部: _____ 旁站监理人员: 张瑞 日期: 2016年4月20日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。

JZLB8

旁站监理记录表

工程名称: 邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目 (一期 20 兆瓦)

编号: 07

日期及气候: 2016.4.19. 晴	工程地点: 西黄村
旁站监理的部位或工序: 1# 9# 外线塔基	
旁站监理开始时间: 9:10.	旁站监理结束时间: 15:30.
施工情况: 浇筑方案: ☒有 ☐无 ☐可行 ☐不可行 人员组织到岗情况: 质检员 ☐是 ☐否、施工员 ☐是 ☐否、安全员 ☐是 ☐否、电工 ☐是 ☐否、振捣工 ☒是 ☐否、其他配合人员 ☐是 ☐否。 机械准备情况: 振动棒: ☒ 平板振动器: ☒ 商品混凝土供应商资质: ☒有 ☐无; 商品混凝土合格证: ☒有 ☐无; 混凝土配合比单号: _____; 混凝土强度等级: C25 设计坍落度 (mm): 180±20.	
监理情况: 1. 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间 ☒符合要求 ☐不符合要求 2. 施工缝处理 ☐未按方案处理 ☐按方案处理 ☐未接浆 ☐已接浆 3. 混凝土质量 ☐现场加水 ☒和易性好 ☐和易性差 ☒泌水性符合要求 ☐泌水性不符合要求 ☐有离析现象 ☒无离析现象 4. 振捣方式 ☐间距过大 ☐振捣时间过短 ☐振捣时间过长 ☒振捣时间适宜 ☐有漏振现象 ☐无漏振现象 ☐有爆模现象 5. 钢筋踩踏情况 ☐有专人负责, 修复较好 ☐无专人负责, 不加修复 ☐梁板上皮钢筋保护厚度实测 6. 收光质量 ☐时间掌握过短 ☐时间掌握过长 ☒时间掌握适宜 ☐收光时加水 ☐收光时撒干水泥 ☐养护工作到位 ☐养护工作不到位 7. 安全措施 ☒有安全巡视 ☐无安全巡视 ☒安全措施落实情况好 ☐安全措施落实情况差 现场坍落度为 173mm	
发现问题: 无	
处理意见:	
施工项目部: _____ 质检员: 王利平 日期: 2016年4月19日	监理项目部: _____ 旁站监理人员: 张瑞 日期: 2016年4月19日

注: 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。

JZLB8

旁站监理记录表

工程名称: 邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目 (一期 20 兆瓦)

编号: 06.

日期及气候: 2016.4.18. 晴	工程地点: 西黄村.
旁站监理的部位或工序: 6# 外线塔基础.	
旁站监理开始时间: 8:30.	旁站监理结束时间: 11:20.
施工情况: 浇筑方案: ☒有 ☐无 ☐可行 ☐不可行 人员组织到岗情况: 质检员 ☒是 ☐否、施工员 ☒是 ☐否、安全员 ☒是 ☐否、电工 ☐是 ☐否、振捣工 ☒是 ☐否、其他配合人员 ☐是 ☐否。 机械准备情况: 振动棒: ☒ 平板振动器: ☒ 商品混凝土供应商资质: ☒有 ☐无; 商品混凝土合格证: ☒有 ☐无; 混凝土配合比单号: _____; 混凝土强度等级: C25 设计坍落度 (mm): 180±20.	
监理情况: 1. 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间 ☒符合要求 ☐不符合要求 2. 施工缝处理 ☐未按方案处理 ☐按方案处理 ☐未接浆 ☐已接浆 3. 混凝土质量 ☐现场加水 ☒和易性好 ☐和易性差 ☒泌水性符合要求 ☐泌水性不符合要求 ☐有离析现象 ☒无离析现象 4. 振捣方式 ☐间距过大 ☐振捣时间过短 ☐振捣时间过长 ☒振捣时间适宜 ☐有漏振现象 ☐无漏振现象 ☐有爆模现象 5. 钢筋踩踏情况 ☐有专人负责, 修复较好 ☐无专人负责, 不加修复 ☐梁板上皮钢筋保护厚度实测 6. 收光质量 ☐时间掌握过短 ☐时间掌握过长 ☒时间掌握适宜 ☐收光时加水 ☐收光时撒干水泥 ☐养护工作到位 ☐养护工作不到位 7. 安全措施 ☐有安全巡视 ☒无安全巡视 ☒安全措施落实情况好 ☐安全措施落实情况差 现场混凝土厚度为 171mm	
发现问题: 无.	
处理意见:	
施工项目部:  质检员: 李利广 日期: 2016年4月18日	监理项目部:  旁站监理人员: 张瑞 日期: 2016年4月18日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存一份。

JZLB8

旁站监理记录表

工程名称: 邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目 (一期 20 兆瓦)

编号: 05

日期及气候: 2016.4.17	工程地点: 西黄村
旁站监理的部位或工序: 8#外线塔基. 基础出.	
旁站监理开始时间: 8:20.	旁站监理结束时间: 12:30.
施工情况: 浇筑方案: ☒有 ☐无 ☐可行 ☐不可行 人员组织到岗情况: 质检员 ☐是 ☐否, 施工员 ☒是 ☐否, 安全员 ☐是 ☐否, 电工 ☐是 ☐否, 振捣工 ☒是 ☐否, 其他配合人员 ☒是 ☐否. 机械准备情况: 振捣棒: ☒有 ☐无 平板振动器: ☒有 ☐无 商品混凝土供应商资质: ☒有 ☐无; 商品混凝土合格证: ☒有 ☐无; 混凝土配合比单号: _____; 混凝土强度等级: C25 设计坍落度 (mm): 180±20.	
监理情况: 1. 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间 ☒符合要求 ☐不符合要求 2. 施工缝处理 ☐未按方案处理 ☐按方案处理 ☐未接浆 ☐已接浆 3. 混凝土质量 ☐现场加水 ☒和易性好 ☐和易性差 ☒泌水性符合要求 ☐泌水性不符合要求 ☐有离析现象 ☒无离析现象 4. 振捣方式 ☐间距过大 ☐振捣时间过短 ☐振捣时间过长 ☒振捣时间适宜 ☐有漏振现象 ☒无漏振现象 ☐有爆模现象 5. 钢筋踩踏情况 ☐有专人负责, 修复较好 ☐无专人负责, 不加修复 ☐梁板上皮钢筋保护厚度实测 6. 收光质量 ☐时间掌握过短 ☐时间掌握过长 ☒时间掌握适宜 ☐收光时加水 ☐收光时撒干水泥 ☐养护工作到位 ☐养护工作不到位 7. 安全措施 ☒有安全巡视 ☐无安全巡视 ☒安全措施落实情况好 ☐安全措施落实情况差 现场. 坍落度为 162mm.	
发现问题: 无.	
处理意见:	
施工项目部:  质 检 员: 刘利平 日 期: 2016年4月17日	监理项目部:  旁站监理人员: 张瑞 日 期: 2016年4月17日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。

JZLB8

旁站监理记录表

工程名称: 邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目 (一期 20 兆瓦)

编号: 04

日期及气候: 2016.4.15 晴	工程地点: 西黄村
旁站监理的部位或工序: 井塔基础	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 13:00
施工情况: 浇筑方案: ☒有 ☒无 ☐可行 ☐不可行 人员组织到岗情况: 质检员 ☒是 ☐否、施工员 ☒是 ☐否、安全员 ☒是 ☐否、电工 ☐是 ☐否、振捣工 ☒是 ☐否、其他配合人员 ☐是 ☐否。 机械准备情况: 振动棒: 平板振动器: 商品混凝土供应商资质: ☒有 ☐无; 商品混凝土合格证: ☒有 ☐无; 混凝土配合比单号: _____; 混凝土强度等级: C 25 设计坍落度 (mm): 180±20	
监理情况: 1. 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间 ☒符合要求 ☐不符合要求 2. 施工缝处理 ☐未按方案处理 ☐按方案处理 ☐未接浆 ☐已接浆 3. 混凝土质量 ☐现场加水 ☒和易性好 ☐和易性差 ☒泌水性符合要求 ☐泌水性不符合要求 ☐有离析现象 ☒无离析现象 4. 振捣方式 ☐间距过大 ☐振捣时间过短 ☐振捣时间过长 ☒振捣时间适宜 ☐有漏振现象 ☒无漏振现象 ☐有爆模现象 5. 钢筋踩踏情况 ☐有专人负责, 修复较好 ☐无专人负责, 不加修复 ☐梁板上皮钢筋保护厚度实测 6. 收光质量 ☐时间掌握过短 ☐时间掌握过长 ☒时间掌握适宜 ☐收光时加水 ☐收光时撒干水泥 ☐养护工作到位 ☐养护工作不到位 7. 安全措施 ☒有安全巡视 ☐无安全巡视 ☒安全措施落实情况好 ☐安全措施落实情况差 现场实测土质厚度为 165mm.	
发现问题:	
无	
处理意见:	
施工项目部: _____ 质检员: 李利广 日期: 2016 年 4 月 15 日	监理项目部: _____ 旁站监理人员: 张瑞 日期: 2016 年 4 月 15 日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。

JZLB8

旁站监理记录表

工程名称: 邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目 (一期 20 兆瓦)

编号: 02

日期及气候: 2016.4.14 晴	工程地点: 综合楼
旁站监理的部位或工序: 综合楼二层顶板梁、柱	
旁站监理开始时间: 14:00	旁站监理结束时间: 18:20
施工情况: 浇筑方案: ☐有 ☐无 ☒可行 ☐不可行 人员组织到岗情况: 质检员 ☒是 ☐否、施工员 ☒是 ☐否、安全员 ☒是 ☐否、电工 ☐是 ☐否、振捣工 ☐是 ☐否、其他配合人员 ☐是 ☐否。 机械准备情况: 振动棒: ☒ 平板振动器: ☒ 商品混凝土供应商资质: ☐有 ☐无; 商品混凝土合格证: ☒有 ☐无; 混凝土配合比单号: _____; 混凝土强度等级: C30. 设计坍落度 (mm): 180±20.	
监理情况: 1. 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间 ☒符合要求 ☐不符合要求 2. 施工缝处理 ☐未按方案处理 ☐按方案处理 ☐未接浆 ☒已接浆 3. 混凝土质量 ☐现场加水 ☒和易性好 ☐和易性差 ☒泌水性符合要求 ☐泌水性不符合要求 ☐有离析现象 ☒无离析现象 4. 振捣方式 ☐间距过大 ☐振捣时间过短 ☐振捣时间过长 ☒振捣时间适宜 ☐有漏振现象 ☒无漏振现象 ☐有爆模现象 5. 钢筋踩踏情况 ☒有专人负责, 修复较好 ☐无专人负责, 不加修复 ☒梁板上皮钢筋保护厚度实测 6. 收光质量 ☐时间掌握过短 ☐时间掌握过长 ☒时间掌握适宜 ☐收光时加水 ☐收光时撒干水泥 ☐养护工作到位 ☐养护工作不到位 7. 安全措施 ☒有安全巡视 ☐无安全巡视 ☒安全措施落实情况好 ☐安全措施落实情况差 实测坍落度: 165	
发现问题: 无	
处理意见:	
施工项目部: 河北建投集团安装工程有限公司 项目经理: 胡洋 质检员: 资料专用章 日期: 2016年4月30日	监理项目部: 河北建投集团安装工程有限公司 旁站监理人员: 张瑞 日期: 2016年4月30日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。

70

JZLB8

旁站监理记录表

工程名称: 开台西黄村镇20兆瓦光伏电站项目(一期20兆瓦) 编号: 02


日期及气候: 2016.4.7. 晴	工程地点: 综合楼
旁站监理的部位或工序: 综合楼一层柱、梁、顶板	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 12:00
施工情况: 项目部施工2人及西黄村镇20兆瓦光伏电站项目(一期20兆瓦)监理单位、监理单位、监理单位均在现场 机械运行正常,采用商品混凝土,混凝土等级:C30.	
监理情况: 1.检查商品混凝土资料齐全:符合要求. 2.抽查混凝土坍落度:14、15、16.符合要求. 3.检查混凝土振捣情况:振捣棒能做到快插慢拔 振捣间距为50cm.符合要求. 4.检查混凝土保护层厚度偏差在规范允许范围 发现问题: 5.试块留置.标养一组.同条件一组. 无	
处理意见: 无	
备注: 无	
河北建设集团安装工程有限公司 施工项目部: 开台西黄村镇20兆瓦光伏电站项目(一期20兆瓦) 安装施工项目 质检员: 刘晓东 日期: 2016年4月10日	监理项目部: 旁站监理人员: 张铁军 日期: 2016年4月20日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。

JZLB8

旁站监理记录表

工程名称: 荆台西黄村镇30兆瓦光伏发电项目(一期20兆瓦) 编号: 01

日期及气候: 2016.4.6 晴	工程地点: 综合楼
旁站监理的部位或工序: 综合木楼基础	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 12:00
施工情况: 项目部施工人及西已备齐全, 项目经理、施工员、质检员均在现场, 机械运转正常, 振动棒两台。 采用商品混凝土C20等级。	
监理情况: 1. 检查商品混凝土原材料齐全: 符合要求。 2. 抽查混凝土坍落度 14、16、17, 符合要求。 3. 检查振捣情况: 基本能做到快插慢拔, 符合要求。 4. 钢筋保护层厚度偏差基本在规范允许范围内。 5. 试块留置、标养一组, 同条件一组。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注: 无	
施工项目部:  质 检 员: 刘瑞东 日 期: 2016年4月6日	监理项目部:  旁站监理人员: 张立平 日 期: 2016年4月6日


注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。

JZLB8

旁站监理记录表

工程名称: 邢台西营村金鑫光伏光伏发电项目(一期)2016.5.28



编号:

日期及气候: 2016年5月28日 小雨	工程地点: 光伏区(东山)
旁站监理的部位或工序: 高压电缆头制作	
旁站监理开始时间: 8:10	旁站监理结束时间: 11:18
施工情况: 有交底, 安全防护用品佩戴正确, 工器具已准备齐全, 现场施工人员5人, 安全员到位, 剥除导体屏蔽层时用电绝缘纸擦拭绝缘层与铜屏蔽, 用锡条及少少纸打磨铜屏蔽, 在焊防绣漆。	
监理情况: 全过程跟班作业, 未发现影响工程质量施工, 检查材料, 设备的合格性, 结果为合格, 督促施工人员, 严格按照规范施工。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
	监理项目部: _____ 旁站监理人员: 李高朋 日期: 2016年5月28日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。

旁站监理记录表

工程名： 邢台西黄村镇30兆瓦光伏发电项 编号：

日期及气候：2016年4月20日 晴	工程地点：邢台西黄村镇30兆瓦光伏发电项目
旁站监理的部位及工序： 光伏场区防雷接地网焊接	
旁站监理开始时间： 9:30	旁站监理结束时间： 10:30
施工情况： 施工人员到达现场，电焊机、工器具准备完毕。首先由现场施工负责人，作施工交底，然后开始工作。   焊接好的接地极、接地扁钢	
监理情况： 施工人员按照图纸要求和规范，进行下料、制作成型，然后进行焊接作业。搭焊接长度不少于扁钢宽度的2倍，并且三个棱边进行焊接，焊缝平整、饱满、牢固，并且做好防腐。符合设计要求。	
发生情况： 无	
处理意见： 无	
施工企业： 项目经理部：河北建投集团安装工程有限公司 30MW光伏发电项目一期20MW 安装施工项目 质检员（签字）： 2016年4月20日	监理企业：常州正衡 项目监理机构：邢台西黄村镇30兆瓦光伏发电项目 旁站监理人员（签字）： 2016年4月20日

旁站监理记录表

工程名称：邢台西黄村镇30兆瓦光伏发电项目

编号：

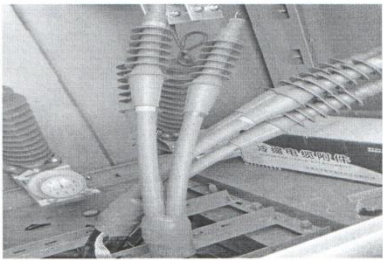
日期及气候：2016年5月30日 晴		工程地点：东山光伏区									
旁站监理的部位及工序：14#、16#、18#、24#方阵开口电压测试											
旁站监理开始时间：8:00		旁站监理结束时间：17:00									
施工情况： 测试人员到达现场，试验仪器设备、工器具准备完毕。由现场负责人作安全操作、试验工作交底，然后开始工作。											
监理情况： 检查电压测表、检查接是否正确、检查线缆是否完，一切正常后进行测											
测试结果： <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">上午8:30</td> <td style="width: 25%;">684V</td> <td style="width: 25%;">下午2:30</td> <td style="width: 25%;">762V</td> </tr> <tr> <td>11:30</td> <td>758V</td> <td>下午5:30</td> <td>695V</td> </tr> </table>				上午8:30	684V	下午2:30	762V	11:30	758V	下午5:30	695V
上午8:30	684V	下午2:30	762V								
11:30	758V	下午5:30	695V								
处理意见： 无											
施工企业： 项目经理部：河北建设集团安装工程有限公司 质检员（签字）：胡洋 2016年5月30日		监理企业：常州正衡 项目监理机构：邢台西黄村镇30兆瓦光伏发电项目 旁站监理人员（签字）：李忠明 2016年5月30日									

旁站监理记录表

工程名称：邢台西黄村镇30兆瓦光伏发电项目 编号：

日期及气候：2016年6月2日 晴	工程地点：综合楼、东山光伏区
旁站监理的部位及工序：箱变高压电缆、变压器耐压试验、联络变压器	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：11:00
施工情况： 测试人员到达现场，试验仪器设备、工器具准备完毕。由现场负责人作安全操作、试验工作交底，然后开始工作。	
监理情况： 试验操作人员按照规范要求，无关人员离开现场，安装摆放好试验仪器（箱式变压器试验-试验仪ST3598-15 激励变JLB3598-4 电容器TRF55-0.001 隔离变GLB3598-4 电抗器DKQ3598-40 电力电缆试验-电子摇表 电桥 试验变压器 试验控制箱等）。然后进行试验工作。整个试验过程符合规范要求。	
发生情况： 无	
处理意见： 无	
施工企业： 项目经理部： 质检员（签字）：胡洋 2016年6月2日	监理企业：常州正衡 项目监理机构：邢台西黄村镇30兆瓦光伏发电项目 旁站监理人员（签字）：[Signature] 2016年6月2日

旁站监理记录表

工程名称：邢台西黄村镇30兆瓦光伏发电项目		编号：
日期及气候：2016年6月1日 晴		工程地点：综合楼
旁站监理的部位及工序： 高压电缆终端头制作		
旁站监理开始时间：	9:30	旁站监理结束时间： 11:00
施工情况： 施工人员到达现场，工器具准备完毕。由现场施工负责人作施工交底，然后开始工作。		
		
剥切电缆		制作好的电缆头
监理情况： 施工人员按照规范要求，首先电缆附件开箱，检查附件是否齐全。然后按施工步骤进行工作。操作中，注意钢铠层编织线与屏蔽层编织线勿短接，切勿破坏绝缘层。操作过程符合规范要求。		
发生情况： 无		
处理意见： 无		
施工企业： 项目经理部： 质检员（签字）：  2016年6月1日		监理企业：常州正衡 项目监理机构：邢台西黄村镇30兆瓦光伏发电项目 旁站监理人员（签字）：  2016年6月1日
