



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称: 广州发展连平大湖(一期 24MW)农业光伏发电项目

编号: PZ-PDFWMLB-0725


旁站的关键部位、 关键工序	配电房屋面梁、板、 柱 3.90m~5.40m	施工单位	湖北省电力勘测 设计院
旁站日期	2016 年 7 月 25 日		

施工情况:

管理及施工人员均到位,施工所需人、材、机已准备齐全,管理人员有 5 人,施工人员有 17 人,模板校核人员 3 人,混凝土使用商品砼,混凝土运输车辆有 4 辆,混凝土振捣棒 6 台,振动棒逐列排开分层振捣。混凝土浇筑完毕收光后及时用塑料薄膜覆盖进行保养。

监理情况:

首先查看了施工技术及安全交底,质量、安全措施均已落实到位。检查混凝土标号,核查为 C30,有出厂检验合格证,符合设计和规范要求,砼浇筑过程正常。模板尺寸、标高及表面平整度、钢筋规格型号及加工安装、相关预埋钢筋、预埋件等均符合设计及规范要求。

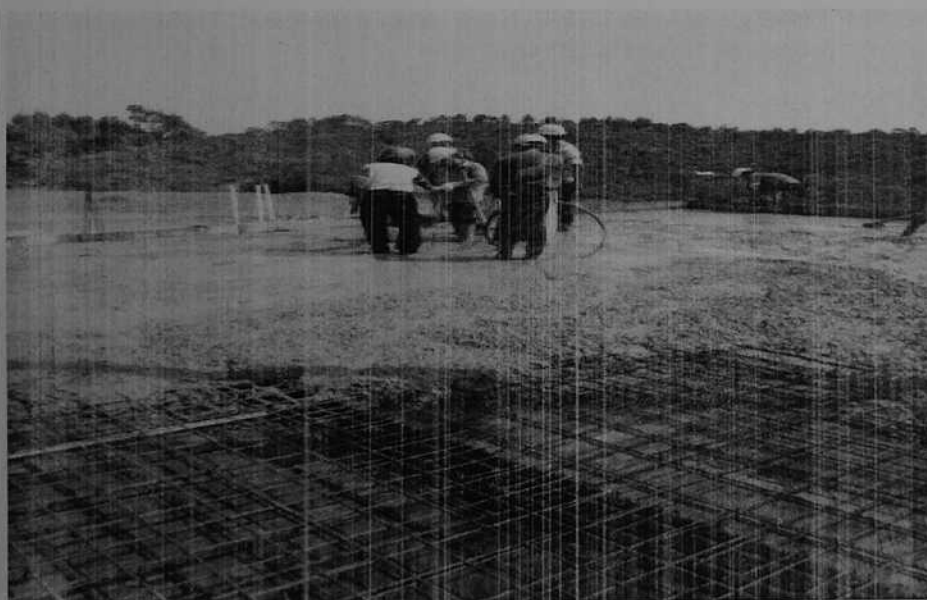

景想明

旁站监理人员(签字):

2016 年 7 月 25 日

王大为

填报说明: 本表一式一份,项目监理机构留存。
