



常州正衡电力工程监理有限公司

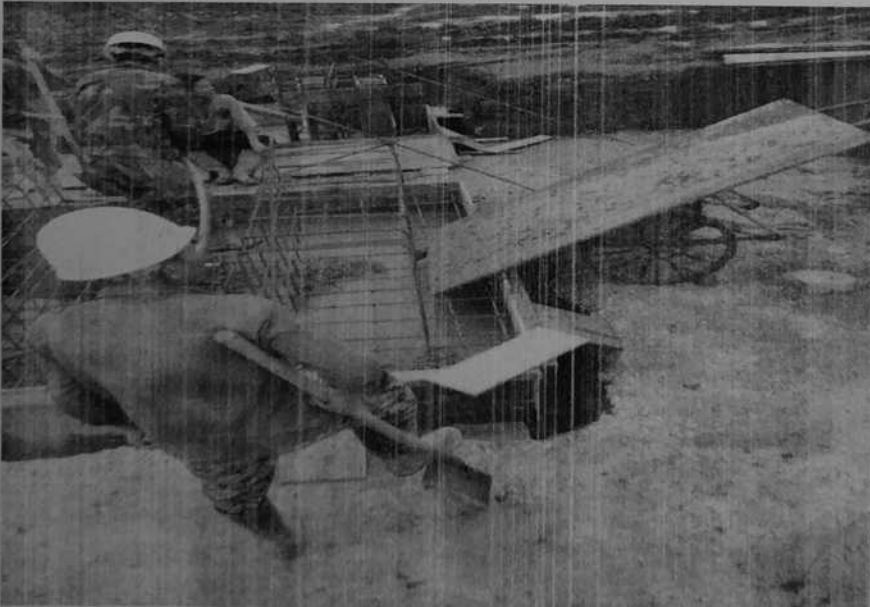
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称: 广州发展连平大湖(一期 24MW)农业光伏发电项目

编号: PZ-SVGJC-0909

旁站的关键部位、 关键工序	SVG 基础混凝土	施工单位	湖北省电力勘测 设计院
旁站日期	2016 年 9 月 9 日		
施工情况: 管理及施工人员均到位, 施工所需人、材、机已准备齐全, 管理人员有 3 人, 施工人员有 8 人, 模板校核人员 1 人, 混凝土使用商品砼, 混凝土运输车辆有 1 辆, 混凝土振捣棒 2 台, 振动棒逐列排开分层振捣。混凝土浇筑完毕收光后及时用塑料薄膜覆盖进行保养。			
监理情况: 首先查看了施工技术及安全交底, 质量、安全措施均已落实到位。检查混凝土标号, 核查为 C25, 有出厂检验合格证, 符合设计和规范要求, 砼浇筑过程正常。模板尺寸、标高及表面平整度、钢筋规格型号及加工安装、相关预埋钢筋、预埋件等均符合设计及规范要求。			
			
果想明		旁站监理人员(签字): 陆长军 2016 年 9 月 9 日	

填报说明: 本表一式一份, 项目监理机构留存。
